


RAPORT MIESIĘCZNY KONSULTANTA Z POSTĘPU PRAC

NR 31

za okres: Sierpień 2021 r.

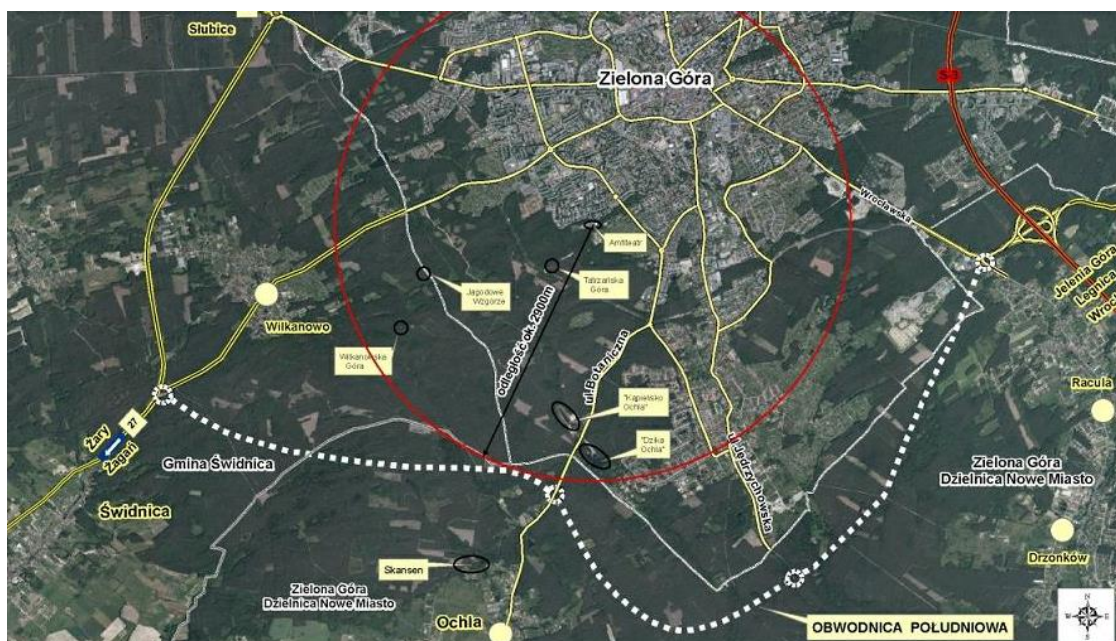

PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ
ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA:
„BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA ZIELONA GÓRA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ”

RAPORT MIESIĘCZNY Z POSTĘPU PRAC NR 31 za okres – Sierpień 2021r.

3.3. Postęp robót w odniesieniu do aktualnego Programu

Zespół Konsultanta nie stwierdza opóźnień w realizacji Robót w odniesieniu do Programu.

3.4. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym:

W okresie którego dotyczy raport, wykonano:

Prace projektowe:

- Procedowanie formalności związanych z wykonaniem prac poza ZRID,

Roboty przygotowawcze i budowlane:

- Wykopy:
 - km 0+100 – 0+400 TG (roboty prowadzone)
 - km 4+325 – 4+785 TG
 - km 5+900 – 6+300 TG
 - km 8+270 – 8+480 TG
- Podłoże pod nasyp:
 - km 0+140 – 0+350 DJ1
- Nasyp:
 - km 0+756 – 0+850 TG
 - km 0+900 – 1+100 TG
 - km 1+380 – 1+583 TG
 - km 1+608 – 1+725 TG
 - km 1+890 – 2+100 TG
 - km 4+200 – 4+325 TG
 - km 4+785 – 4+965 TG
 - km 5+050 – 5+182 TG
 - km 5+235 – 5+340 TG
 - km 6+510 – 6+714 TG
 - km 6+740 – 6+990 TG
 - km 7+500 – 8+270 TG
 - km 8+630 – 8+930 TG
 - km 10+770 – 11+000 TG
 - km 11+060 – 11+120 TG
 - km 11+220 – 11+575 TG
- Grunt stabilizowany cementem
 - km 4+200 – 4+325 TG
 - km 4+785 – 4+960 TG
 - km 7+505 – 7+800 TG
 - km 7+800 – 8+270 TG
 - km 8+630 – 8+930 TG
 - km 10+770 – 10+980 TG
- Profilowanie skarp nasypów i wykopów (prace prowadzone są w kilometrażach):
 - km 0+050 – 0+250 TG

RAPORT MIESIĘCZNY Z POSTĘPU PRAC NR 31 za okres – Sierpień 2021r.

- km 1+800, 2+100, 2+500, 3+000 TG
- km 5+100 – 6+300 TG
- km 6+700 – 7+750 TG
- km 8+250 – 12+676 TG
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie
 - km 7+100 – 7+505 TG
 - km 7+800 – 8+454 TG
- Podbudowa zasadnicza (I warstwa kruszywa)
 - km 8+930 – 10+770 TG
 - km 11+600 – 12+560 TG
- Wykonanie Kanalizacji Deszczowej (ułożenie wraz z podsypką, obsypką i zasypką)
 - Wykonano wpusty wraz z przykanalikami :
 - Wkd27, wkd28, wkd29;
 - Wkd33, wkd34, wkd35, wkd36, wkd37;
 - Wkd63, wkd64, wkd65, wkd66, wkd67, wkd68;
 - Wkd73, wkd78, wkd79, wkd80, wkd81, wkd92, wkd99, wkd100, wkd109, wkd110, wkd118;
 - Wkd135, wkd136, wkd137, wkd138, wkd139, wkd140, wkd141, wkd142, wkd145, wkd146;
 - Wykonano studnie wraz z osadnikami:
 - SD3.2, SD3.3, SD4.1, SD4.2, SD5.1, SD5.2, SD6.1, SD6.2, SD7.1, SD7.2, SD8.1, SD8.2, SD8.3
 - Wykonanie odcinków rurowych:
 - DN400 w km 1+970, 3+456, 4+113, 8+860 TG, 0+398, 8+860 DR
 - DN500 w km 7+800 TG
 - DN600 w km 1+560, 7+710TG.
- Prace związane z Elektryką wykonano :
 - Zasilanie:
 - Rejon ronda na ul. Jędrzychowskiej - 70%
 - Rejon ronda w Ochli – 70%
 - Rejon ronda na drogach DK27/KD282 – 70%
 - Oświetlenie:
 - Rejon ronda na ul. Jędrzychowskiej - 90%
 - Rejon ronda w Ochli – 80%
 - Kolizja SN: 9+965 – 60%
 - Kolizja Orange: 0+100, 5+050,
- Obiekt PG-1
 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego
- Obiekt PG-3
 - Zbrojenie i deskowanie ścian skrzydeł – podpora nr 1 i nr 2
- Obiekt PG-5
 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty fundamentowej.
- Obiekt PZ-2 – 4+087

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem dla zadania:
„Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej”.

- Wykonanie ławy z chudego betonu, fundamentu kruszywowego, osadzenie przepustu oraz rozpoczęcie wykonywania zasypki.
