


RAPORT MIESIĘCZNY KONSULTANTA Z POSTĘPU PRAC

NR 35

za okres: Grudzień 2021 r.

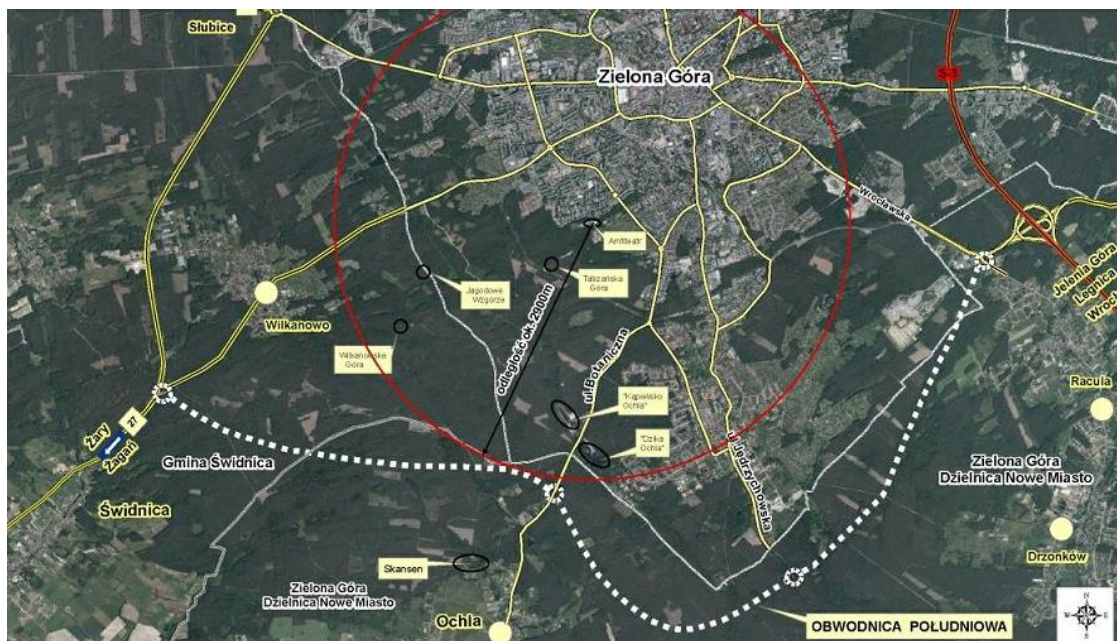

PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ
ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA:
„BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA ZIELONA GÓRA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ”

3. POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT WYKONAWCY WRAZ Z ANALIZĄ POSTĘPU WYKONANYCH ROBÓT

3.1. Program prac projektowych i Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z Programem dla etapu Robót z dnia 18.12.2020, wer. 00 rew. 01.

3.3. Postęp robót w odniesieniu do aktualnego Programu

Zespół Konsultanta nie stwierdza opóźnień w realizacji Robót w odniesieniu do Programu.

3.4. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym:

W okresie którego dotyczy raport, wykonano:

Prace projektowe:

- Procedowanie formalności związanych z wykonaniem prac poza ZRID,
- Przekazanie Do IK i LUW Projektu Budowlanego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 282 polegająca na budowie dodatkowej jezdni w ramach zadania „Budowa południowej obwodnicy Miasta w ciągu drogi krajowej”” – Połączenie ul. Szparagowej z ul. Głogowską,
- Zwrócenie się do GDDKiA z prośbą o nadanie wyróżnika literowego dla południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi DK32.

Roboty przygotowawcze i budowlane:

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie
 - km 0+580 – 1+520 TG,
- Ściek trójkątny
 - km 8+308 – 8+450 strona lewa,
- krawężnik
 - km 4+915 – 5+020 wyspa,
- umocnienia rowów (ścieki korytkowe
 - km 2+500 – 2+600 strona lewa
 - km 2+920 – 3+200 strona prawa
- pobocza
 - km 7+100 – 8+450 TG
- Wykonanie Kanalizacji Deszczowej
 - Zakończono prace przy budowie zbiornika retencyjnego ZB8
 - Prowadzono prace przy zbiorniku retencyjnym ZB7
 - Wykonano wyloty przykanalików wraz ze ściekiem skarpowym wkd101, wkd102, wkd103, wkd104, wkd105, wkd106, wkd107, wkd108, wkd109, wkd110, wkd126, wkd127, wkd128, wkd129, wkd152, wkd153, wkd154, wkd155,
- Wykonano przepusty rurowe:
 - km 1+600 PDRz 4, 5 i 6.
- Prace związane z elektryką, wykonano :
 - ZAS E225-E246/R3
- Prace teletechniczne:

- Wykonanie studni SK55, SK55/1, SK60, SK61, SK62, SK63, SK64,
- Wykonanie rurociągu w km 8+455 – 8+510, 9+305 – 10+100.

- Obiekty :

Obiekt PG-2

- Zbrojenie i deskowanie ścian ramy.

Obiekt PG-3

- Rozdeskowanie podparcia płyty ustroju nośnego,
- Zasyпка za ściankami,
- Wykonanie stożków.

Obiekt PG-4

- Betonowanie ław fundamentowych podpór w osi nr 1 i 2.

Obiekt PG-5

- Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian i skrzydeł w osi nr 1 i 2.

Obiekt PZ-4 – 8+797

- Wykonanie fundamentu kruszywowego, posadowienie przepustu i wykonanie zasyпки.
