

Załącznik nr 2 - Graficzny postęp prac
Raport miesięczny nr 38 za Styczeń 2022 r.

SEKCJA I

[illegible]


[illegible]


160	Roboty elektroenergetyczne	16.03.2022	19.10.2022			0,00%																								
165	Budowa zasilania (transformator, kable) - TG	16.03.2022	10.06.2022	20%	0%	20,00%																								
166	Budowa zasilania (transformator, kable) - ronda	05.09.2022	23.09.2022	70%	0%	70,00%																								
167	Roboty teletechniczne	09.05.2022	18.07.2022			0,00%																								
168	Budowa studni kablowych	09.05.2022	04.07.2022			0,00%																								
169	Budowa kanalizacji teletechnicznej	09.05.2022	04.07.2022	1%	0%	1,00%																								
170	Montaż światłowodów	05.07.2022	18.07.2022	1%	0%	1,00%																								
171	Roboty wodociągowe	29.04.2021	28.05.2021			0,00%																								
oki	Likwidacja kolizji wodocoągowej	29.04.2021	28.05.2021	80%	0%	80,00%																								

Legenda


Roboty zakończone
Roboty w trakcie
Roboty planowane

są to roboty również planowane na kolejny miesiąc

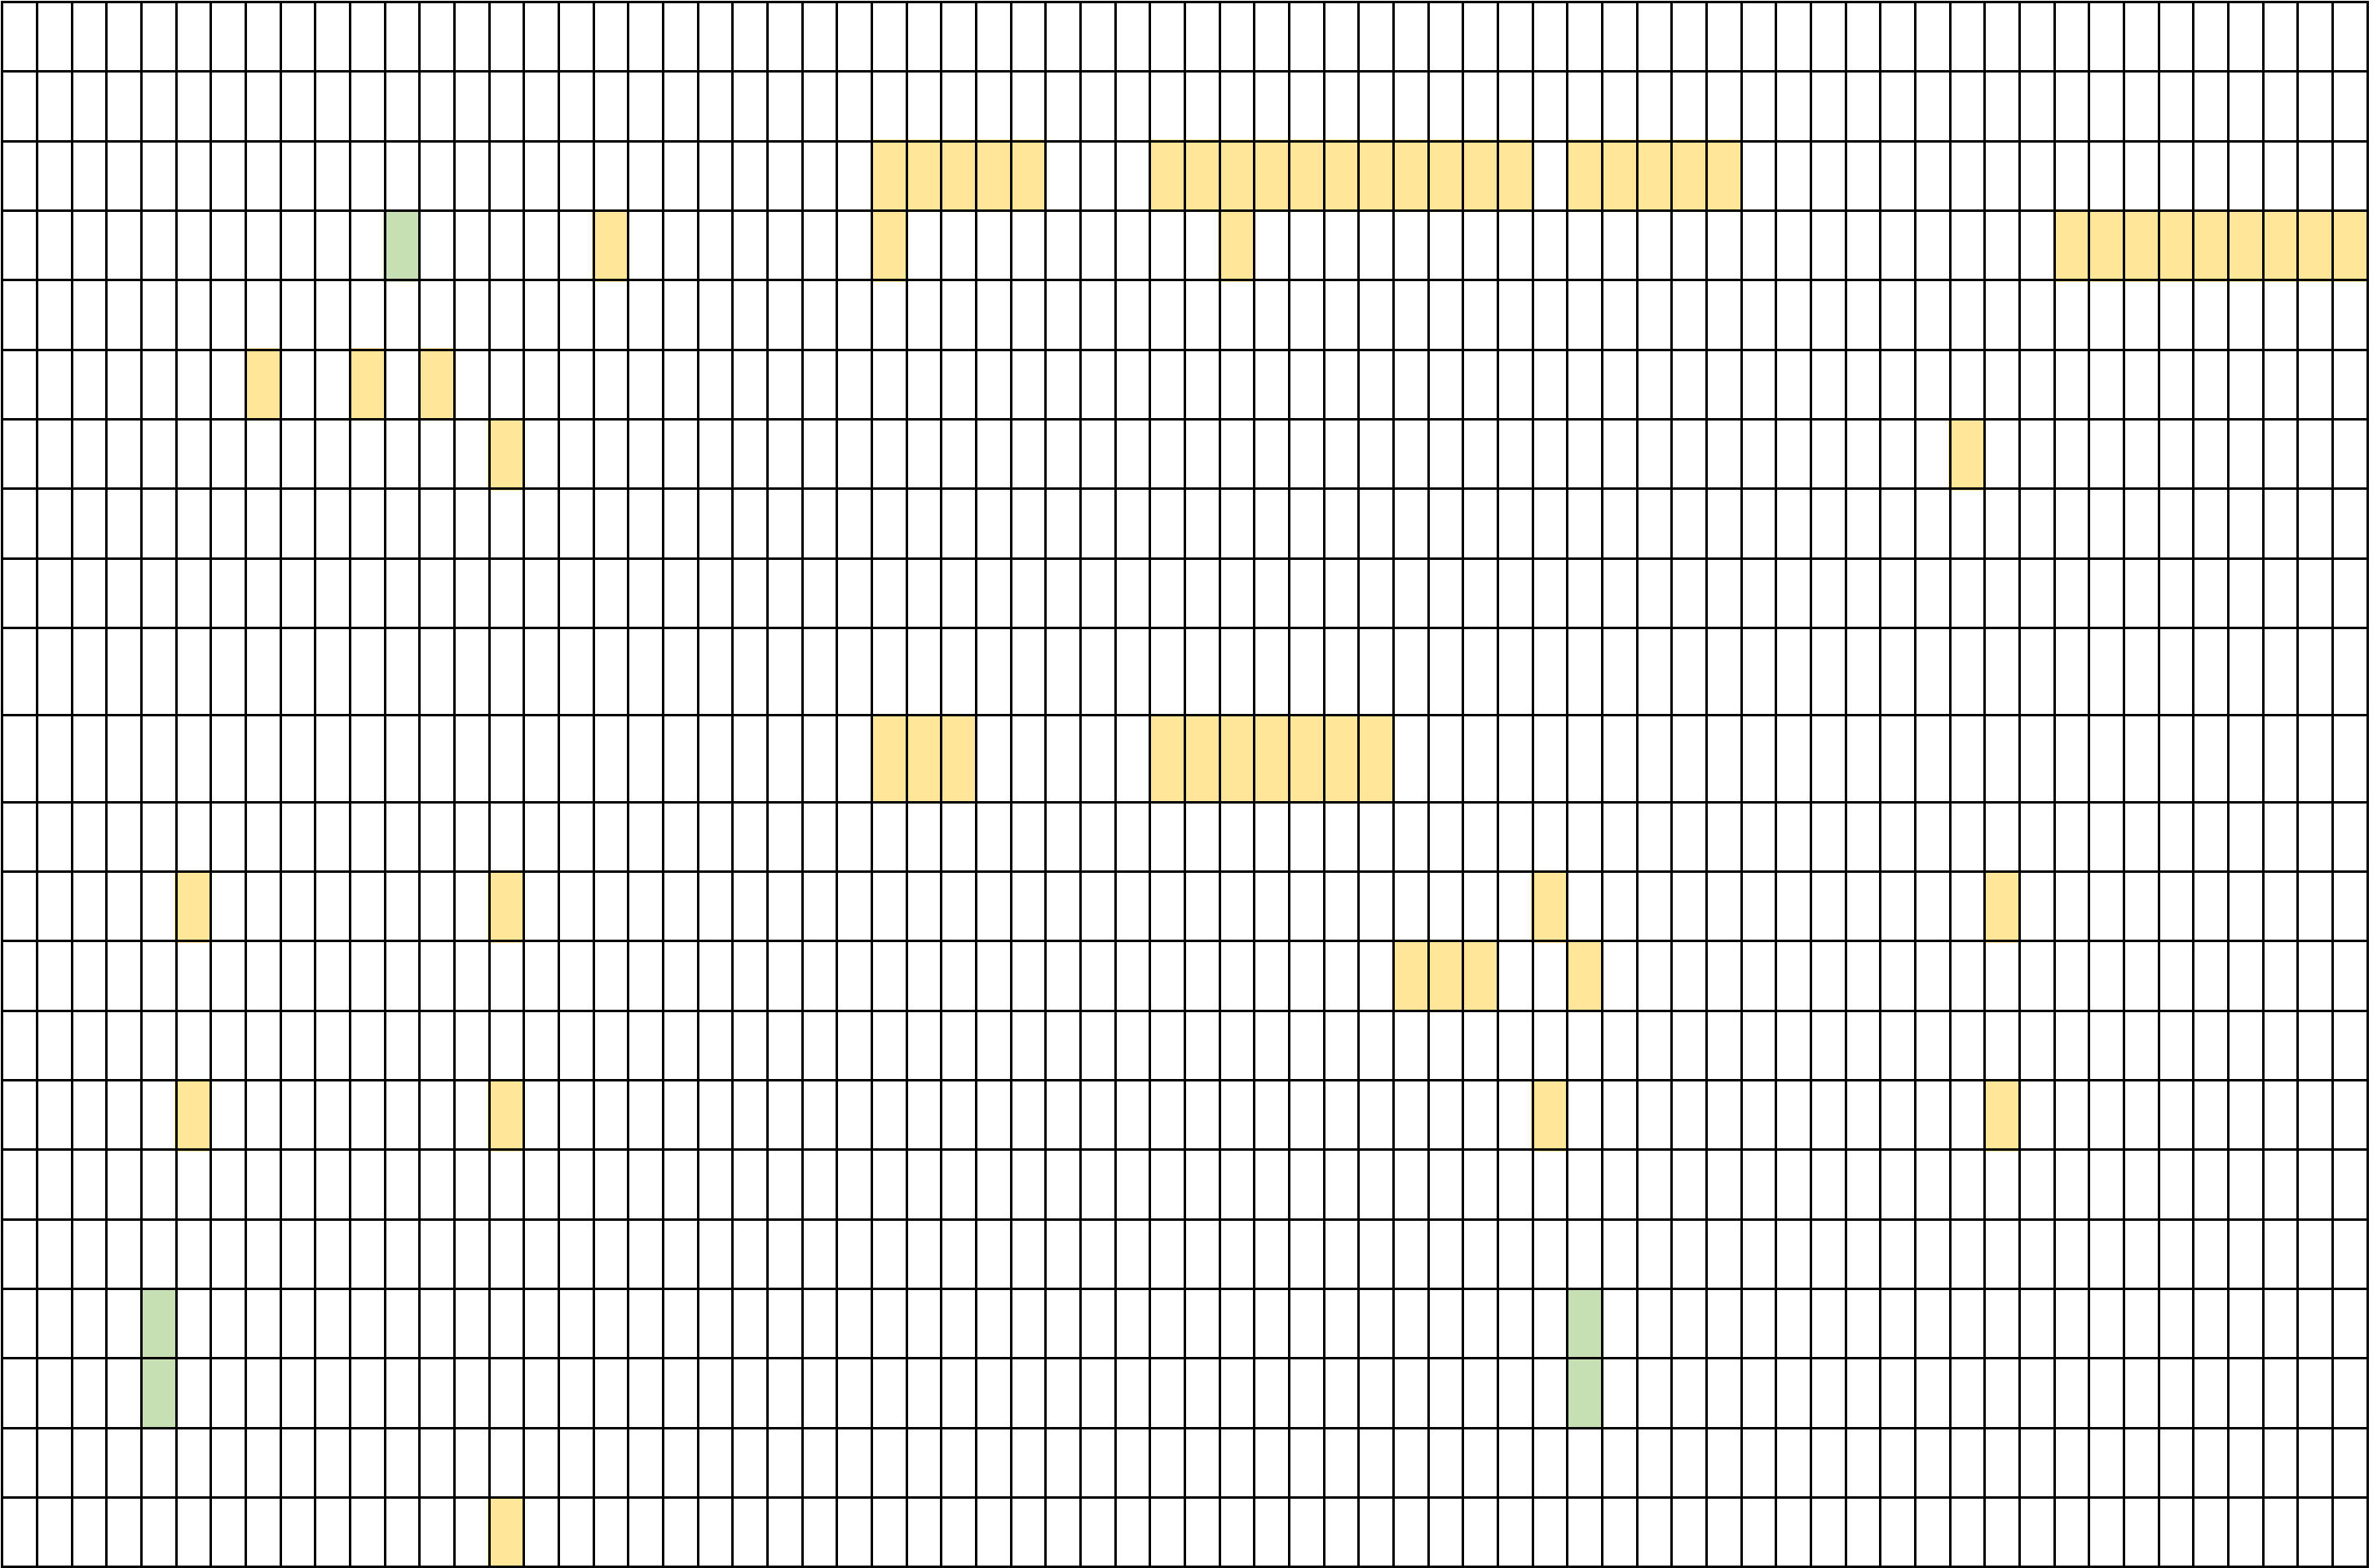



[illegible]

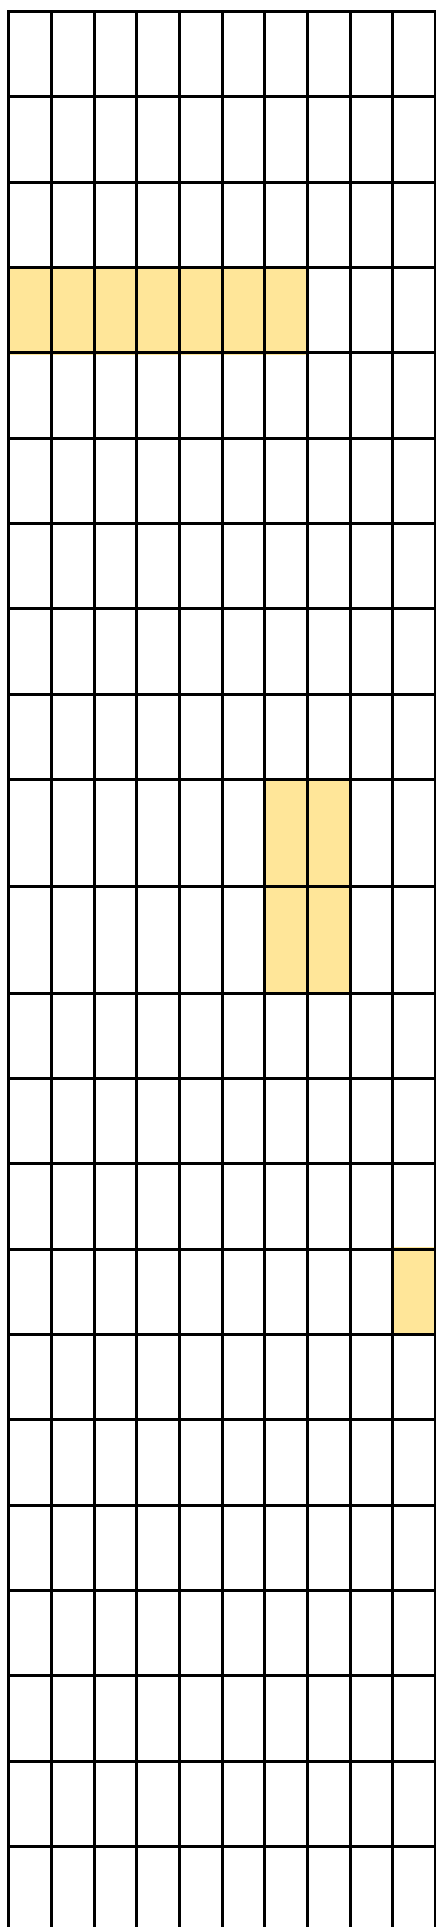

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

SEKCJA II

Legenda

Roboty zakończone	
Roboty w trakcie	są to roboty również planowane na kolejny miesiąc
Roboty planowane	

SEKCJA III

[illegible]

