


RAPORT MIESIĘCZNY KONSULTANTA Z POSTĘPU PRAC

NR 37

za okres: Luty 2022 r.

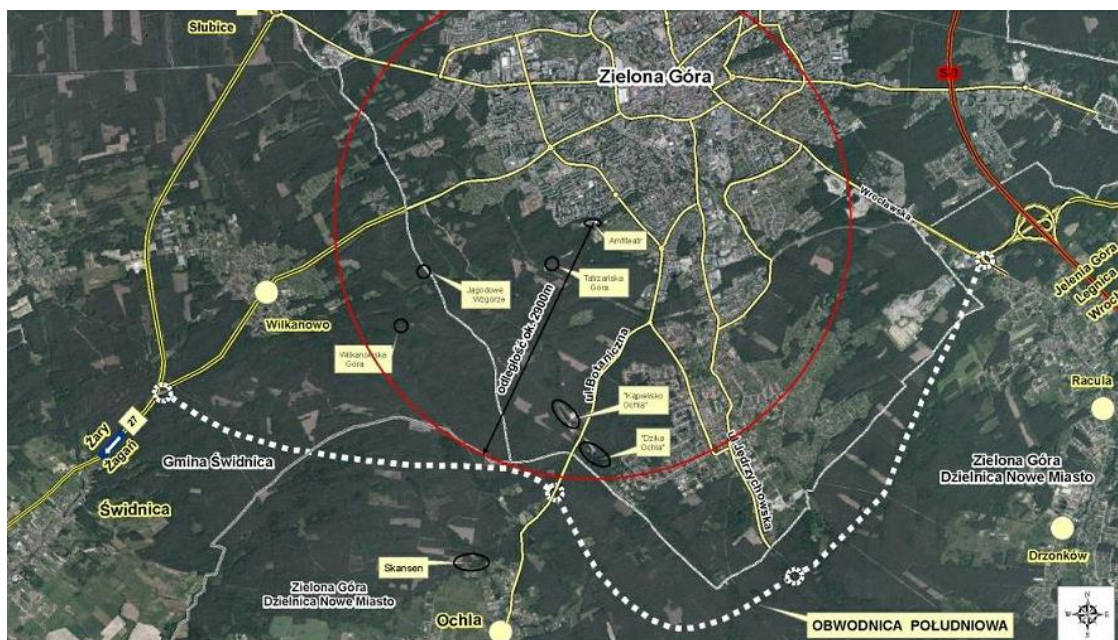

PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ
ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA:
„BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA ZIELONA GÓRA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ”

3. POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT WYKONAWCY WRAZ Z ANALIZĄ POSTĘPU WYKONANYCH ROBÓT

3.1. Program prac projektowych i Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z Programem dla etapu Robót z dnia 18.12.2020, wer. 00 rew. 01.

3.3. Postęp robót w odniesieniu do aktualnego Programu

Zespół Konsultanta nie stwierdza opóźnień w realizacji Robót w odniesieniu do Programu.

3.4. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym:

W okresie, którego dotyczy raport, wykonano:

Prace projektowe:

- Procedowanie formalności związanych z wykonaniem prac poza ZRID,
- Procedowanie formalności związanych z uzyskaniem uzgodnień/pozwoleń związanych z wykonaniem wjazdu w ul. Szparagową od strony ulicy Głogowskiej,
- Przekazanie protokołem zdawczo – odbiorczym Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 282 polegająca na budowie dodatkowej jezdni w ramach zadania budowa południowej obwodnicy Miasta w ciągu drogi krajowej”.
- Analiza otrzymanych uwag oraz spotkanie w sprawie uwag do projektu stałej organizacji ruchu.

Roboty przygotowawcze i budowlane:

- GWN (pod obiektem PG3)
- Roboty ziemne – nasyp:
 - km 4+170 – 4+190 PG3
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie
 - km 8+355 – 8+465 wyspa
 - km 8+512 – 8+621 wyspa
- Ułożenie kostki brukowej na podsypce
 - 8+512 – 8+621 wyspa
- Wykonanie ławy betonowej pod ściek trójkątny
 - km 12+201,86 – 12+250,00 strona prawa,
 - km 12+454,20 – 12+534,00 strona prawa.
- Wykonanie umocnienia rowów
 - km 12+080 – 12+157,39 strona lewa,
 - km 12+216 – 12+323,37 strona prawa.
- Wykonano przepusty rurowe
 - km 4+167.62 – PDRz 14, 13,
 - km 8+488 – PDRz 27,
 - km 5+030 – PDRz 41,

- km 11+206 – PDRz 35.

- Prace teletechniczne:
 - Wykonanie studni SK70, SK71, SK72, SK73, SK74, SK75, SK76, SK77, SK78,
 - Wykonanie rurociągu w km 9+150 – 9+195, 9+195 – 9+270, 11+080 – 11+855, 11+855 – 12+680.
- Obiekty :
Obiekt PG-2
 - Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego.Obiekt PG-4
 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ściany w osi nr 1,
 - Zbrojenie i deskowanie ściany w osi nr 2.Obiekt PG-5
 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego.
