


RAPORT MIESIĘCZNY KONSULTANTA Z POSTĘPU PRAC

NR 38

za okres: Marzec 2022 r.

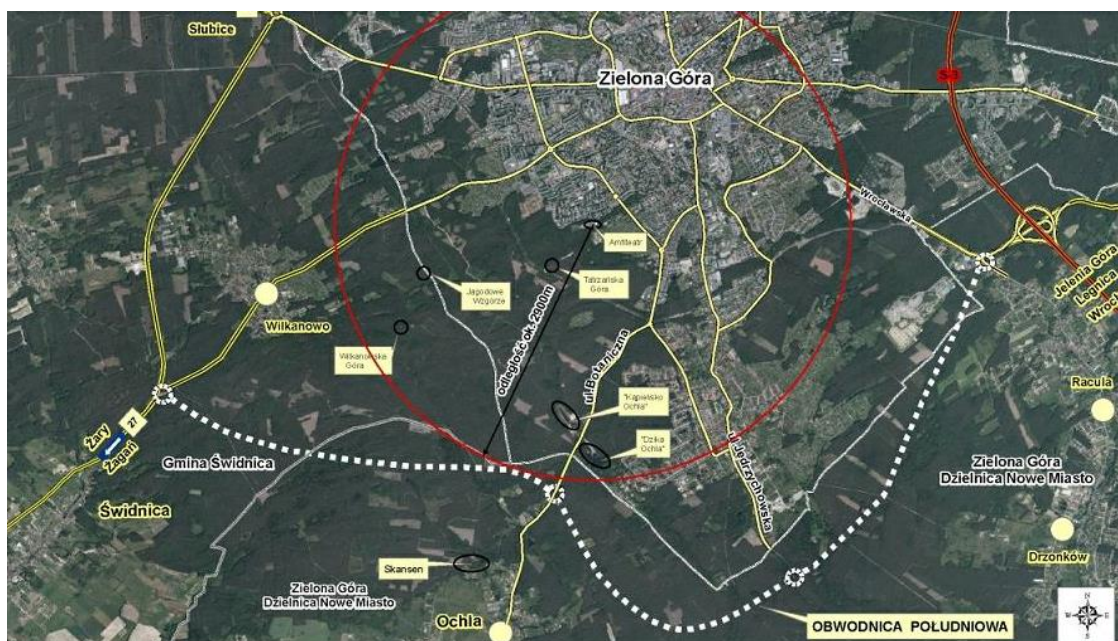

PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ
ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA:
„BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA ZIELONA GÓRA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ”

3. POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT WYKONAWCY WRAZ Z ANALIZĄ POSTĘPU WYKONANYCH ROBÓT

3.1. Program prac projektowych i Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z Programem dla etapu Robót z dnia 18.12.2020, wer. 00 rew. 01.

3.3. Postęp robót w odniesieniu do aktualnego Programu

Zespół Konsultanta nie stwierdza opóźnień w realizacji Robót w odniesieniu do Programu.

3.4. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym:

W okresie, którego dotyczy raport, wykonano:

Prace projektowe:

- Procedowanie formalności związanych z wykonaniem prac poza ZRID,
- Przekazanie rewizji PSOR do zatwierdzenia przez zarządców dróg: UM Zielona Góra oraz GDDKiA Zielona Góra,
- Przekazanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego nr 23.1 – Projekt Organizacji Ruchu na Czas Budowy,
- Przekazanie do Urzędu Miasta przez Projektanta uzupełnienia do Projektu Stałej Organizacji Ruchu,
- Przekazanie do IK KNA nr 23/I/05 dot. Konstrukcji nawierzchni dróg do obsługi przyległego terenu,
- Przekazanie do IK Projektu rekonstrukcji - zabezpieczenia kurhanu nr 4 w miejscowości Zielona Góra - Ochla 42.
- Inne sprawozdania:
 - Przekazanie do IK opracowania wyników badań archeologicznych w km 6+300 - 6+500.

Roboty przygotowawcze i budowlane:

- GWN
 - km 1+525 – 1+587 TG
 - km 2+550 – 2+710 DR nr 2
- Roboty ziemne – nasyp:
 - km 1+885 – 2+100 TG
 - km 4+170 – 4+190 TG - PG3
 - km 8+500 – 8+630 TG – Rondo Racula
 - 11+150 – 11+208 TG- PG5
 - 11+220 – 11+280 TG- PG5
 - km 0+040 – 0+067 DR nr 1
 - km 0+085 – 0+123 DR nr 1
 - km 2+580 – 2+690 DR nr 2
- Roboty ziemne – podłoże pod nasyp:
 - km 0+000 – 0+227 DR nr 1

- km 2+720 – 2+800 DR nr 2
- Roboty ziemne – wykop:
 - km 0+060 – 0+115 DP1071F strona lewa
 - km 0+080 – 0+155 DP1071F strona prawa
 - km 5+020 – 5+045 TG – Rondo Ochla
- Rozbiórki nawierzchni dróg:
 - km 0+000 – 0+221 DW282
 - km 0+000 – 0+228 DW283 strona lewa
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie
 - km 5+020 – 5+045 TG
 - km 8+500 – 8+630 TG – Pierścień ronda Jędrzychów
 - km 0+060 – 0+115 DP1071F strona lewa
 - km 0+080 – 0+155 DP1071F strona prawa
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie
 - km 4+915 – 5+021 TG – wyspa
 - km 5+068 – 5+158 TG – wyspa
 - km 1+900 – 2+710 DR nr 2
 - zjazdy Z4 i Z5 w km 10+268
- Warstwa odsączająca
 - km 1+500 – 2+710 DR nr 2
- Podłoże pod konstrukcję i warstwa odcinająca
 - zjazdy Z4 i Z5 w km 10+268
- Ułożenie kostki brukowej na podsypce
 - km 4+915 – 5+021 TG wyspa
 - km 5+068 – 5+158 TG wyspa
 - km 8+355 – 8+465 TG wyspa
- Ułożenie krawężników
 - km 5+045 TG – Rondo Ochla (tarcza ronda)
- Wykonanie ścieku trójkątnego
 - km 5+010 – 5+029 TG strona prawa
 - km 0+092 – 0+121 DP1071F strona lewa
- Wykonanie umocnienia rowów
 - km 4+987 – 5+033 TG strona prawa
 - km 5+054 – 5+072 TG strona lewa
 - km 5+085 – 5+122 TG strona lewa
 - km 5+087 – 5+123 TG strona prawa
 - km 5+921 – 5+945 TG strona lewa
 - km 7+474 – 7+491 TG strona lewa
 - km 10+987 – 10+995 TG strona lewa
 - km 11+008 – 11+030 TG strona lewa
 - km 11+089 – 11+138 TG strona prawa
 - km 0+088 – 0+103 DP1071F strona lewa
- Wykonano przepusty rurowe
 - km 5+045 – PDRz 15
 - km 11+222,03 – PDRz 36
- Wykonano kanalizację deszczową z zakresu :

- Wpusty wraz z przykanalikami: wkd30, wkd31, wkd47, wkd48, wkd49, wkd50, wkd51, wkd52, wkd53, wkd54, wkd55, wkd56, wkd57, wkd58, wkd59, wkd60, wkd61, wkd62, wkd96, wkd97, wkd98, wkd112, wkd113
- Wyloty przykanalików: wkd63, wkd64, wkd65, wkd66, wkd67, wkd71, wkd72, wkd73, wkd74, wkd79, wkd80, wkd81
- Prace teletechniczne:
 - Wykonanie studni SK04, SK05, SK06, SK07, SK08, SK10, SK11, SK12, SK13, SK14, SK15, SK33
 - Wykonanie rurociągu w km 0+585 – 2+305, 5+035, 5+040-5+060
- Prace elektryczne:
 - km 0+100 (E031-E032, E029-E030)
 - km 5+020 – 5+040 (E69-E70, E075-E076, E061-E062, E063-E064, E083-E084)
- Oświetlenie:
 - km 8+450 – 8+523 (E426-E428, E430-E432, E433-E438, E309-E337, E505-506)
 - km 5+020 – 5+045 (E224-E227, E221-E224, E219-E220, E209-E218)
- Obiekty :

Obiekt PG-1

 - Wykonanie odwodnienia za ścianami w osi nr 1 i 2,
 - Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe (w osi nr 1 i 2).

Obiekt PG-2

 - Betonowanie ustroju nośnego,
 - Deskowanie, zbrojenie i betonowanie skrzydeł w osi nr 1,
 - Deskowanie i zbrojenie skrzydeł w osi nr 2.

Obiekt PG-3

 - Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe (w osi nr 1 i 2).

Obiekt PG-4

 - Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ściany w osi nr 2,
 - Przygotowanie podparcia i deskowania pod ustrój nośny,
 - Zbrojenie ustroju nośnego.

Obiekt PG-5

 - Wykonanie izolacji „na zimno” powierzchni odziemnych,
 - Zasypanie ław fundamentowych,
 - Rozpoczęcie wykonania zasypek za ścianami i stożków.
