


RAPORT MIESIĘCZNY KONSULTANTA Z POSTĘPU PRAC

NR 40

za okres: Maj 2022 r.

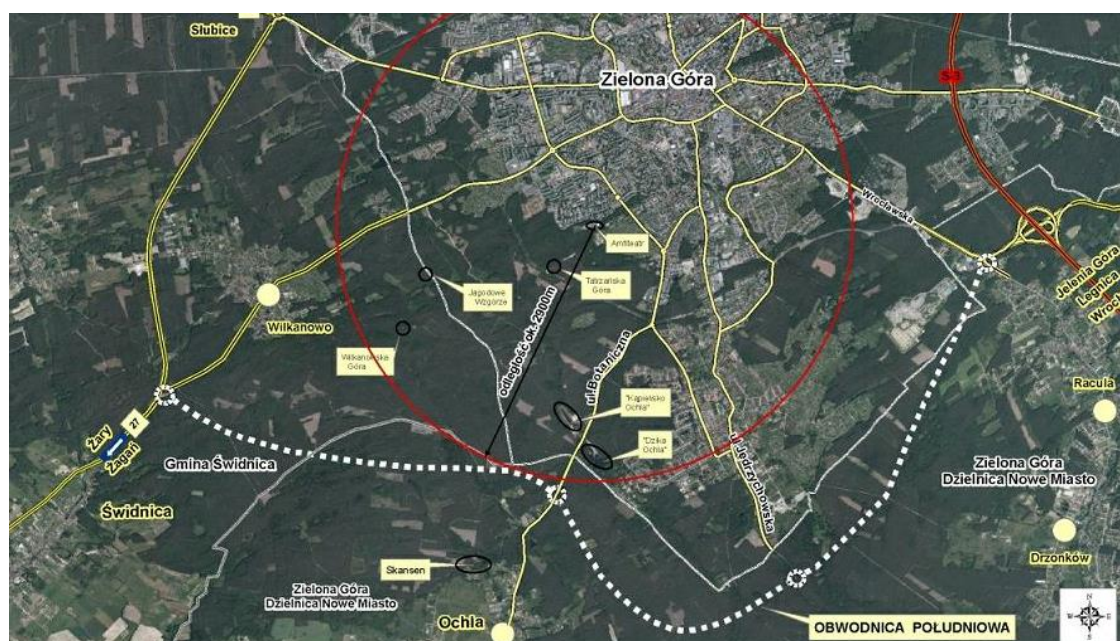

PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ
ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA:
„BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA ZIELONA GÓRA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ”

3. POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT WYKONAWCY WRAZ Z ANALIZĄ POSTĘPU WYKONANYCH ROBÓT

3.1. Program prac projektowych i Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z Programem dla etapu Robót z dnia 18.12.2020, wer. 00 rew. 01.

3.3. Postęp robót w odniesieniu do aktualnego Programu

Zespół Konsultanta nie stwierdza opóźnień w realizacji Robót w odniesieniu do Programu.

3.4. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym:

W okresie, którego dotyczy raport, wykonano:

Prace projektowe:

- Procedowanie formalności związanych z wykonaniem prac poza ZRID,

Roboty przygotowawcze i budowlane:

- Wykop:
 - 0+280-0+550,
 - DW 282,
 - D=K-27.
- Profilowanie skarp nasypów i wykopów oraz terenów płaskich:
 - 0+600 – 1+000,
 - 4+050 – 4+250,
 - 5+100 – 5+900,
 - 6+500 – 6+710 – PG4,
 - 8+600 – 10+300,
 - 11+150 – 11+208 – PG5,
 - 11+220 – 11+280.
- Nasyp:
 - 11+208 – PG5,
 - 6+710 – PG4 – zasypka przy obiektach,
 - Droga gminna 7205F:
 - 1+800 – 2+208,
 - 0+800 – 1+000,
 - 0+400 – 0+700.
 - 3+370 – 3+480.
- Wymiana gruntu – 0+300 – 0+450,
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej:
 - 2+300 – 2+850,
 - 6+750 – 7+060,
 - 8+780 – 8+840,
 - Rondo R3 – Str. Płd,

- DW 283 – Str. Płd.
- Roboty bitumiczne - Podbudowa:
 - Rondo R3 Jędrzychów DW283 / połówkowo,
 - 8+780 – 8+840,
 - 6+750 – 7+060,
 - 2+800 – 3+350.
- Roboty bitumiczne - Wiążąca:
 - 6+011 – 6+250 Str. P
 - 6+250 – 6+700 Str. L+P.
- Roboty brukarskie oraz umocnienia rowów:
 - Rondo R3 Jędrzychów pierścień, ściek trójkątny, krawężniki, kostka granitowa,
 - Rondo R2 Ochla pierścień, ściek trójkątny, krawężniki, kostka granitowa,
 - Umocnienie rowów:
 - 3+500 – 3+750,
 - 1+950 – 2+050,
 - 11+800 – 12+010,
 - 10+840 – 10+910.
- Humusowanie:
 - 11+220 – 11+280,
 - 11+150 – 11+220,
 - 11+800 – 12+000,
 - 8+800 – 9+300,
 - 5+400 – 5+900,
 - 4+250 – 4+700.
- Montaż przepustów HDPE – Rondo R2 Ochla,
- Obrukowanie przepustów:
 - rondo R2 Ochla,
 - przepusty DJ17,
 - przepusty DJ12,
 - przepusty DJ13.
- Ścieki trójkątne:
 - 1+500 – 1+650,
 - 2+000 – 2+100,
 - 3+200 – 3+350.
- Montaż wpustów:
 - rondo R3 Jędrzychów/ DW283,
 - PG4,
 - 6+710,
 - 6+740.
- Oświetlenie:
 - R1 – wyspa,
 - DW282,
 - TG od Ronda R1 - 0+250.
- Zasilanie:
 - 0+115 DW282 przepust,
 - 0+050 DP1071F przepust,
 - 5+100 – 5+935
- Kanał Technologiczny - 5+090-5+935 (wraz ze studniami).

- PG-1
 - Izolacja z papy pod kapami chodnikowymi na ustroju nośnym,
 - Izolacja płyt przejściowych,
- PG-2
 - Wykonanie zasypek za ścianami i stożków,
 - Zakończenie izolacji „na zimno” powierzchni odziemnych,
 - Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe,
 - Izolacja z papy pod kapami chodnikowymi,
- PG-3
 - Izolacja z papy pod kapami chodnikowymi na ustroju nośnym,
 - Izolacja płyt przejściowych,
- PG-4
 - Izolacja z papy pod kapami chodnikowymi na ustroju nośnym,
 - Wykonanie zasypek za ścianami i stożków,
 - Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe.
- PG-5
 - Izolacja z papy pod kapami chodnikowymi na ustroju nośnym,
 - Izolacja płyt przejściowych,
 - Ułożenie krawężników kamiennych na ustroju nośnym
