

SEKCJA I

[illegible]

[illegible]

SEKCJA II

nr pozycji z programu	asortyment robót	data rozpoczęcia zgodnie z programem	data zakończenia zgodnie z programem	wykonano do okresu [szacowane % ilości]	wykonano w okresie [szacowane % ilości]	narastająco [szacowane % ilości]	4+100	4+150	4+200	4+250	4+300	4+350	4+400	4+450	4+500	4+550	4+600	4+650	4+700	4+750	4+800	4+850	4+900	4+950	4+1000	4+1050	4+1100	4+1150	4+1200	4+1250	4+1300	4+1350	4+1400	4+1450	4+1500	4+1550	4+1600	4+1650	4+1700	4+1750	4+1800	4+1850	4+1900	4+1950	4+2000								
174	Roboty przygotowawcze	31.03.2021	18.05.2022			0,00%																																															
175	Karczowanie z wywózką	31.03.2021	13.05.2021	100,00%	0,00%	100,00%																																															
176	Odhumosowanie	14.05.2021	02.06.2021	100,00%	0,00%	100,00%																																															
177	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I	01.04.2022	11.04.2022			0,00%																																															
178	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II	10.05.2022	18.05.2022			0,00%																																															
179	Roboty ziemne	04.06.2021	17.06.2022			0,00%																																															
180	Wykop	04.06.2021	02.09.2021	97,00%	3,00%	100,00%																																															
182	Nasyp	04.06.2021	17.06.2022	100,00%	0,00%	100,00%																																															
186	GWN	17.08.2021	03.09.2021	100,00%	0,00%	100,00%																																															
187	profilowanie skarp nasypów i wykopów	30.09.2021	17.06.2022	95,00%	4,00%	99,00%																																															
188	Podbudowy	26.08.2021	10.10.2022			0,00%																																															
189	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej słab. Mech.	26.08.2021	09.06.2022	99,00%	1,00%	100,00%																																															
197	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	30.09.2021	24.08.2022	95,00%	5,00%	100,00%																																															
204	Podbudowa bitumiczna z B.A.	13.12.2021	01.08.2022	94,00%	6,00%	100,00%																																															
212	W-wa wiążąca	06.04.2022	12.09.2022			0,00%																																															
214	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W; gr. 8 cm - TG	06.04.2022	20.04.2022	88,00%	12,00%	100,00%																																															
219	W-wa ścierna	22.08.2022	09.12.2022			0,00%																																															
227	Roboty wykończeniowe	21.03.2022	14.12.2022			0,00%																																															
229	Humosowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich	21.03.2022	18.08.2022	80,00%	10,00%	90,00%																																															
233	Przepusty	18.06.2021	21.09.2021			0,00%																																															
235	Montaż rur - Przepusty HDPE	18.06.2021	15.07.2021	85,00%	5,00%	90,00%																																															
237	Przepusty stalowe	12.07.2021	21.09.2021	70,00%	0,00%	70,00%																																															

Legenda

Roboty zakończone	
Roboty w trakcie	są to roboty również planowane na kolejny miesiąc
Roboty planowane	

SEKCJA III

nr pozycji z programu	asortyment robót	data rozpoczęcia zgodnie z programem	data zakończenia zgodnie z programem
281	Roboty przygotowawcze	03.02.2021	13.05.2022
282	Karczowanie z wywózką	03.02.2021	30.03.2021
283	Odhumusowanie	31.03.2021	20.04.2021
284	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I	18.03.2022	28.03.2022
285	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II	05.05.2022	13.05.2022
287	Roboty ziemne	21.04.2021	27.05.2022
288	Wykop	21.04.2021	12.08.2021
292	Nasyp	21.04.2021	27.05.2022
295	GWN	30.07.2021	18.08.2021
297	wymiana gruntu/ ulepszenie gruntu	21.04.2021	27.04.2021
298	profilowanie skarp nasypów i wykopów	16.07.2021	04.04.2022
299	Podbudowy	10.08.2021	26.10.2022
300	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.	10.08.2021	03.06.2022
309	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/30 grubości 20 cm - TG+zjazdy (W-wa I gr. 10 cm)	14.09.2021	29.09.2021
316	Podbudowa bitumiczna z B.A	28.10.2021	04.08.2022
325	W-wa wiążąca	25.11.2021	17.10.2022
326	Warstwa wiążąca z B.A.	25.11.2021	17.10.2022
334	W-wa ścieralna	03.08.2022	17.11.2022

345	Roboty wykończeniowe	13.12.2021	14.12.2022
347	Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich	04.04.2022	08.08.2022
352	Przepusty	18.06.2021	20.04.2022
353	Montaż rur	02.07.2021	15.07.2021
356	Przepusty stalowe	18.06.2021	20.04.2022
359	Elementy Ulic	21.09.2021	06.07.2022
360	Ustawienie krawężników betonowych	21.09.2021	14.06.2022
245	Ścieki trójkątne	21.09.2021	08.10.2021
346	Umocnienie rowów	05.04.2022	01.07.2022
369	Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu	02.08.2022	14.12.2022
381	Kanalizacja deszczowa	04.06.2021	14.06.2022
382	Kanały deszczowe	04.06.2021	17.06.2021
383	Wpusty	18.06.2021	07.07.2021
384	Studnie i separatory	04.06.2021	17.06.2021
385	Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa	20.10.2021	14.06.2022
386	Zbiorniki	16.07.2021	01.09.2021
387	Wykop - zbiorniki	16.07.2021	21.07.2021
388	Roboty wykończeniowe - zbiorniki	22.07.2021	01.09.2021
389	Melioracja	22.07.2021	13.10.2021
390	Przebudowa cieków melioracyjnych	22.07.2021	13.10.2021
391	Roboty elektroenergetyczne	07.07.2021	31.03.2022
392	Przebudowa linii SN	16.07.2021	04.08.2021
393	Montaż fundamentów	23.07.2021	02.08.2021

394	Montaż słupów i opraw	13.12.2021	31.03.2022
395	Budowa zasilania	07.07.2021	26.07.2021
396	Roboty teletechniczne	08.10.2021	05.04.2022
397	Budowa studni kablowych	08.10.2021	21.03.2022
398	Budowa kanalizacji teletechnicznej	08.10.2021	21.03.2022
400	Roboty gazowe	09.03.2021	24.06.2021
404	Przebudowa kolizji z istn. Gazociągami	13.05.2021	24.06.2021

Legenda

Roboty zakończone

Roboty w trakcie

Roboty planowane

są to roboty również planowane na kolej

Załącznik nr 2 - Graficzny postęp prac
Raport miesięczny nr 45 za Sierpień 2022 r.


[illegible]


[illegible]

		0,00%															
90,00%	0,00%	90,00%															
		0,00%															
99,00%	0,00%	99,00%															
99,00%	0,00%	99,00%															
		0,00%															
95,00%	0,00%	95,00%															


ny miesiąc


[illegible]

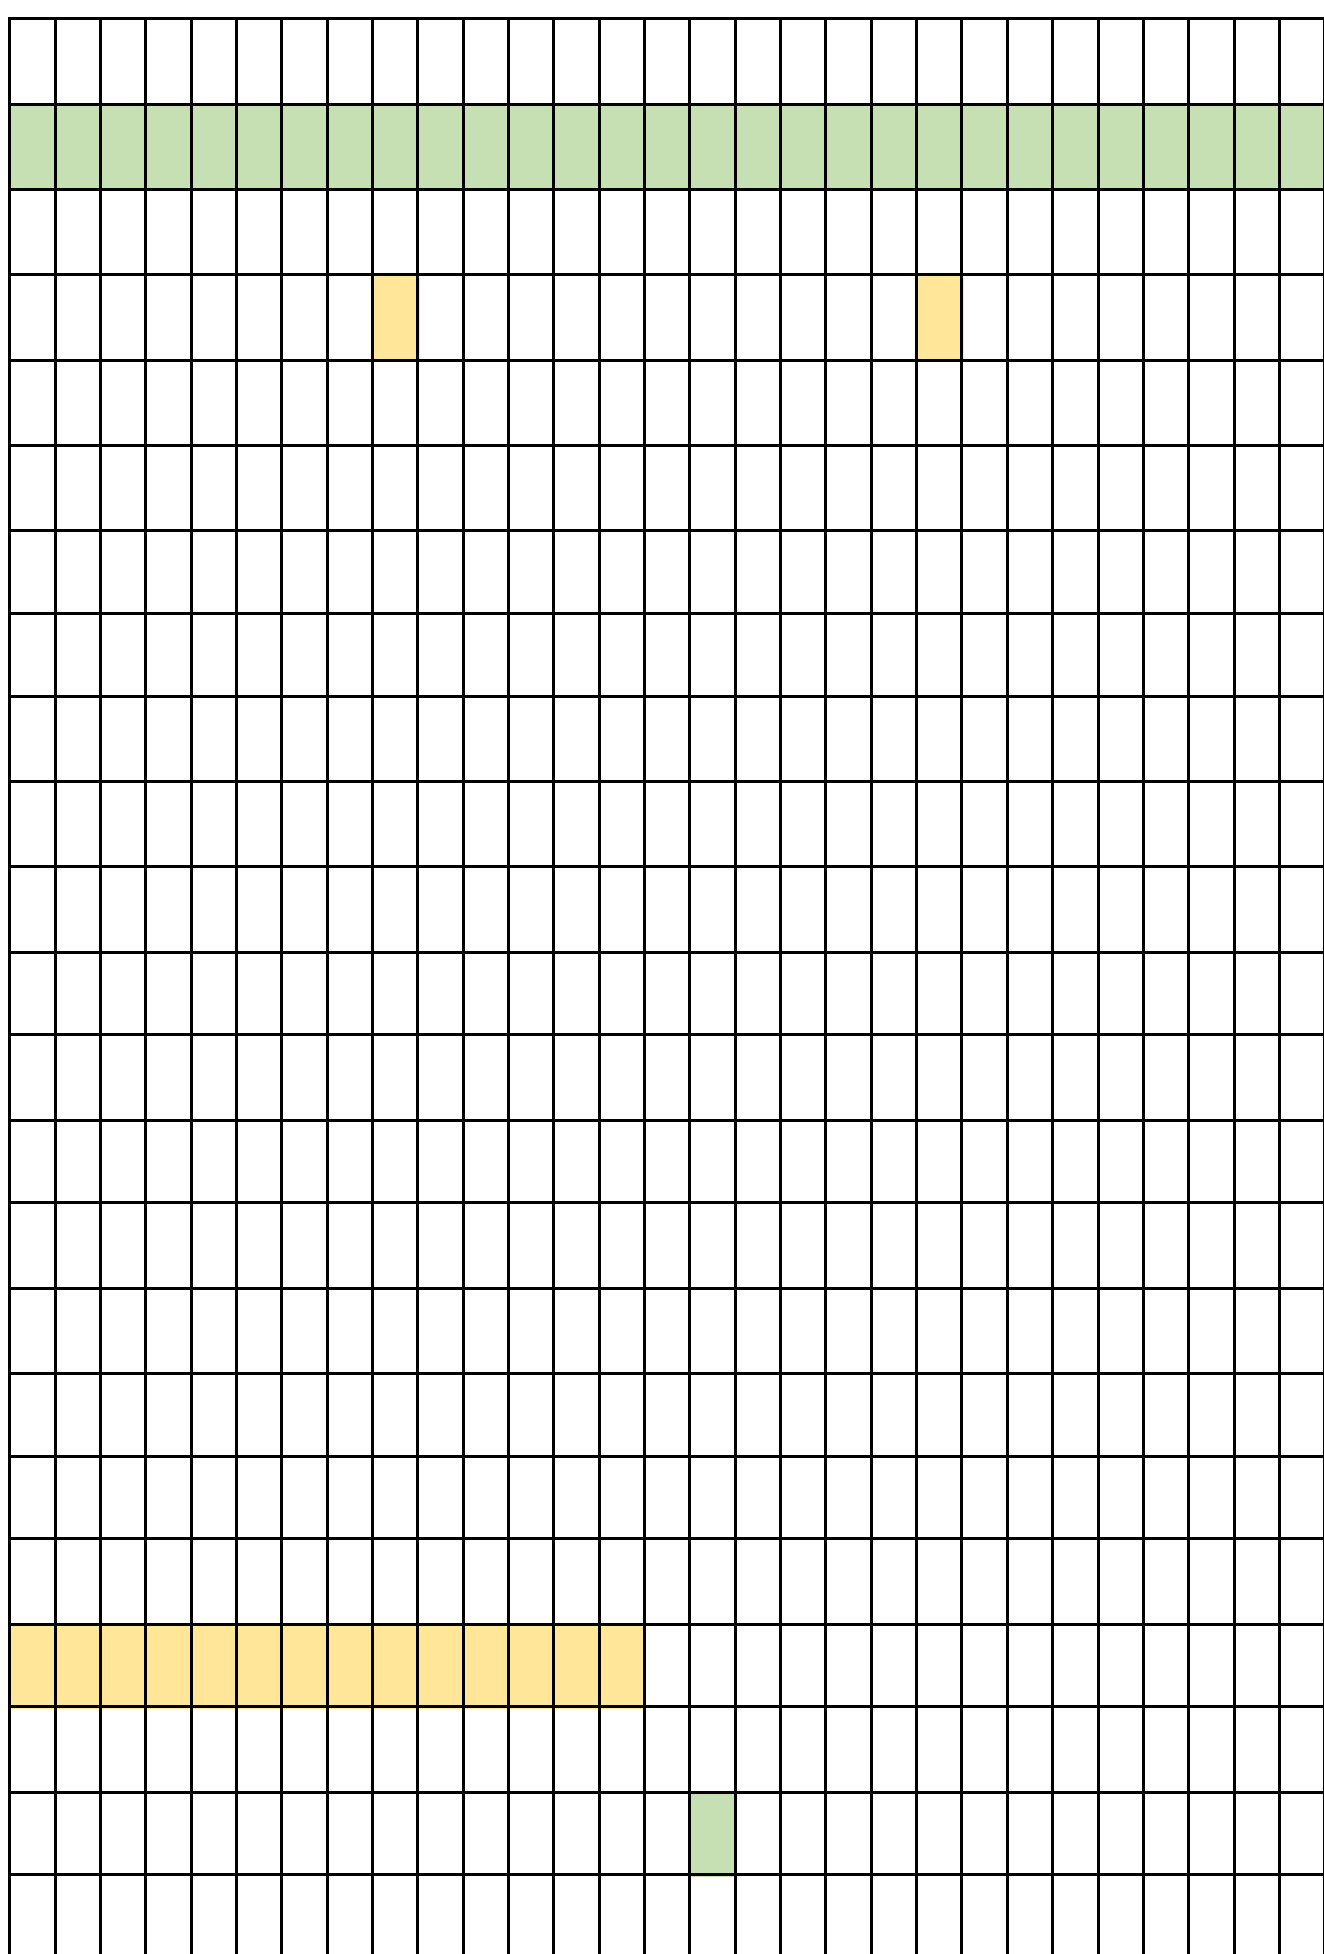

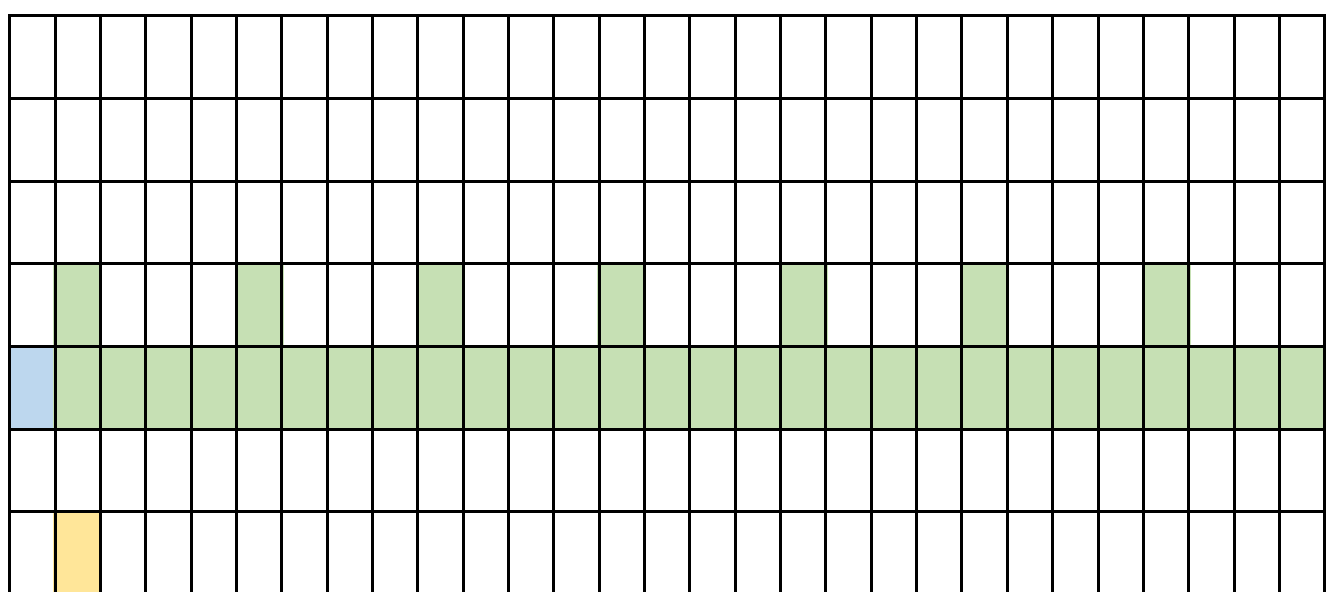

[illegible]

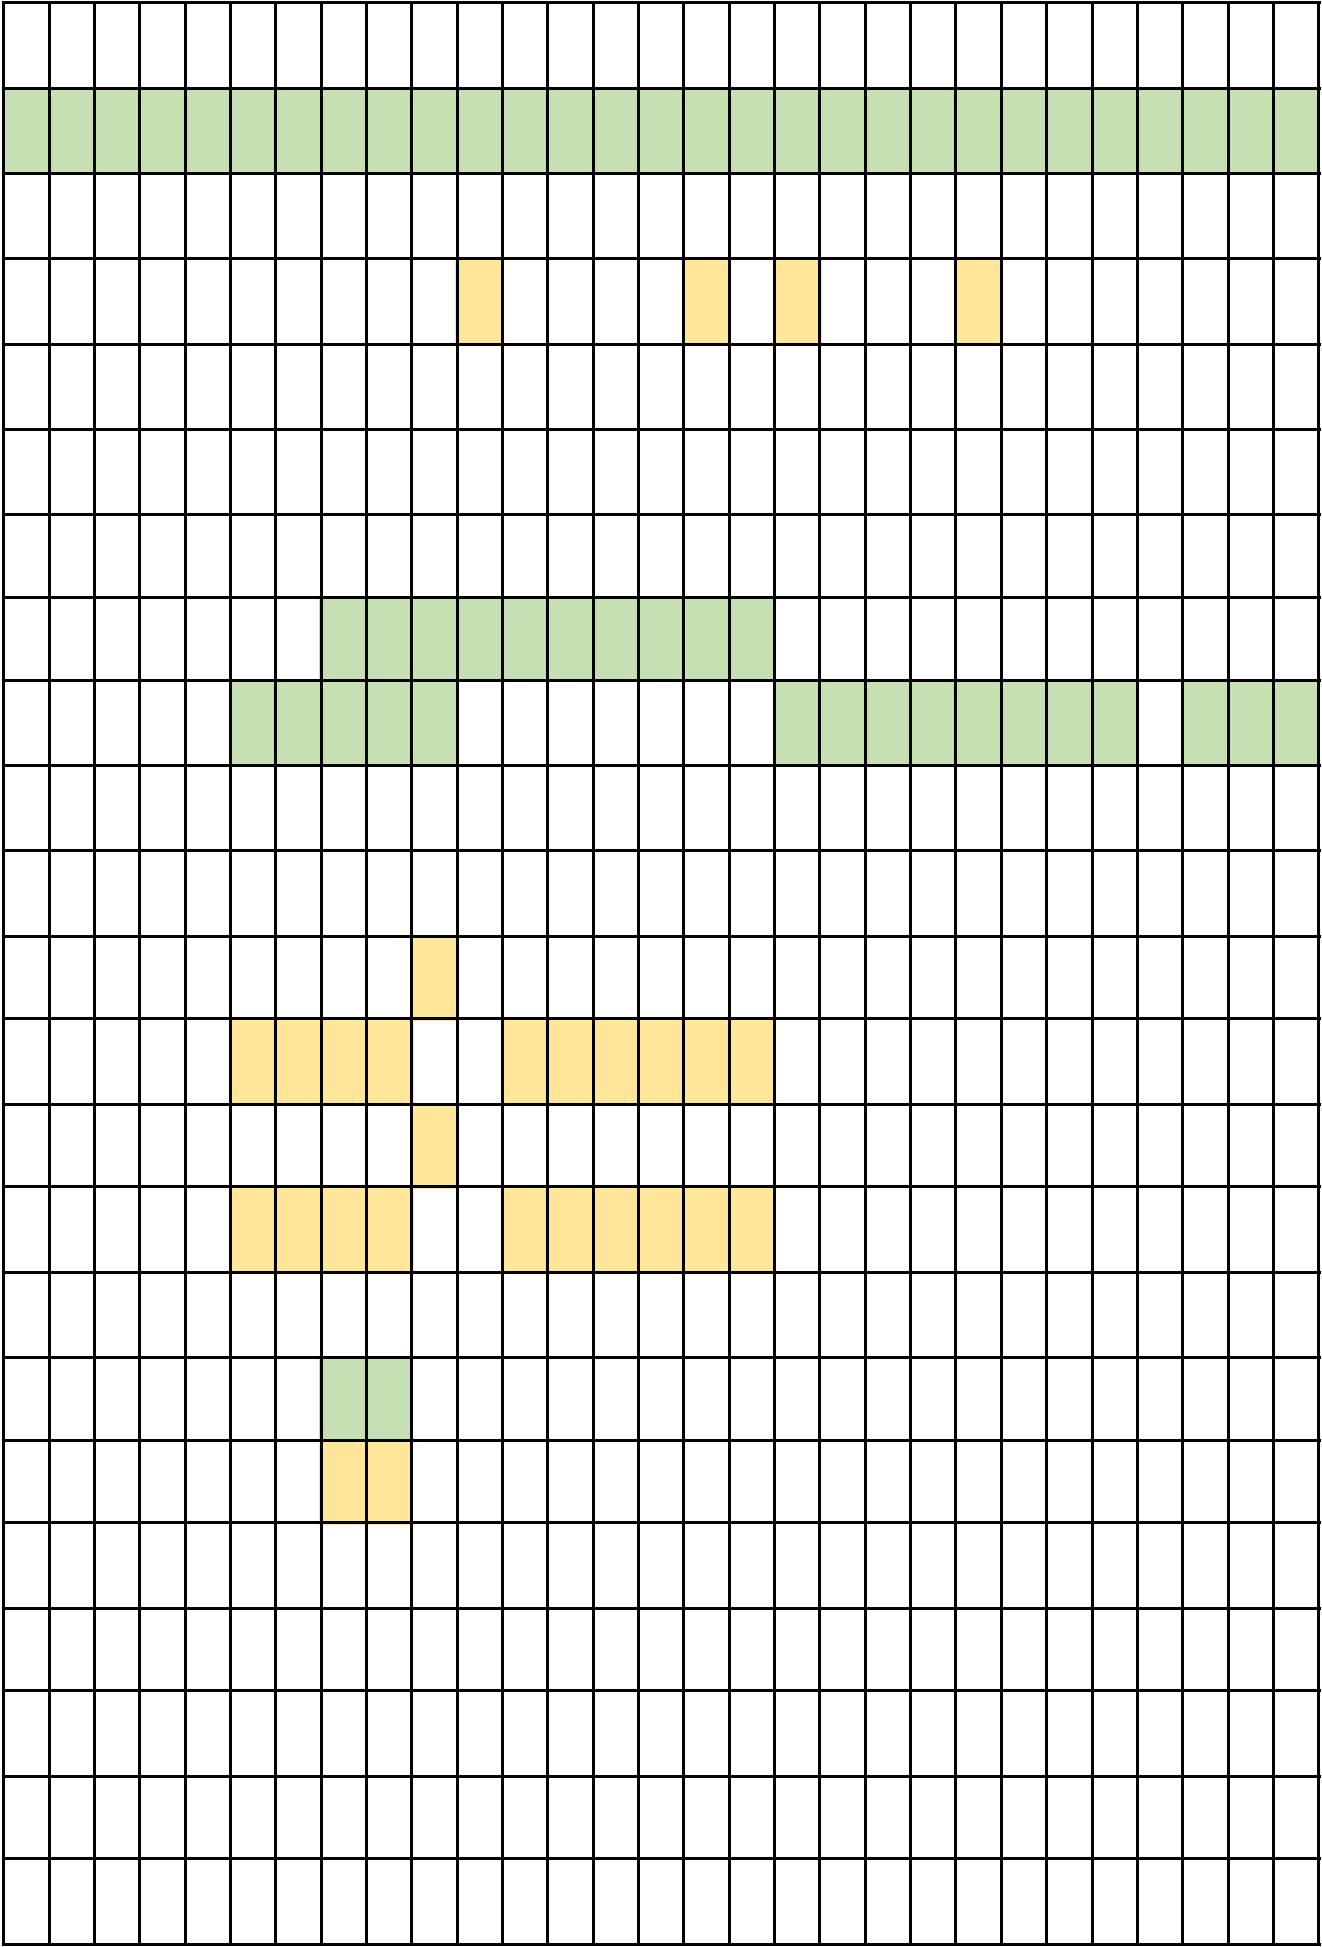

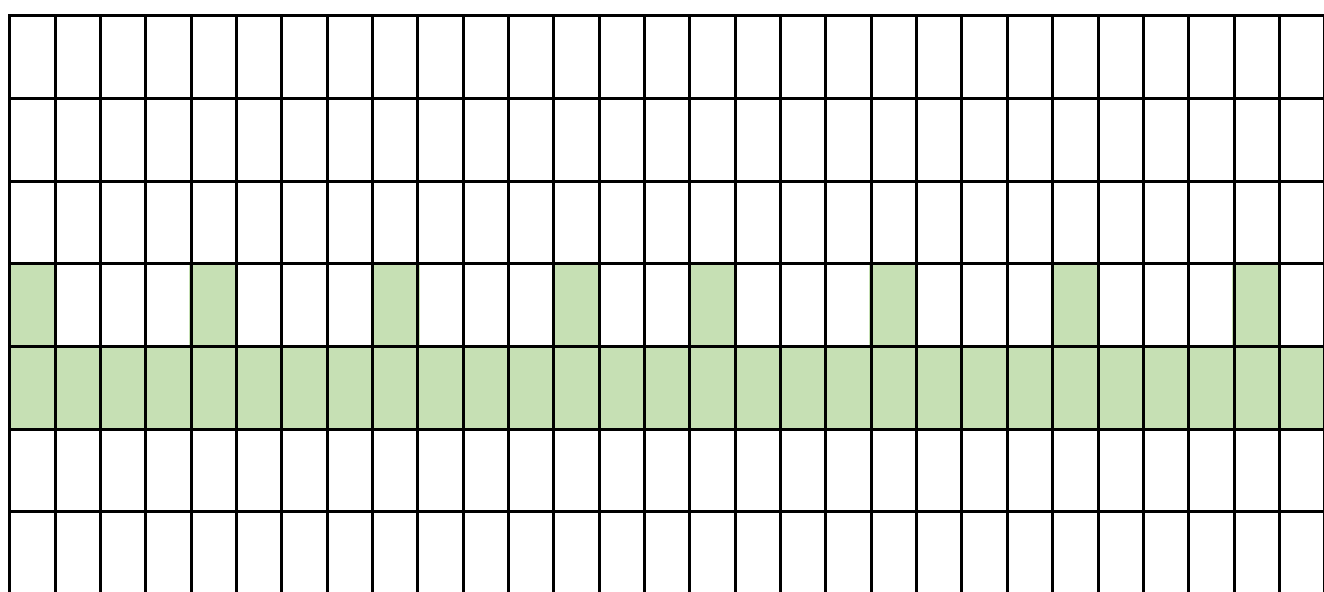

[illegible]

