

## SEKCJA I

[illegible]

[illegible]

## SEKCJA II

[illegible]

### Legenda

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Roboty zakończone |                                                   |
| Roboty w trakcie  | są to roboty również planowane na kolejny miesiąc |
| Roboty planowane  |                                                   |

## SEKCJA III

| nr pozycji z programu | asortyment robót                                                                                                     | data rozpoczęcia zgodnie z programem | data zakończenia zgodnie z programem |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 281                   | Roboty przygotowawcze                                                                                                | 03.02.2021                           | 13.05.2022                           |
| 282                   | Karczowanie z wywózką                                                                                                | 03.02.2021                           | 30.03.2021                           |
| 283                   | Odhumusowanie                                                                                                        | 31.03.2021                           | 20.04.2021                           |
| 284                   | Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I                                                                             | 18.03.2022                           | 28.03.2022                           |
| 285                   | Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II                                                                            | 05.05.2022                           | 13.05.2022                           |
| 287                   | Roboty ziemne                                                                                                        | 21.04.2021                           | 27.05.2022                           |
| 288                   | Wykop                                                                                                                | 21.04.2021                           | 12.08.2021                           |
| 292                   | Nasyp                                                                                                                | 21.04.2021                           | 27.05.2022                           |
| 295                   | GWN                                                                                                                  | 30.07.2021                           | 18.08.2021                           |
| 297                   | wymiana gruntu/ ulepszenie gruntu                                                                                    | 21.04.2021                           | 27.04.2021                           |
| 298                   | profilowanie skarp nasypów i wykopów                                                                                 | 16.07.2021                           | 04.04.2022                           |
| 299                   | Podbudowy                                                                                                            | 10.08.2021                           | 26.10.2022                           |
| 300                   | Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.                                                            | 10.08.2021                           | 03.06.2022                           |
| 309                   | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/30 grubości 20 cm - TG+zjazdy (W-wa I gr. 10 cm) | 14.09.2021                           | 29.09.2021                           |
| 316                   | Podbudowa bitumiczna z B.A                                                                                           | 28.10.2021                           | 04.08.2022                           |
| 325                   | W-wa wiążąca                                                                                                         | 25.11.2021                           | 17.10.2022                           |
| 326                   | Warstwa wiążąca z B.A.                                                                                               | 25.11.2021                           | 17.10.2022                           |
| 334                   | W-wa ścieralna                                                                                                       | 03.08.2022                           | 17.11.2022                           |

|     |                                                 |            |            |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------------|
| 345 | Roboty wykończeniowe                            | 13.12.2021 | 14.12.2022 |
| 347 | Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich | 04.04.2022 | 08.08.2022 |
| 352 | Przepusty                                       | 18.06.2021 | 20.04.2022 |
| 353 | Montaż rur                                      | 02.07.2021 | 15.07.2021 |
| 356 | Przepusty stalowe                               | 18.06.2021 | 20.04.2022 |
| 359 | Elementy Ulic                                   | 21.09.2021 | 06.07.2022 |
| 360 | Ustawienie krawężników betonowych               | 21.09.2021 | 14.06.2022 |
| 245 | Ścieki trójkątne                                | 21.09.2021 | 08.10.2021 |
| 346 | Umocnienie rowów                                | 05.04.2022 | 01.07.2022 |
| 369 | Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu                 | 02.08.2022 | 14.12.2022 |
| 381 | Kanalizacja deszczowa                           | 04.06.2021 | 14.06.2022 |
| 382 | Kanały deszczowe                                | 04.06.2021 | 17.06.2021 |
| 383 | Wpusty                                          | 18.06.2021 | 07.07.2021 |
| 384 | Studnie i separatory                            | 04.06.2021 | 17.06.2021 |
| 385 | Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa    | 20.10.2021 | 14.06.2022 |
| 386 | Zbiorniki                                       | 16.07.2021 | 01.09.2021 |
| 387 | Wykop - zbiorniki                               | 16.07.2021 | 21.07.2021 |
| 388 | Roboty wykończeniowe - zbiorniki                | 22.07.2021 | 01.09.2021 |
| 389 | Melioracja                                      | 22.07.2021 | 13.10.2021 |
| 390 | Przebudowa cieków melioracyjnych                | 22.07.2021 | 13.10.2021 |
| 391 | Roboty elektroenergetyczne                      | 07.07.2021 | 31.03.2022 |
| 392 | Przebudowa linii SN                             | 16.07.2021 | 04.08.2021 |
| 393 | Montaż fundamentów                              | 23.07.2021 | 02.08.2021 |

|     |                                        |            |            |
|-----|----------------------------------------|------------|------------|
| 394 | Montaż słupów i opraw                  | 13.12.2021 | 31.03.2022 |
| 395 | Budowa zasilania                       | 07.07.2021 | 26.07.2021 |
| 396 | Roboty teletechniczne                  | 08.10.2021 | 05.04.2022 |
| 397 | Budowa studni kablowych                | 08.10.2021 | 21.03.2022 |
| 398 | Budowa kanalizacji teletechnicznej     | 08.10.2021 | 21.03.2022 |
| 400 | Roboty gazowe                          | 09.03.2021 | 24.06.2021 |
| 404 | Przebudowa kolizji z istn. Gazociągami | 13.05.2021 | 24.06.2021 |

Legenda

Roboty zakończone

Roboty w trakcie

Roboty planowane

są to roboty również planowane na kolej



Załącznik nr 2 - Graficzny postęp prac  
Raport miesięczny nr 45 za Sierpień 2022 r.

[illegible]


[illegible]




|        |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |       | 0,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,00% | 0,00% | 90,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |       | 0,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99,00% | 0,00% | 99,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99,00% | 0,00% | 99,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |       | 0,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% | 0,00% | 95,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


ny miesiąc

[illegible]

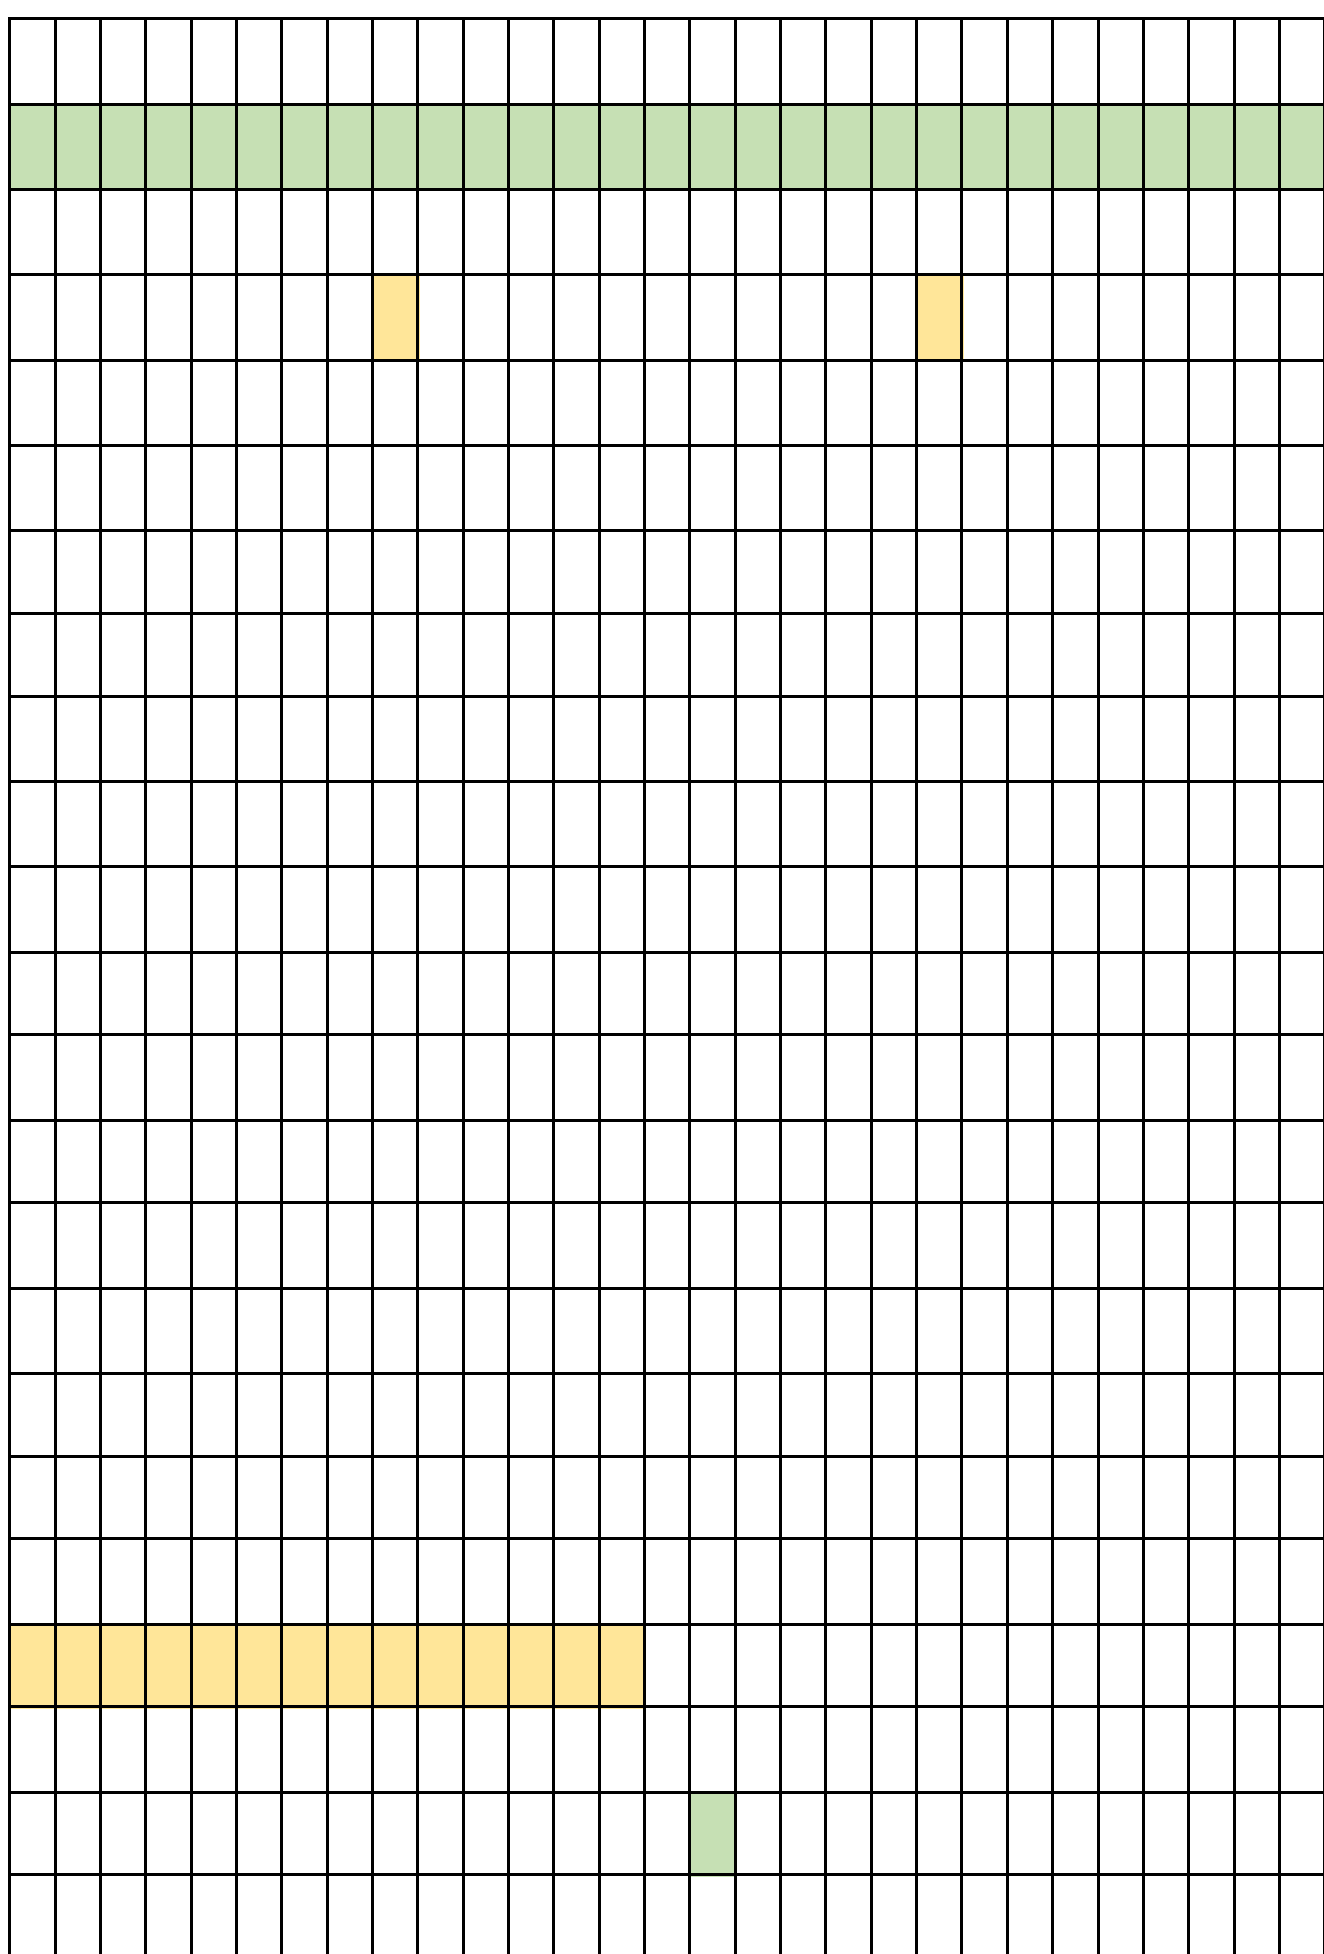


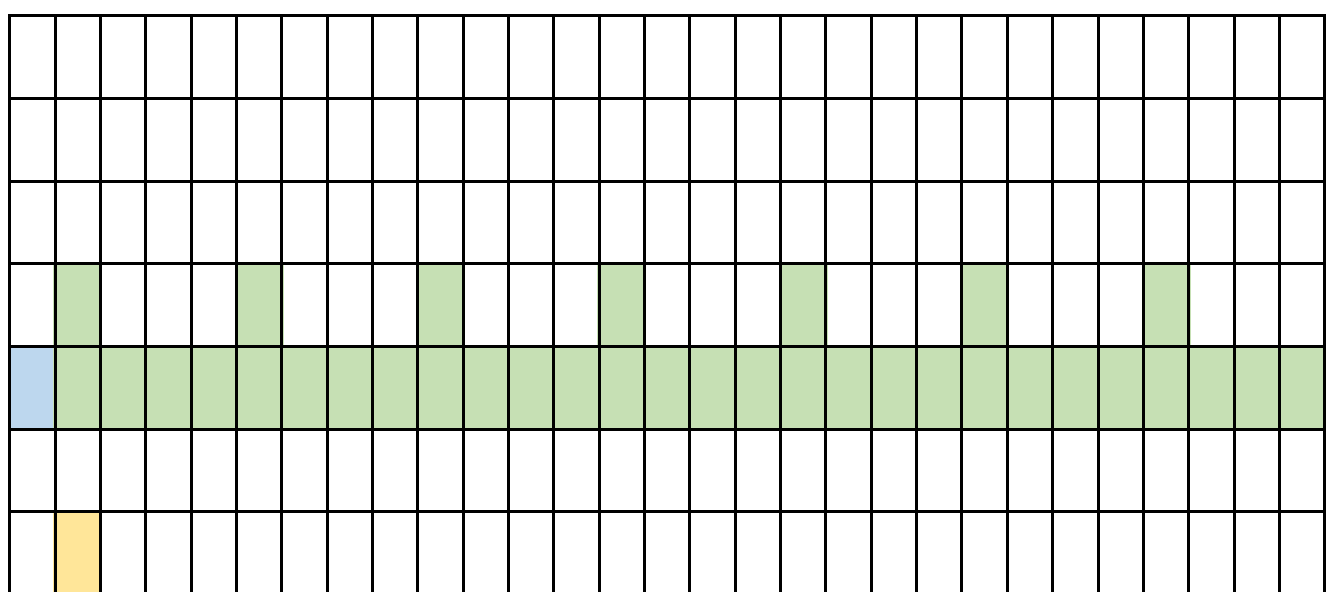

[illegible]

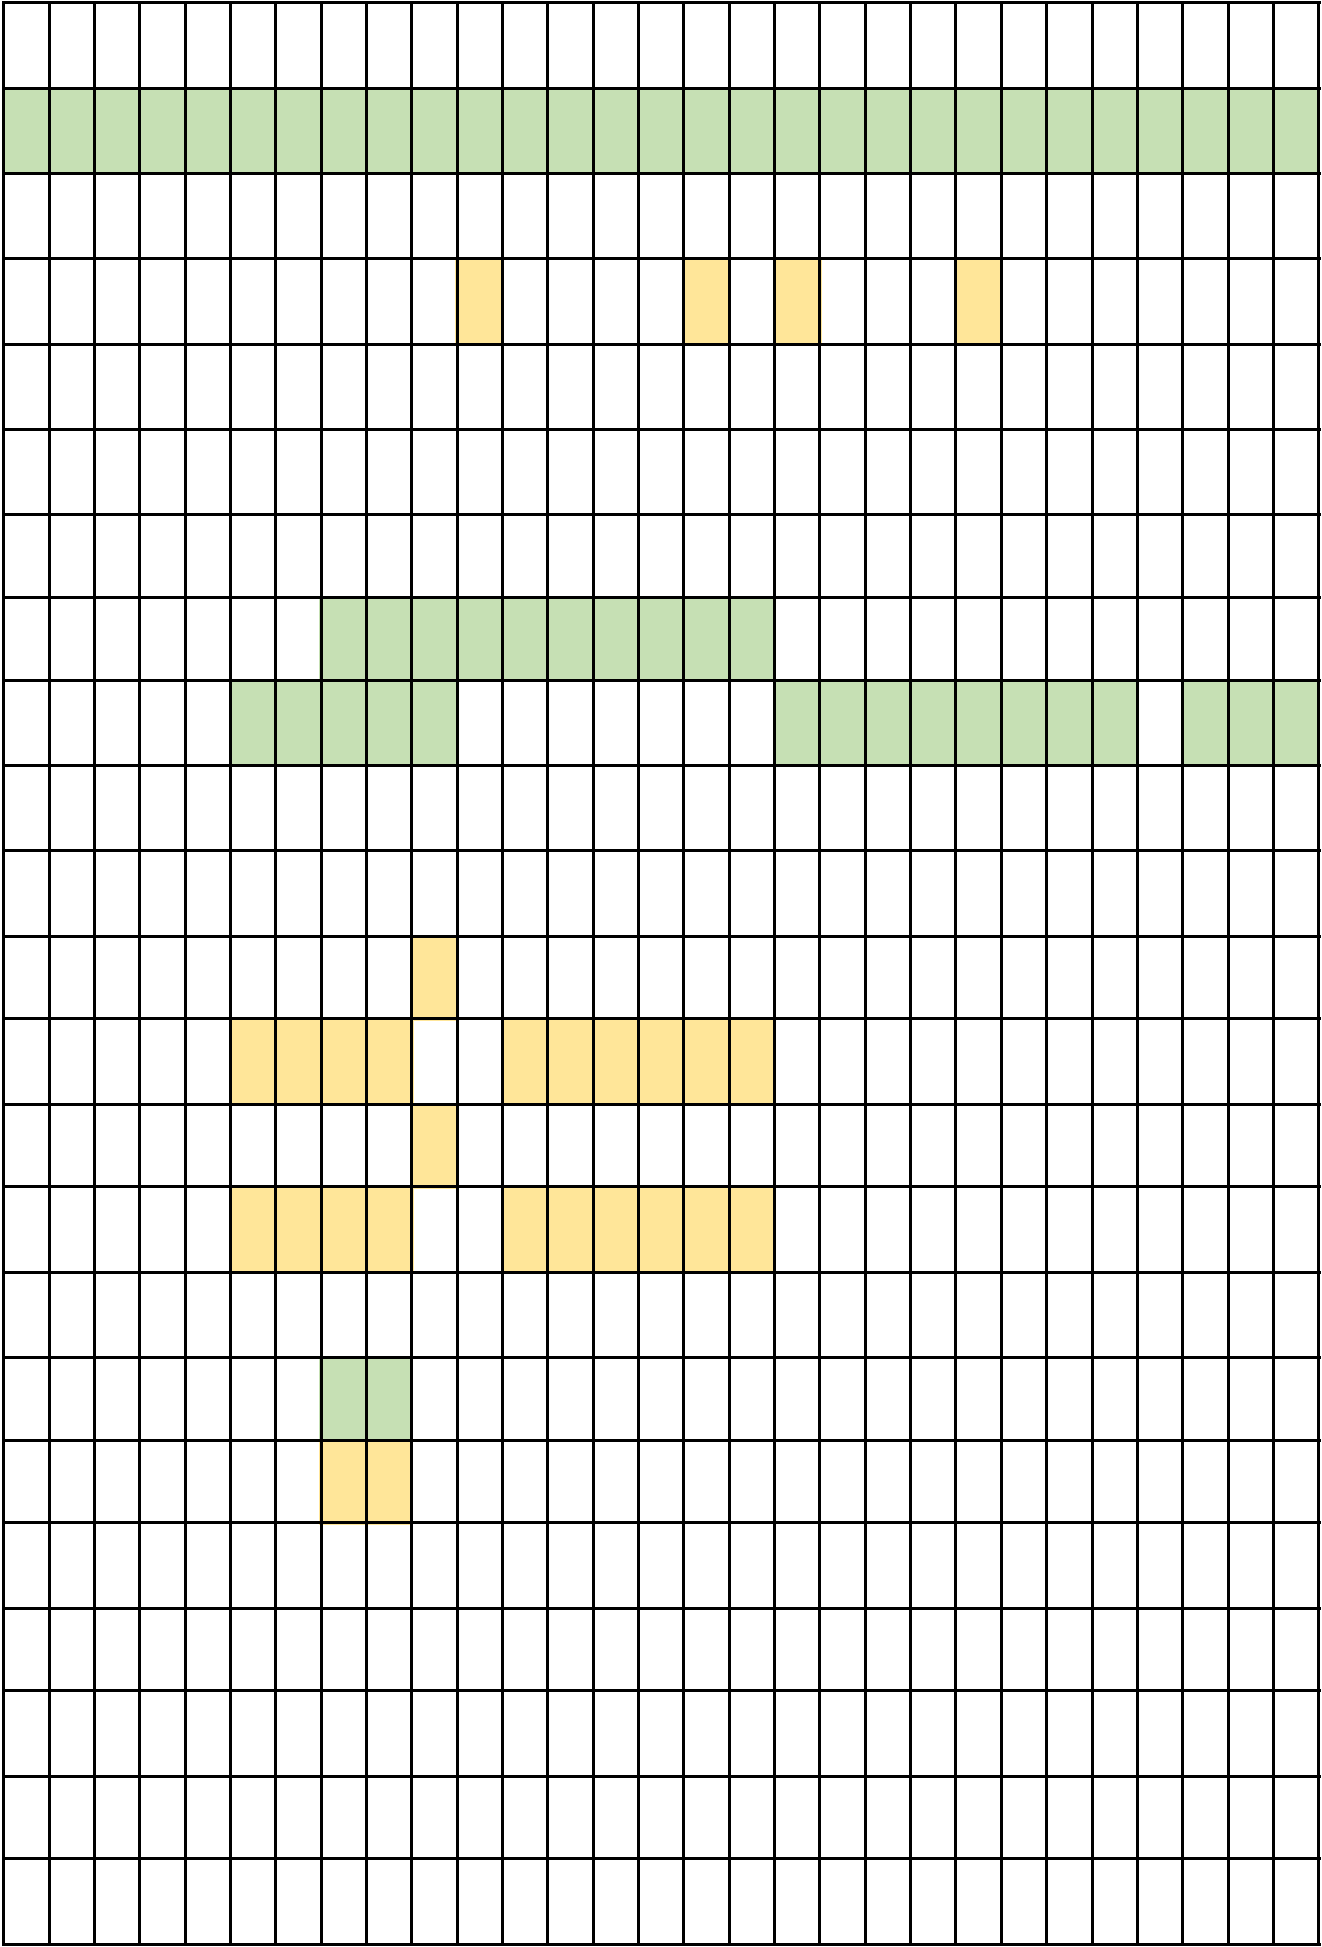



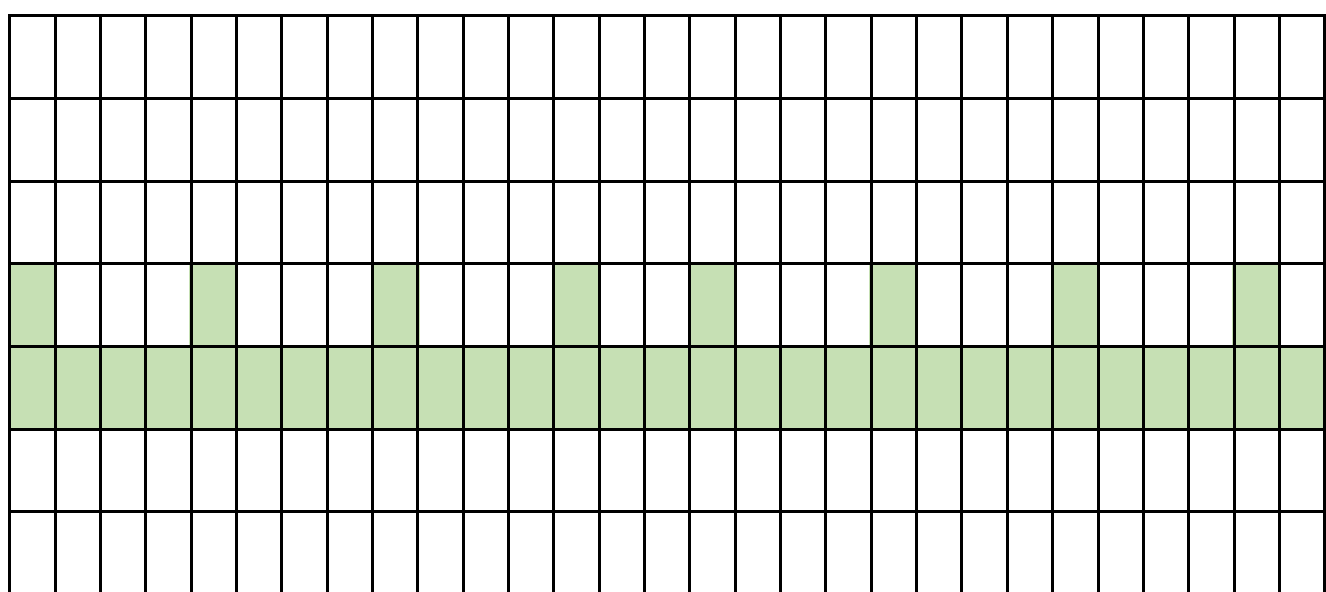

[illegible]



