


OBIEKT PG-2



Legenda:

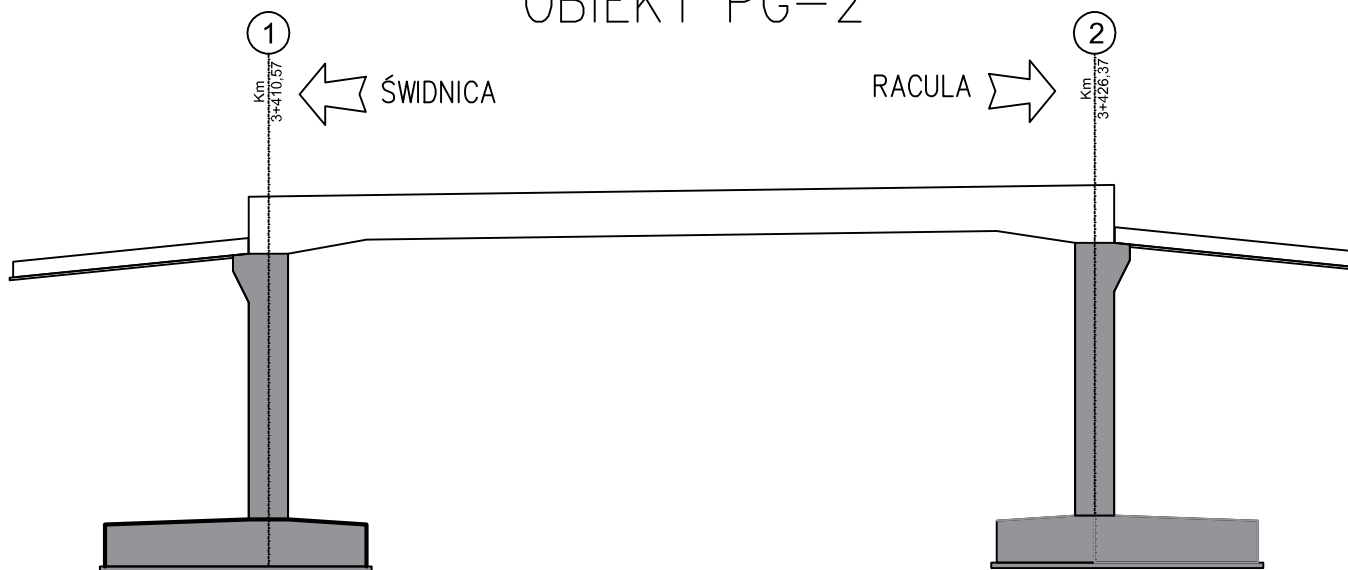


Roboty planowane – przygotowywanie podparcia ustroju nośnego



Roboty wykonane – zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian ramy w osi nr 1 i 2

OBIEKT PG-4

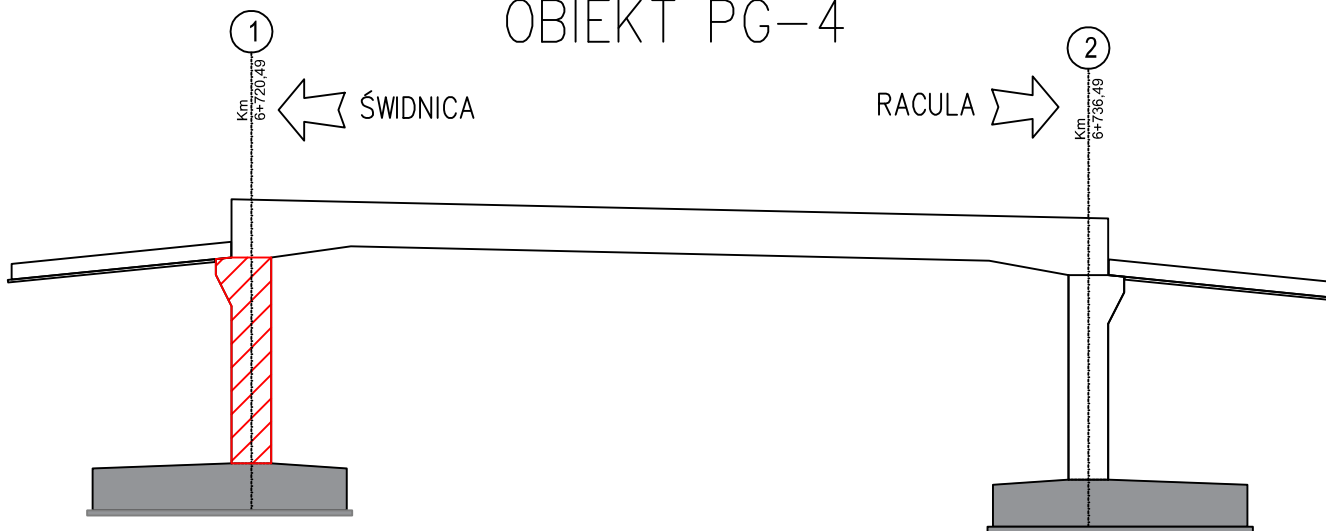

Legenda:



Roboty planowane – zbrojenie i deskowanie ścian w osi nr 1



Roboty wykonane – zasypka wykopów fundamentowych, rozpoczęcie zbrojenia i deskowania ściany w osi nr 1
