


RAPORT MIESIĘCZNY KONSULTANTA Z POSTĘPU PRAC

NR 43

za okres: Sierpień 2022 r.

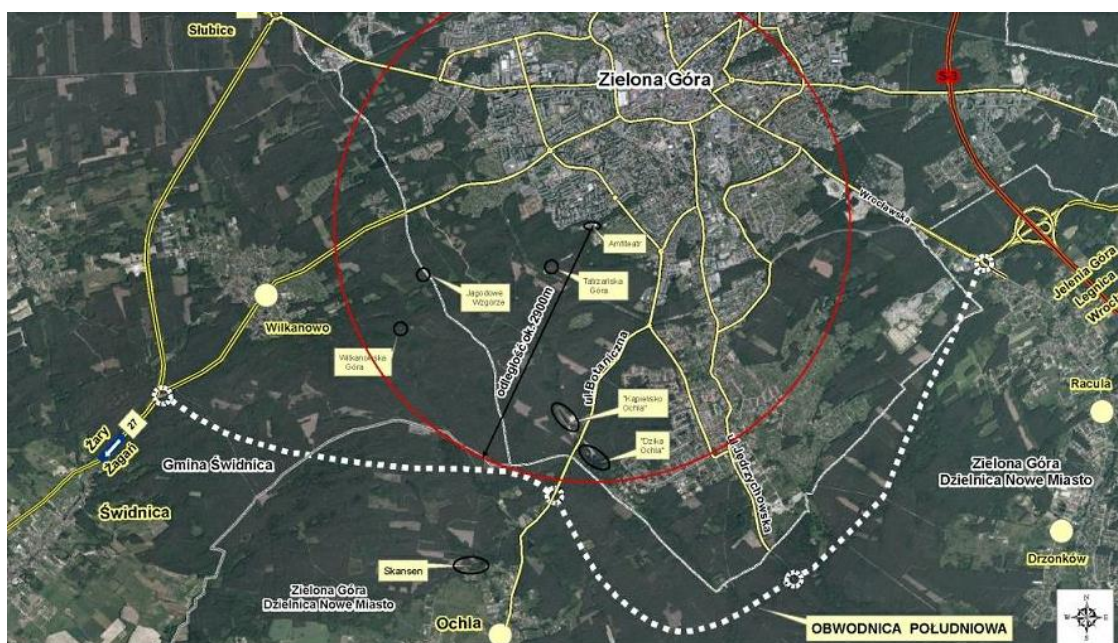

PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ
ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA:
„BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA ZIELONA GÓRA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ”

3. POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT WYKONAWCY WRAZ Z ANALIZĄ POSTĘPU WYKONANYCH ROBÓT

3.1. Program prac projektowych i Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z Programem dla etapu Robót z dnia 18.12.2020, wer. 00 rew. 01.

3.3. Postęp robót w odniesieniu do aktualnego Programu

Zespół Konsultanta nie stwierdza opóźnień w realizacji Robót w odniesieniu do Programu.

3.4. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym:

W okresie, którego dotyczy raport, wykonano:

Prace projektowe:

- Procedowanie formalności związanych z wykonaniem prac poza ZRID,
- Procedowanie zatwierdzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu przez GDDKiA

Roboty drogowe:

- Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II: 0+000, DW283 przy Drodze gminnej (połówkowo),
- Wykop: 3+700 – 3+900, 6+800,
- Profilowanie skarp nasypów i wykopów: 0+000, 1+050-1+250, 3+800-3+900,
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.: 3+750-3+950, 12+530 – 12+640, DW283
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej: 3+750-3+950, 12+530 – 12+640, DW283
- Podbudowa bitumiczna z BA: 0+000, 3+750-3+950,
- Warstwa wiążąca z B.A: 0+000, 3+750-3+950,
- Umocnienie rowów: 0+000 – 1+900,
- Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich: 0+300 – 1+250, 1+700-1+900, 3+450, 4+750-4+950,
- Ustawienie krawężników: 0+000,
- Ścieki trójkątne: 0+050-0+100,
- Zbiornik ZB4,
- Przebudowa cieków melioracyjnych – 1+950, 4+100,
- Kanał Technologiczny: 0+025-0+585 (SK/01, 01.1, 02, 03), odcinek od ronda nr 1 do ronda Piastów Śląskich.
- Roboty brukarskie kostka granitowa – Rondo R2,
- Ściek trójkątny 12+530 – 12+670,
- Ustawienie krawężnika 12+530 – 12+670,

- Umocnienia rowów DJ17, 6+700 – 6+725,
- Profilowanie skarp – 6+800
- Humusowanie - TG Rondo R3 Jędrzychów.

Roboty mostowe:

PG-1

- dreny z kruszywa do odwodnienia izolacji,
- sączki odwodnienia izolacji,
- przygotowanie powierzchni betonowej pod hydrofobizację,
- roboty wykończeniowe,
- naprawy powierzchniowe betonu.

PG-2

- dreny z kruszywa do odwodnienia izolacji,
- sączki odwodnienia izolacji,
- warstwa wiążąca z asfaltu lanego,
- roboty wykończeniowe,
- naprawy powierzchniowe betonu,
- likwidacja zaplecza budowy.

PG-3

- warstwa wiążąca z asfaltu lanego,
- roboty wykończeniowe,
- naprawy powierzchniowe betonu.

PG-4

- dreny z kruszywa do odwodnienia izolacji,
- sączki odwodnienia izolacji,
- roboty wykończeniowe,
- naprawy powierzchniowe betonu,
- porządkowanie placu budowy.

PG-5

- warstwa wiążąca z asfaltu lanego,
- roboty wykończeniowe,
- naprawy powierzchniowe betonu,
- uciąglenie nawierzchni z zastosowaniem siatek zbrojących,
- warstwa ścieralna nawierzchni z SMA.

Plan:

- montaż balustrad
