


RAPORT MIESIĘCZNY KONSULTANTA Z POSTĘPU PRAC

NR 44

za okres: Wrzesień 2022 r.

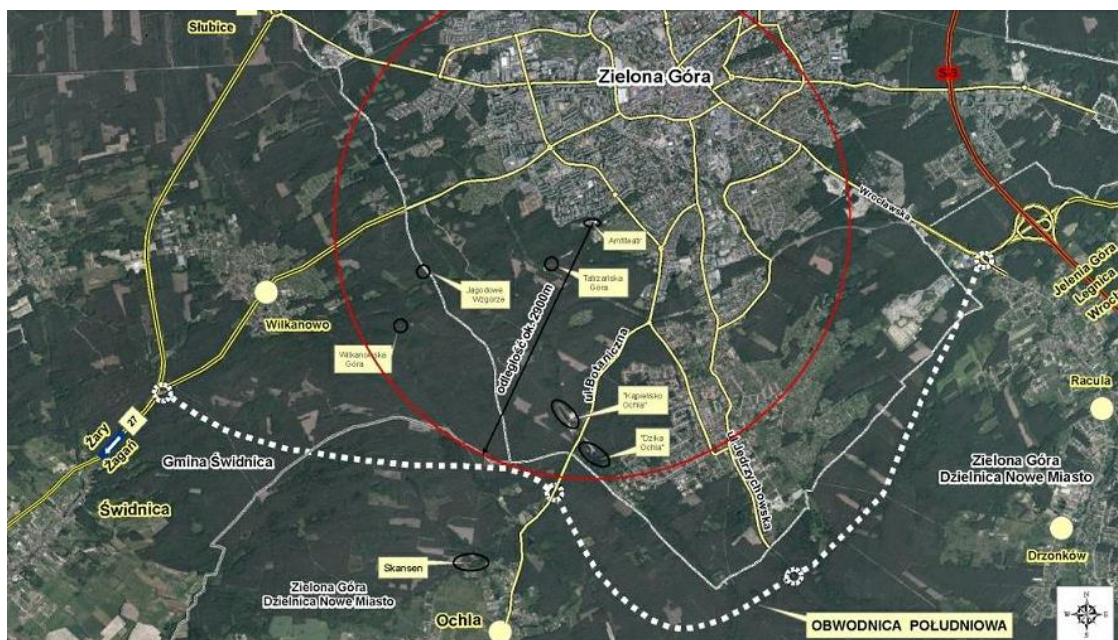

PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ
ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA:
„BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA ZIELONA GÓRA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ”

3. POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT WYKONAWCY WRAZ Z ANALIZĄ POSTĘPU WYKONANYCH ROBÓT

3.1. Program prac projektowych i Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z Programem dla etapu Robót z dnia 18.12.2020, wer. 00 rew. 01.

3.3. Postęp robót w odniesieniu do aktualnego Programu

Zespół Konsultanta nie stwierdza opóźnień w realizacji Robót w odniesieniu do Programu.

3.4. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym:

W okresie, którego dotyczy raport, wykonano:

Prace projektowe:

- Procedowanie formalności związanych z wykonaniem prac poza ZRID,
- Przekazano Protokół Zdawczo-Odbiorczy nr 22 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

Roboty drogowe:

- GWN
- 0+000 – 0+060 DK27 Świdnica
- Roboty ziemne – nasyp
- 0+000 – 0+087 Droga pod PG2
- 0+000 – 0+243,25 DG 7204F
- Roboty ziemne – podłoże pod nasyp
- 0+000 – 0+085 ul. Szparagowa
- 0+000 – 0+087 Droga pod PG2
- zjazd do zbiornika ZB1 (DJ3)
- Wykop
- 0+000 – 0+060 DK27 Świdnica
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego mechanicznie
- 0+010 – 0+085 ul. Szparagowa
- Warstwa mrozochronna
- 0+010 – 0+085 ul. Szparagowa
- Podbudowa pomocnicza
- 0+000 – 0+122,55 DK27 (wylot kierunek Rondo R-1)
- Podbudowa zasadnicza
- 0+030 – 0+115 DW282 wyspa dzieląca

- Warstwa odcinająca
 - 0+000 – 0+690 DJ1
 - 0+000 – 0+300 DJ3
 - 0+000 – 0+300 DJ8
 - 0+000 – 0+087 Droga pod PG2
 - 0+000 – 0+099,95 Droga pod PG3
 - 0+000 – 0+243,25 DG 7204F
- Nawierzchnia z kruszywa 0,63 warstwa I
 - DJ1
 - DJ5
 - DJ7
 - DJ16
- Warstwa SMA AMG
 - 0+036 – 5+020 TG
 - 5+070 – 8+450 TG
- Warstwa SMA PMB
 - 0+000 Rondo R-1
 - 5+045 Rondo R-2
 - 8+480 Rondo R-3
- Warstwa AC11S
 - 0+000 – 0+221,42 DW282
 - 0+000 – 0+228 DW283
 - 0+000 – 0+263,17 DP1071F
- Ustawianie barier
- Umocnienie rowów
 - 3+450 TG
 - 3+800 – 3+950 TG
- Humusowanie
 - 1+550 – 1+650 TG
- Przebudowa cieku melioracyjnego C1- pogłębienie
- Prace przy zbiorniku ZB2 – wykonanie dodatkowego drenażu
- Prace teletechniczne
 - wykonanie studni SK/01/1, SK/01/2/1, SK/01/4
 - wykonanie rurociągu w km 0+100 – 0+220 DW228, 0+050 DP1071F, 5+145 TG

Roboty mostowe:

PG-1

- Naprawy powierzchniowe betonu,
- Uciąglenie nawierzchni z zastosowaniem siatek zbrojących,
- Wykonanie warstwy SMA PMB,
- Porządkowanie placu budowy.

PG-2

- Naprawy powierzchniowe betonu,
- Uciąglenie nawierzchni z zastosowaniem siatek zbrojących,
- Wykonanie warstwy SMA PMB,
- Porządkowanie placu budowy.

PG-3

- Naprawy powierzchniowe betonu,
- Uciąglenie nawierzchni z zastosowaniem siatek zbrojących,
- Wykonanie warstwy SMA PMB,
- Porządkowanie placu budowy.

PG-4

- Naprawy powierzchniowe betonu,
- Uciąglenie nawierzchni z zastosowaniem siatek zbrojących,
- Porządkowanie placu budowy,
- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z SMA.

PG-5

- Naprawy powierzchniowe betonu,
- Porządkowanie placu budowy.
