


za okres: Grudzień 2022 r.

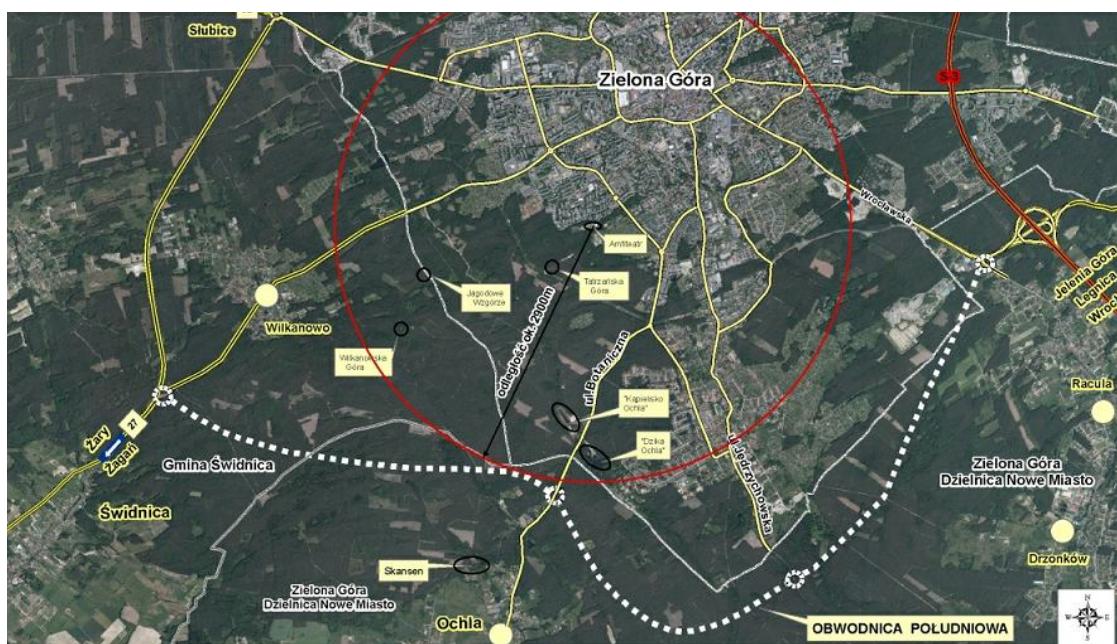

PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ
ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA:
„BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA ZIELONA GÓRA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ”

3. POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT WYKONAWCY WRAZ Z ANALIZĄ POSTĘPU WYKONANYCH ROBÓT

3.1. Program prac projektowych i Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z Programem dla etapu Robót z dnia 18.12.2020, wer. 00 rew. 01.

3.3. Postęp robót w odniesieniu do aktualnego Programu

Zespół Konsultanta nie stwierdza opóźnień w realizacji Robót w odniesieniu do Programu.

3.4. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym:

W okresie, którego dotyczy raport, wykonano:

W okresie, którego dotyczy raport, wykonano:

Roboty drogowe:

- Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0,63
 - 0+000 – 0+675,00 DG7205F
 - 0+000 – 0+112,10 DJ4
 - 0+000 – 0+636,06 DJ8
 - 0+000 – 0+099,95 Droga pod PG3
- Ustawianie barier i balustrad
- wykonywania oznakowania pionowego
- Roboty brukarskie
 - Rondo R1/DK27/DK32
- Humusowanie prowadzono na TG, DG7205F
- Roboty teletechniczne i elektroenergetyczne

Roboty mostowe:

PG-1

- obrukowanie reperów stałych,
