

Załącznik nr 6 - Graficzny postęp prac  
Raport miesięczny nr 39 za Kwiecień 2022 r.

## SEKCJA I

[illegible]

[illegible]


|     |                                                    |            |            |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 160 | Roboty elektroenergetyczne                         | 16.03.2022 | 19.10.2022 |     |     | 0,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Montaż fundamentów - TG                            | 05.04.2022 | 17.06.2022 |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Montaż fundamentów - ronda                         | 27.09.2022 | 10.10.2022 | 5%  | 0%  | 5,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Budowa zasilania (transformator, kable)<br>- TG    | 16.03.2022 | 10.06.2022 | 30% | 20% | 50,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Budowa zasilania (transformator, kable)<br>- ronda | 05.09.2022 | 23.09.2022 | 70% | 10% | 80,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Roboty teletechniczne                              | 09.05.2022 | 18.07.2022 |     |     | 0,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Budowa studni kablowych                            | 09.05.2022 | 04.07.2022 | 30% | 45% | 75,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Budowa kanalizacji teletechnicznej                 | 09.05.2022 | 04.07.2022 | 30% | 45% | 75,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Montaż światłowodów                                | 05.07.2022 | 18.07.2022 | 1%  | 0%  | 1,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Roboty wodociągowe                                 | 29.04.2021 | 28.05.2021 | 0%  |     | 0,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oki | Likwidacja kolizji wodociągowej                    | 29.04.2021 | 28.05.2021 | 80% | 0%  | 80,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


Legenda

- Roboty zakończone
- Roboty w trakcie
- Roboty planowane

są to roboty również planowane na kolejny miesiąc



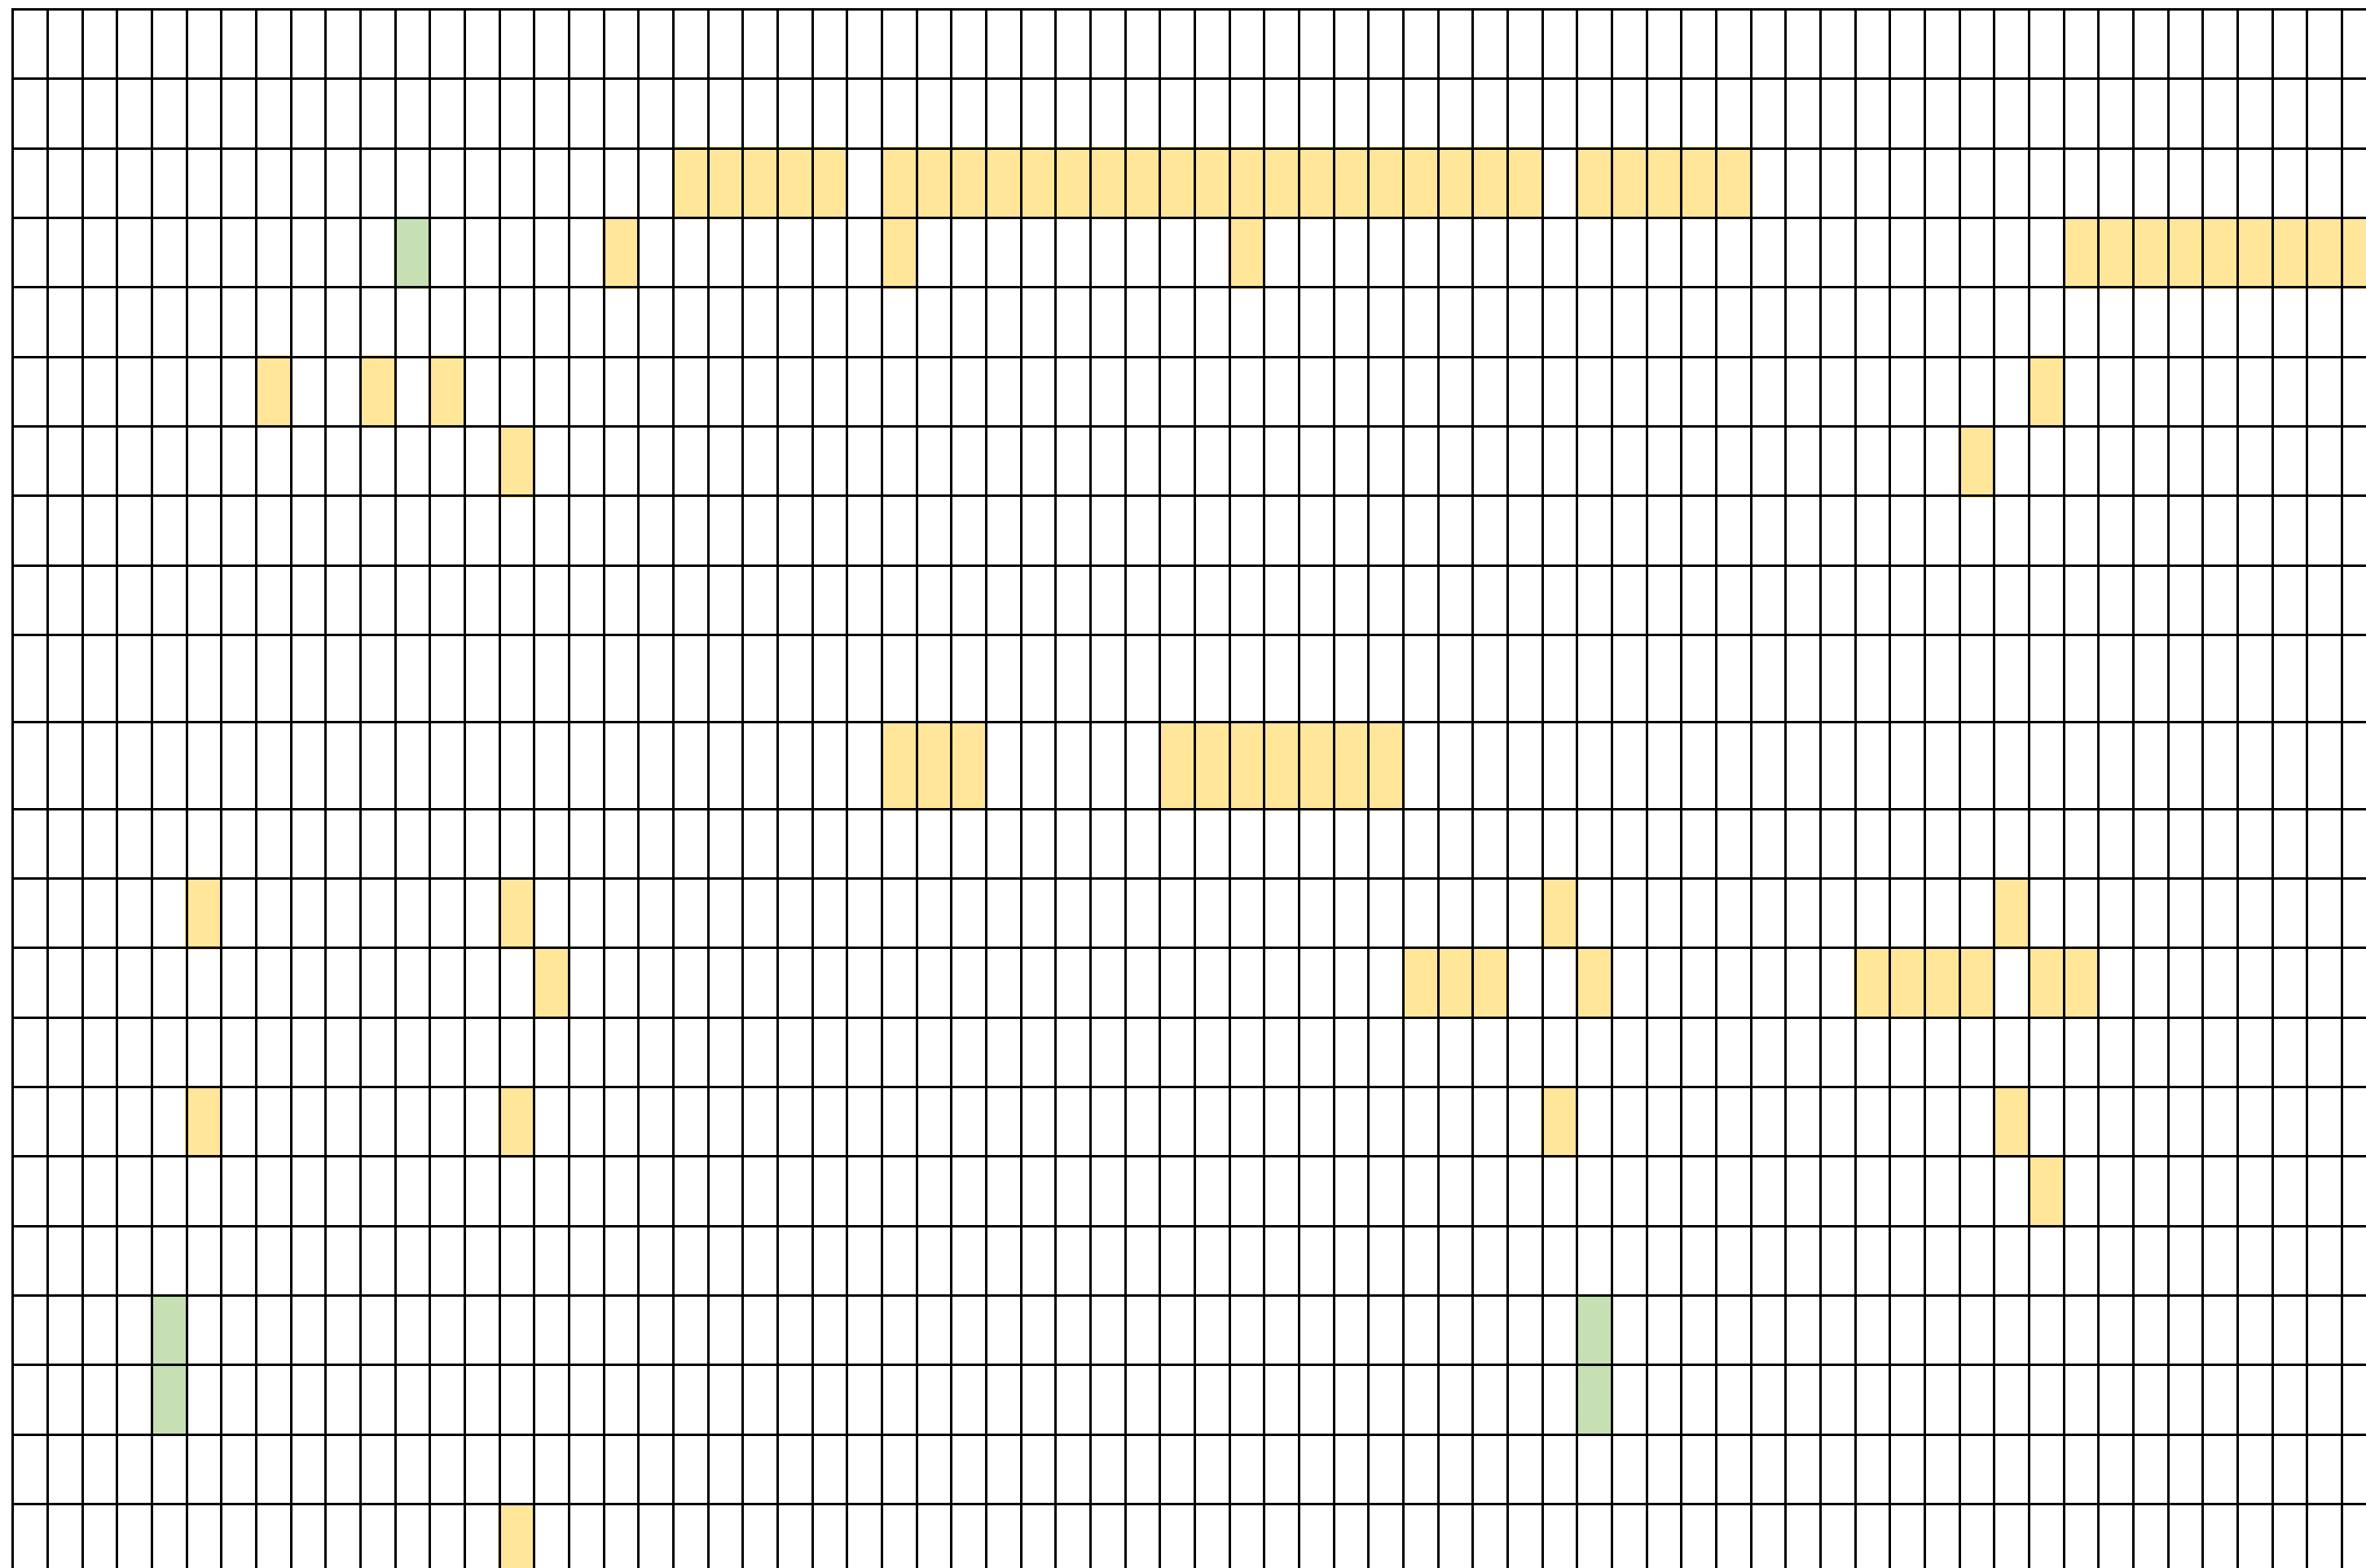

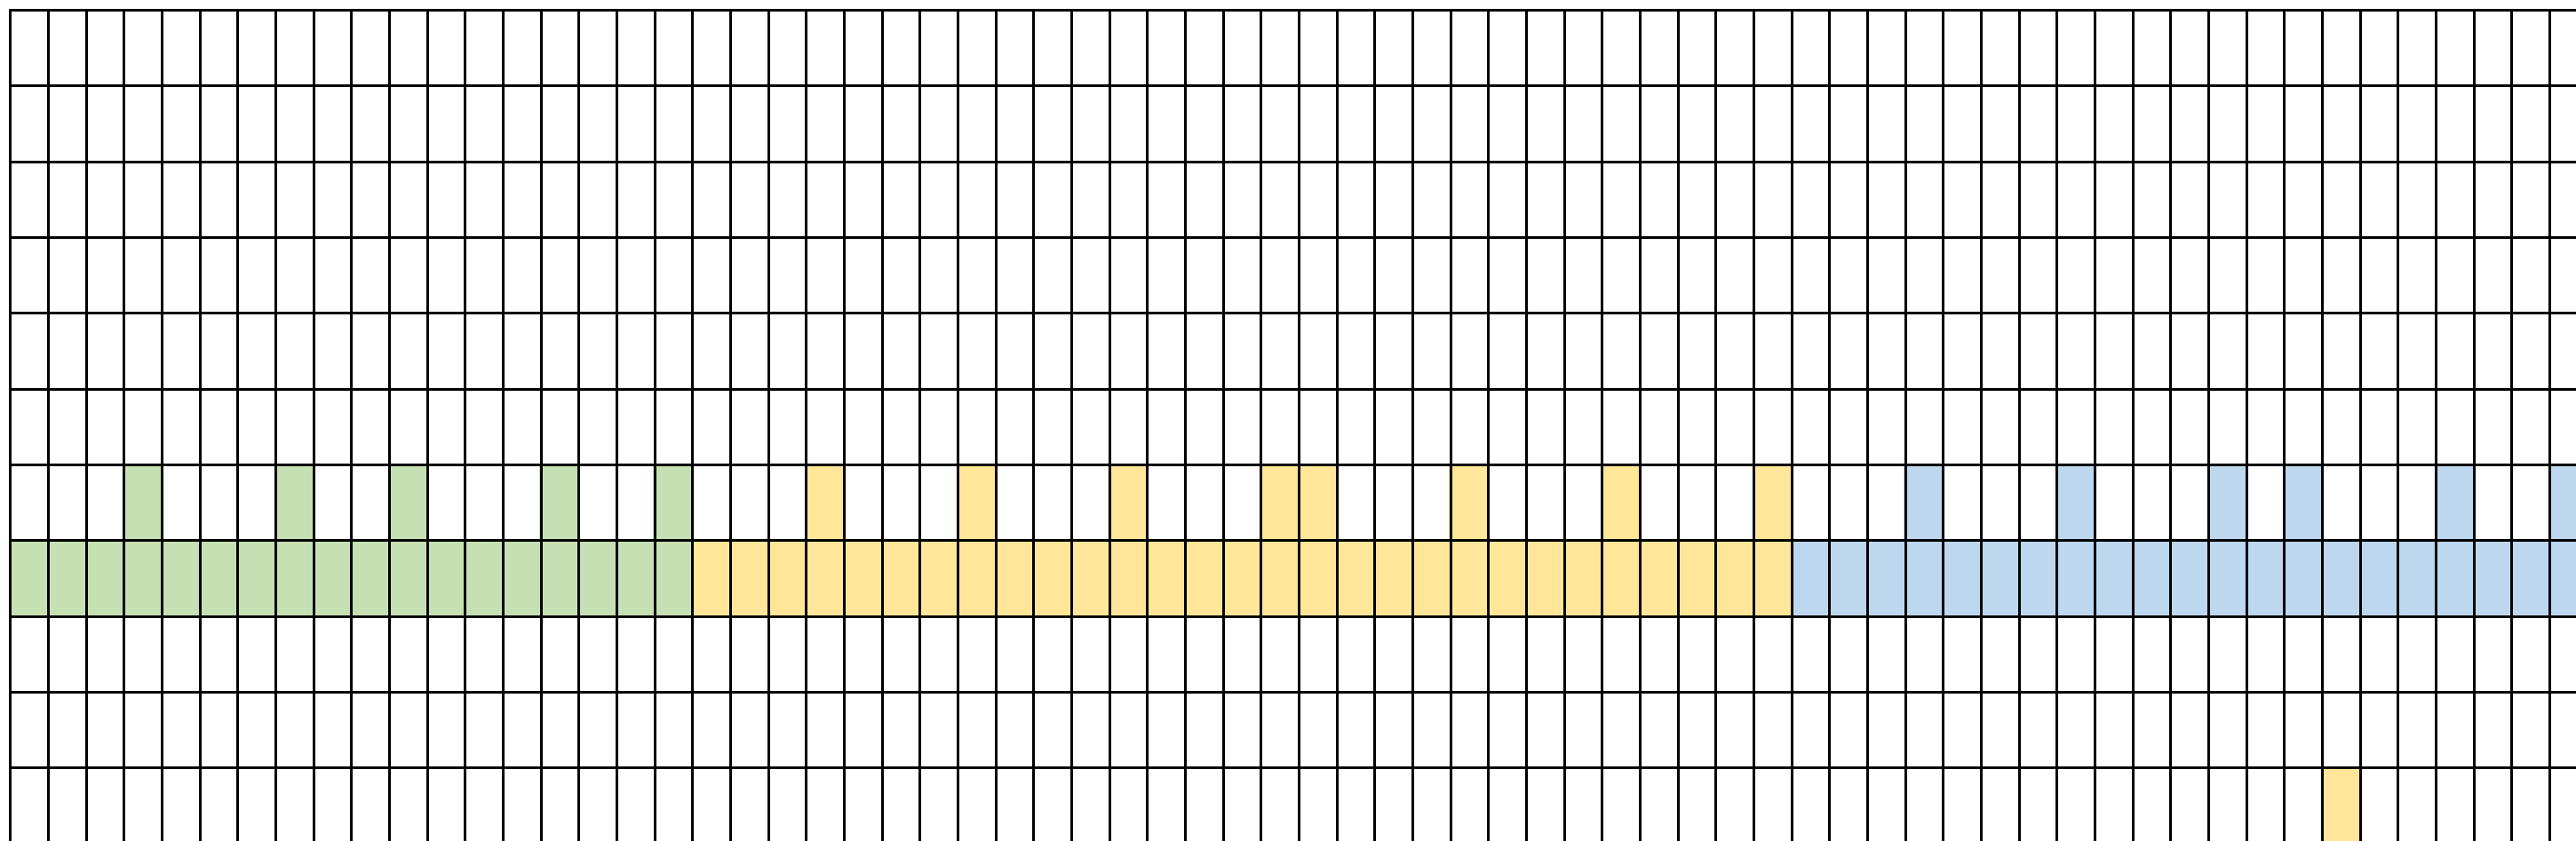



[illegible]

