


RAPORT MIESIĘCZNY KONSULTANTA Z POSTĘPU PRAC

NR 18

za okres: Lipiec 2020 r.

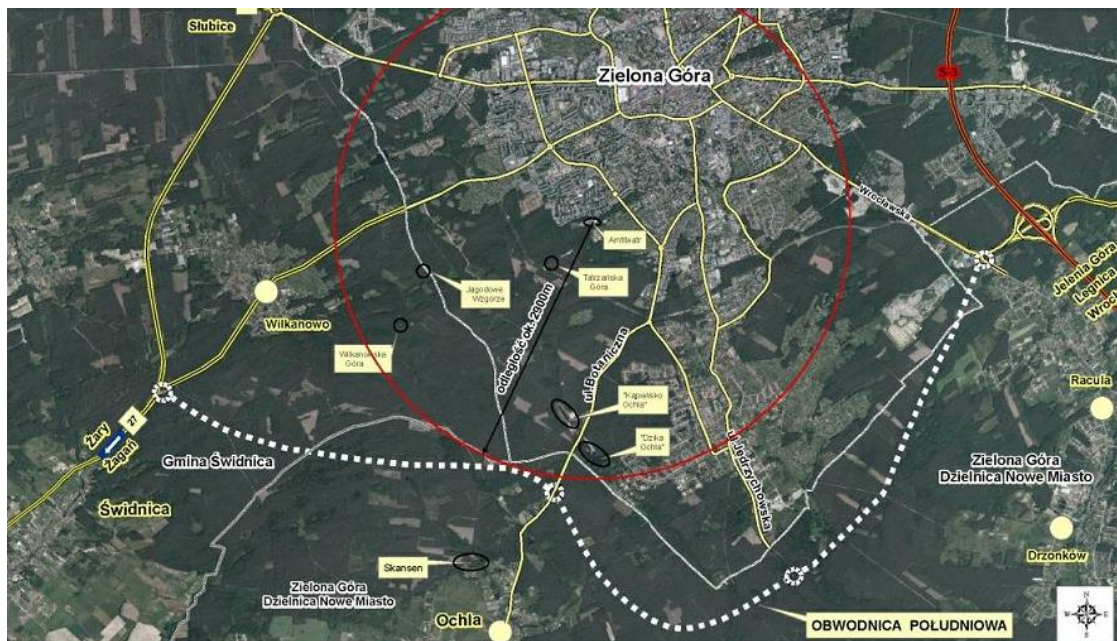

PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ
ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA:
„BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA ZIELONA GÓRA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ”

1. Postęp Robót w odniesieniu do aktualnego Programu

W okresie, którego dotyczy raport, wykonywano następujące prace:

W okresie, którego dotyczy raport, wykonywano:

- Wprowadzenie poprawek oraz uzupełnienie wniosku o wydanie Decyzji ZRID w związku z otrzymanym wezwaniem do uzupełnienia z LUW,
- Wydruk uzupełnionych załączników do wniosku o wydanie Decyzji ZRID,
- Przygotowanie materiałów wynikających z wezwania z LUW,
- Przygotowanie i aktualizacja przekrojów normalnych do PW,
- Analiza otrzymanych materiałów wyjściowych z starostwa powiatowego dotyczących dodatkowych podziałów,
- Analiza odwiertów geologicznych,
- Analiza trasy głównej pod względem odhumusowania,
- Przygotowanie rysunków szczegółowych do PW,
- Analiza pomiarów geodezyjnych dot. ul. Szparagowej w celu zamodelowania rozwiązania projektowego,
- Wprowadzenie słupków geologicznych na niweletę PW,
- Weryfikacja modeli, przygotowanie przekroi charakterystycznych dla DK27/32 i DW282,
- Przygotowanie dwóch wariantów wpięcia ul. Szparagowej do ul. Głogowskiej wraz z rozwiązaniem wysokościowym,
- Prace nad specyfikacjami technicznymi,
- Wystąpienie o prawo do dysponowania działką do Zarządu Dróg Wojewódzkich,
- Wystąpienie do Urzędu Miasta Zielona Góra o wskazania miejsca wpięcia do kabla światłowodowego,
- Wystąpienie do Urzędu Miasta Zielona Góra o określenie klasy drogi ulicy Szparagowej
- Pozyskanie prawa do dysponowania działką od ZDW,
- Przygotowanie specyfikacji technicznych do weryfikacji w zakresach:
 - Drogi,
 - Elektryka,
 - Teletechnika,
 - Zielen;
- Obróbka przekroi charakterystycznych dla dróg:
 - DK27 i DK32,
 - DW 282 i DW283,
 - Ul. Zielonogórska;
- Przygotowanie do weryfikacji PW branżowych:
 - Zielen,
 - Elektroenergetyka,
 - Teletechnika;

- Korekta załącznika nr 1 i nr 2 do wniosku o wydanie Decyzji ZRID wynikająca ze zmiany ustaleń granicy pomiędzy pasem drogowym dróg DK27 i DK32
- spotkania projektowe.

2. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Nie prowadzono robót budowlanych

