Załącznik nr 6 - Graficzny postep prac
Raport miesięczny nr 33 za Październik 2021 r.

SEKCJA I

nr pozycji z programu	asortyment robót	data rozpoczęcia zgodnie z programem	data zakończenia zgodnie z programem	wykonano do okresu [szacowane % ilości]	wykonano w okresie [szacowane % ilości]	narastająco [szacowane % ilości]
61	Roboty przygotowawcze	2021-03-01	2022-08-14			0,00%
62	Karczowanie z wywózką	2021-02-03	2021-03-30	100%	0%	100,00%
63	Odhumusowanie	2021-03-31	2021-04-28	100%	0%	100,00%
64	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I	2022-07-15	2022-07-21			0,00%
65	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II	2022-09-08	2022-09-14			0,00%
66	Drogi technologiczne (z dojazdami do PG1 i PG2)	2021-04-15	2021-05-13	65%	6%	71,00%
67	Roboty ziemne	2021-04-29	2022-09-30			0,00%
68	Roboty ziemne (wykop)	2021-04-29	2022-07-01	90%	3%	93,00%
72	Roboty ziemne (nasyp)	2021-04-29	2022-09-30	85%	4%	89,00%
75	GWN	2022-03-17	2022-04-21	23%	22%	47,00%
76	wymiana gruntu	2021-07-26	2021-08-06	28%	0%	28,00%
77	profilowanie skarp nasypów i wykopów	2022-05-09	2022-09-30	14%	0%	14,00%
78	Podbudowa	2022-05-30	2022-10-20			0,00%
79	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.	2022-03-23	19.009.22	15%	6%	21,00%
80	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/30 grubości	2022-07-13	2022-08-06	0%	14%	14,00%
93	Podbudowa bituniczna z B.A	2022-08-20	2022-10-20	0%	14%	14,00%
101	W-wa wiążąca	2022-07-14	2022-10-27			0,00%
102	Warstwa wiążąca z B.A	2022-07-14	2022-10-27	0%	14%	14,00%
109	Wlewy ściekowe	2022-08-22	2022-11-02			0,00%
118	Roboty wykończeniowe	2022-08-13	2022-12-14			0,00%
119	Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich	2022-08-13	2022-09-21	11,5%	4%	15,50%
120	Przepusty	2021-10-28	2022-08-10			0,00%
130	Ekrany dla	2022-04-28	2022-10-10			0,00%
140	Urządzenia bezpieczeństwa Ruchu	2022-10-03	2022-11-21			0,00%
149	Kanalizacja deszczowa	2022-03-16	2022-10-07			0,00%
150	Kanały deszczowe	2022-03-16	2022-03-29	22%	0%	22,00%
151	Wpusty	2022-03-30	2022-04-12	54%	0%	54,00%
152	Wpusty- ronda	2022-07-22	2022-07-26	45%	0%	45,00%
153	Studnie i separatory	2022-03-16	2022-03-29	80%	0%	80,00%
154	Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa	2022-08-24	2022-10-03			0,00%
155	Zbiorniki	2022-04-26	2022-12-13			0,00%
156	Wykop - zbiorniki	2022-04-28	2022-05-27	30%	25%	55,00%
157	Roboty wykończeniowe - zbiorniki	2022-10-04	2022-12-13	17%	17%	34,00%
158	Melioracja	2022-05-10	2022-08-08			0,00%
159	Przebudowa cieków melioracyjnych	2022-04-30	2022-08-08	0%	5%	5,00%
160	Roboty elektroenergetyczne	2022-03-16	2022-10-18			0,00%
166	Budowa zasilania (transformator, kable) - TG	2022-03-16	2022-06-10	20%	0%	20,00%
168	Budowa zasilania (transformator, kable) - ronda	2022-09-05	2022-09-23	70%	0%	70,00%
167	Roboty teletechniczne	2022-05-09	2022-07-18			0,00%
168	Budowa studni kablowych	2022-05-09	2022-07-04			0,00%
169	Budowa kanalizacji teletechnicznej	2022-05-09	2022-07-04	1%	0%	1,00%
170	Montaż światłowodów	2022-07-05	2022-07-18	1%	0%	1,00%
171	Roboty wodociągowe	2021-04-26	2021-05-28			0,00%
oki	Likwidacja kolizji wodociągowej	2021-04-29	2021-05-28	0%	80%	80,00%

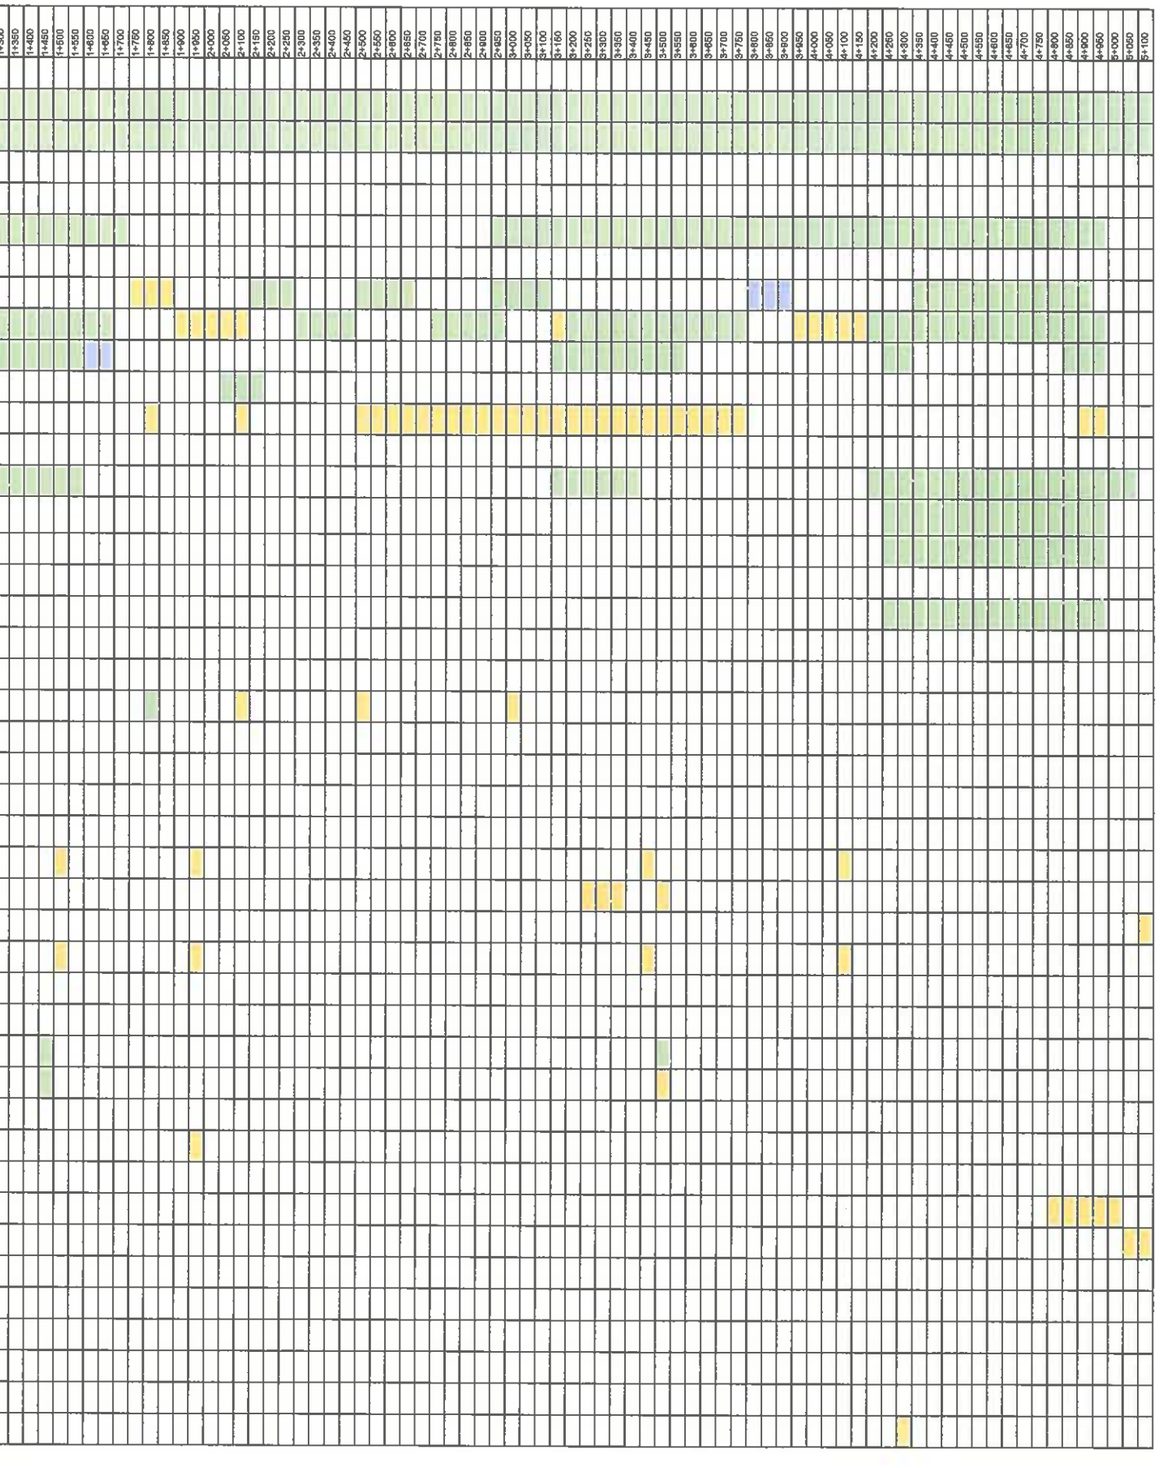

Legenda
Roboty zakończone
Roboty w trakcie
Roboty planowane

są to roboty również planowane na kolejny miesiąc

Załącznik nr 6 - Graficzny postep prac
Raport miesięczny nr 33 za Październik 2021 r.

SEKCJA II

nr pozycji z programu	asortyment robót	data rozpoczęcia zgodnie z programem	data zakończenia zgodnie z programem	wykonano do okresu [szacowane % ilości]	wykonano w okresie [szacowane % ilości]	narastająco [szacowane % ilości]
174	Roboty przygotowawcze	2021-03-31	2022-05-18			0,00%
175	Karczowanie z wywózką	2021-03-31	2021-05-13	100,00%	0,00%	100,00%
176	Odhumusowanie	2021-05-14	2021-06-02	100,00%	0,00%	100,00%
177	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I	2022-04-01	2022-04-11			0,00%
178	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II	2022-05-10	2022-05-18			0,00%
179	Roboty ziemne	2021-06-04	2022-06-17			0,00%
180	Wykop	2021-06-04	2021-09-02	84,00%	7,00%	91,00%
182	Nasyp	2021-06-04	2022-06-17	80,00%	10,00%	90,00%
186	GWN	2021-08-17	2021-09-03	35,00%	45,00%	80,00%
187	profilowanie skarp nasypów i wykopów	2021-09-30	2022-06-17	60,00%	10,00%	70,00%
188	Podbudowy	2021-08-26	2022-10-10			0,00%
189	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.	2021-08-26	2022-06-09	40,00%	50,00%	90,00%
197	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	2021-09-30	2022-08-24	40,00%	0,00%	40,00%
212	Wiwa wiążąca	2022-04-06	2022-09-12			0,00%
214	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W; gr. 8 cm - TG	2022-04-06	2022-04-20	0,00%	40,00%	40,00%
219	Wiwa ścieralna	2022-08-22	2022-12-09			0,00%
227	Roboty wykończeniowe	2022-03-21	2022-12-14			0,00%
229	Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich	2022-03-21	2022-08-18			0,00%
233	Przepusty	2021-06-15	2021-09-21			0,00%
235	Montaż rur - Przepusty HDPE	2021-06-18	2021-07-15	0,00%	61,00%	61,00%
240	Elementy ulic	2021-10-18	2022-06-30			0,00%
250	Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu	2022-05-23	2022-10-24			0,00%
259	Kanalizacja deszczowa	2021-07-16	2022-06-17			0,00%
260	Kanały deszczowe	2021-07-16	2021-07-29	26,00%	0,00%	26,00%
261	Wpusty	2021-07-16	2021-07-29	57,00%	6,00%	63,00%
262	Studnie i separatory	2021-07-29	2021-07-29	50%	0%	50,00%
264	Zbiorniki	2021-07-30	2021-11-15			0,00%
265	Wykop - zbiorniki	2021-07-30	2021-08-19	20%	0%	20,00%
266	Roboty wykończeniowe - zbiorniki	2021-08-20	2021-11-15			0,00%
267	Melioracja	2021-11-16	2022-05-12			0,00%
268	Przebudowa cieków melioracyjnych	2021-11-16	2022-05-12	0%	5%	5,00%
269	Roboty elektroenergetyczne	2021-07-15	2022-08-23			0,00%
274	Budowa zasilania (transformator, kable) - TG	2021-07-15	2021-08-12	50%	5%	55,00%
275	Budowa zasilania (transformator, kable) - ronda	2022-04-15	2022-05-30	70%	0%	70,00%
276	Roboty teletechniczne	2021-11-15	2022-04-08			0,00%
277	Budowa studni kablowych	2021-11-15	2022-03-25	40%	0%	40,00%
278	Budowa kanalizachi teletechnicznej	2021-11-15	2022-03-25	35%	5%	40,00%

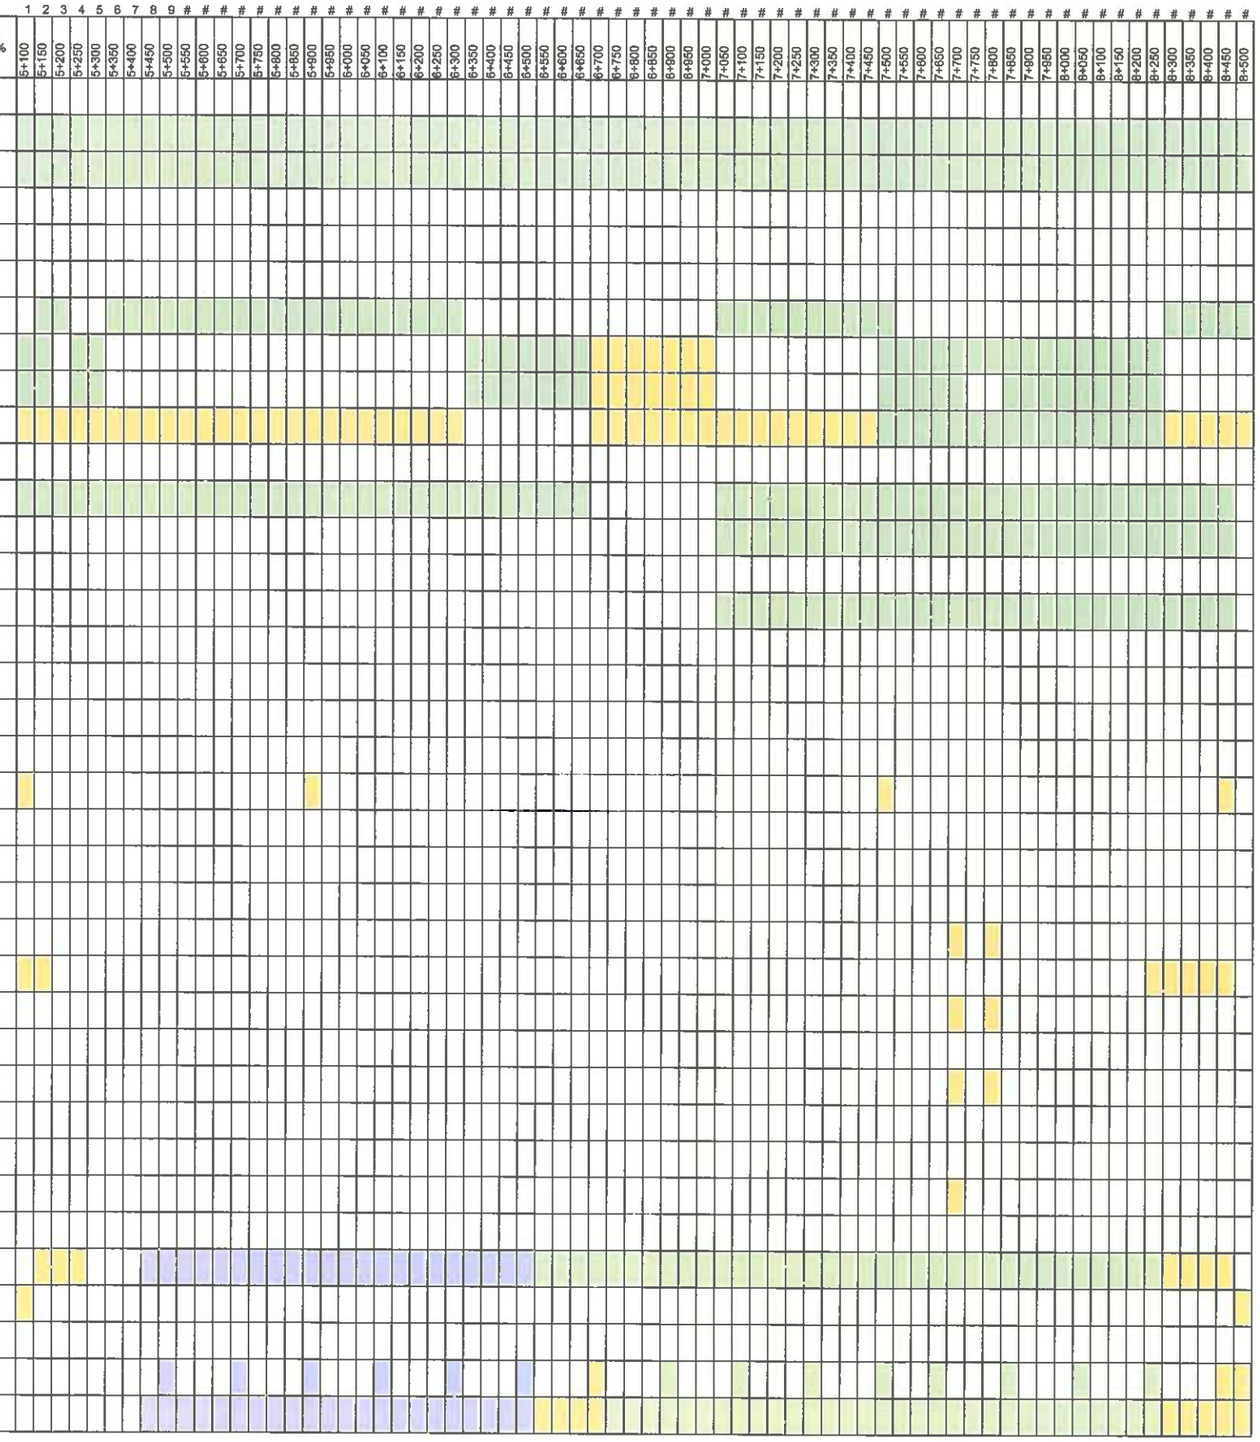
1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

Załącznik nr 6 - Graficzny postep prac
Raport miesięczny nr 33 za Październik 2021 r.

SEKCJA III

nr pozycji z programu	asortyment robót	data rozpoczęcia zgodnie z programem	data zakończenia zgodnie z programem	wykonano do okresu [szacowane % ilości]	wykonano w okresie [szacowano % ilości]	narastająco [szacowane % ilości]
281	Roboty przygotowawcze	2021-02-03	2022-05-[illegible]			
282	Karczowanie z wywózką	2021-02-03	2021-03-30	100,00%	0,00%	100,00%
283	Orhumusowanie	2021-03-31	2021-04-20	100,00%	0,00%	100,00%
284	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I	2022-03-18	2022-03-28			0,00%
285	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II	2022-05-05	2022-05-13			0,00%
287	Roboty ziemne	2021-04-21	2022-05-27			
288	Wykop	2021-04-21	2021-07-12	91,00%	0,00%	91,00%
292	Nasyp	2021-04-21	2022-05-27	82,00%	5,00%	87,00%
296	GWN	2021-07-30	2021-08-18	35,00%	50,00%	85,00%
297	wymiana gruntu/ ulepszenie gruntu	2021-04-21	2021-04-27	100,00%	0,00%	100,00%
298	profilowanie skarp nasypów i wykopów	2021-07-16	2022-04-04	60,00%	20,00%	80,00%
299	Podbudowy	2021-08-10	2022-10-28			
300	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.	2021-08-10	2022-08-03	75,00%	10,00%	85,00%
309	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/30 grubości 20 cm - TG+zjazdy (W-wa i gr. 10 cm)	2021-09-14	2021-09-29	67,00%	18,00%	85,00%
316	Podbudowa bitumiczna z B.A.	2021-10-28	2022-08-04	30,00%	45,00%	75,00%
319	Warstwa wiążąca	2021-11-25	2022-10-17			
320	Warstwa wiążąca z B.A.	2021-11-26	2022-10-17	28,00%	45,00%	73,00%
33[illegible]	Wykończenie	2022-09-03	2022-11-17			0,00%
345	Roboty wykończeniowe	2021-[illegible]	2022-12-14			0,00%
347	Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich	2022-04-0[illegible]	2022-08-08	10,00%	20,00%	30,00%
352	Przepusty	2021-[illegible]-16	2022-0[illegible]-20			0,00%
353	Montaż rur	2021-07-02	2021-07-15	0,00%	46,00%	46,00%
356	Elementy Ulic	2021-08-21	2022-07-08			0,00%
360	Urządzenia bezpieczeństwa Ruchu	2022-08-02	2022-12-14			0,00%
361	Kanalizacja deszczowa	2021-06-0[illegible]	2022-08-1[illegible]			0,00%
382	Kanały deszczowe	2021-06-04	2021-06-17	15%	0%	15,00%
383	Wpusty	2021-06-18	2021-07-07	50%	0%	50,00%
384	Studnie i separatory	2021-06-04	2021-06-17	33%	0%	33,00%
385	Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa	2021-10-20	2022-06-14			0,00%
386	Zbiorniki	2021-07-16	2021-09-01			0,00%
387	Wykop - zbiorniki	2021-07-16	2021-07-21	60%	5%	65,00%
388	Roboty wykończeniowe - zbiorniki	2021-07-22	2021-09-01			0,00%
389	Melioracje	2021-07-22	2021-10-13			0,00%
390	Przebudowa cieków melioracyjnych	2021-07-22	2021-10-13	5%	6%	11,00%
391	Roboty elektroenergetyczne	2021-07-07	2022-03-31			0,00%
392	Przebudowa lini SN	2021-07-16	2021-08-04	90%	10%	100,00%
393	Montaż fundamentów	2021-07-23	2021-08-02	50%	0%	50,00%
394	Montaż słupów i opraw	2021-12-13	2022-03-31			0,00%
395	Budowa zasilania	2021-07-07	2021-07-26	50%	10%	60,00%
396	Roboty teletechniczne	2021-10-08	2022-04-05			0,00%
397	Budowa studni kablowych	2021-10-08	2022-03-21	1%	19%	20,00%
398	Budowa kanalizacji teletechnicznej	2021-10-08	2022-03-21	1%	9%	10,00%
400	Roboty gazowe	2021-03-01	2021-08-24			0,00%
404	Przebudowa kolizji z istn. Gazociągiem	2021-06-13	2021-06-24	0%	30%	30,00%

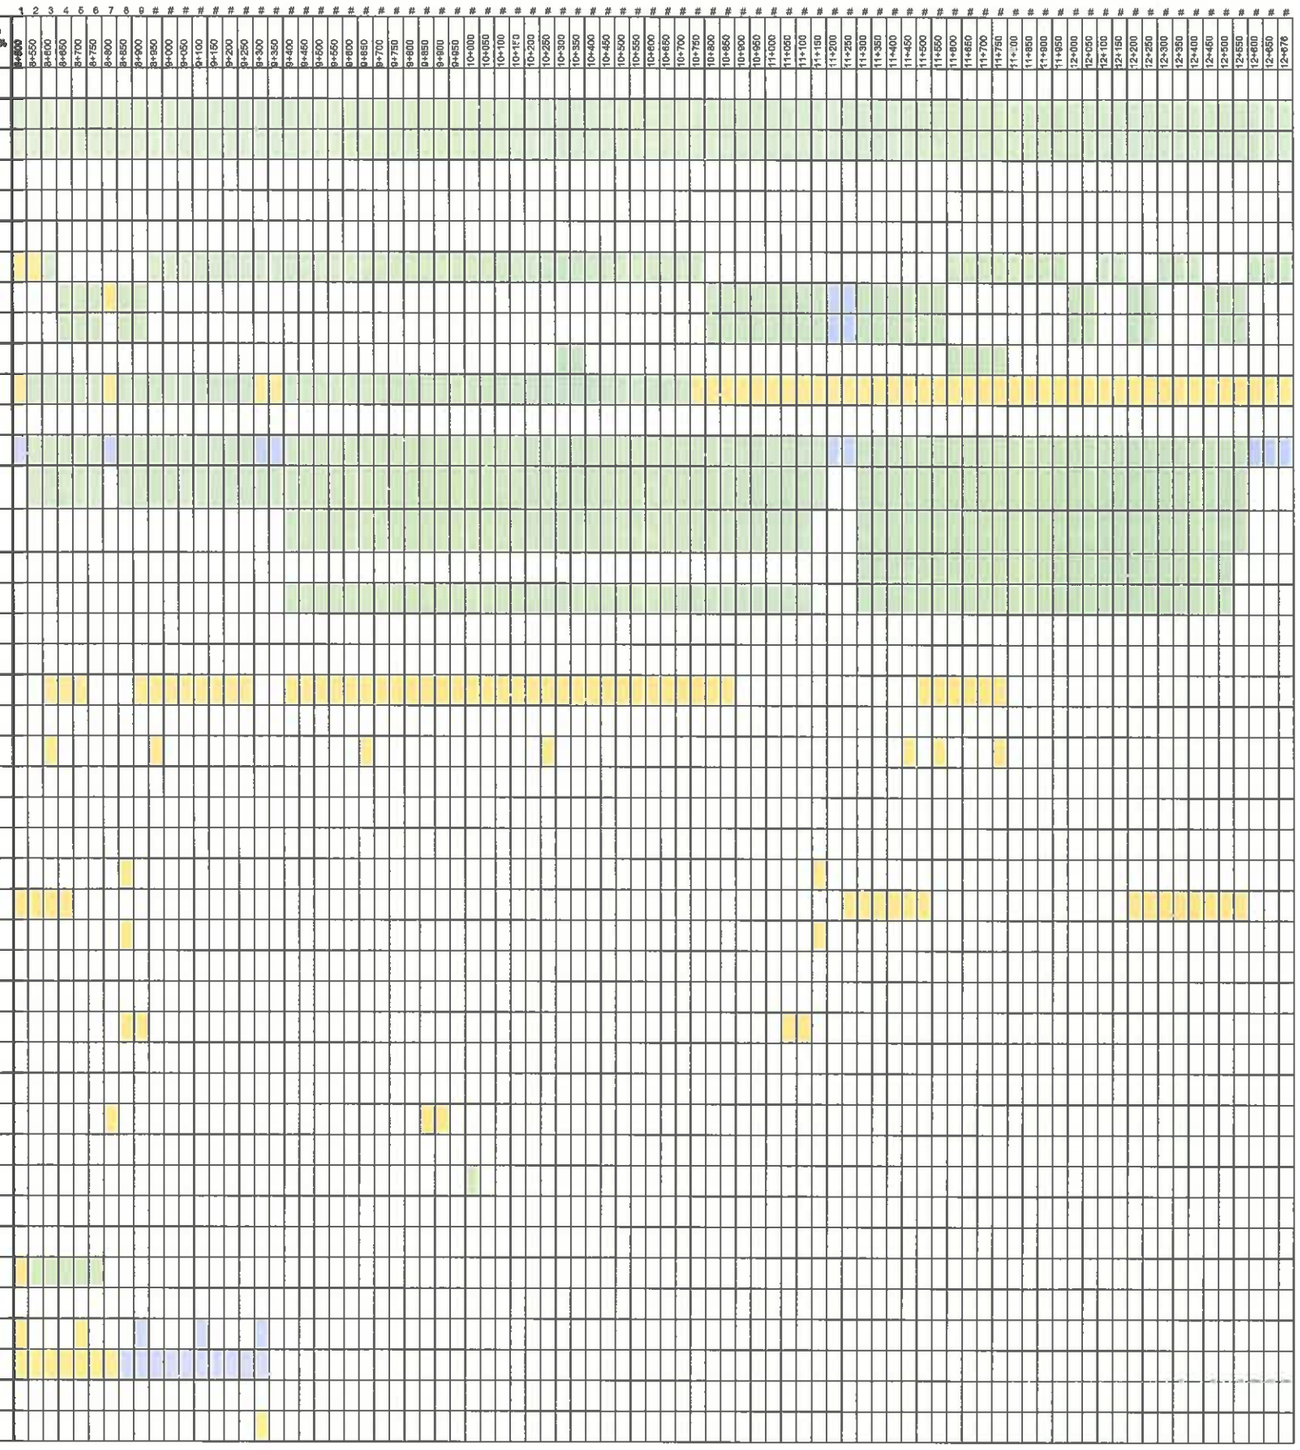

Legenda
Roboty zakończone
Roboty w trakcie
Roboty planowane

są to roboty również planowane na kolejny miesiąc
