Załącznik nr 6 - Graficzny postep prac
Raport miesięczny nr 34 za Listopad 2021 r.

SEKCJA III

nr pozycji z programu	asortyment robót	data rozpoczęcia zgodnie z programem	data zakończenia zgodnie z programem	wykonano do okresu [szacowane % ilości]	wykonano w okresie [szacowane % ilości]	narastająco [szacowane % ilości]
281	Roboty przygotowawcze	03.02.2021	13.05.2022			
282	Karczowanie z wywózką	03.02.2021	30.03.2021	100,00%	0,00%	100,00%
283	Odhumusowanie	31.03.2021	20.04.2021	100,00%	0,00%	100,00%
284	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I	18.03.2022	28.03.2022			0,00%
285	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II	05.05.2022	13.05.2022			0,00%
287	Roboty ziemne	21.04.2021	27.05.2022			
288	Wykop	21.04.2021	12.08.2021	91,00%	0,00%	91,00%
292	Nasyp	21.04.2021	27.05.2022	87,00%	0,00%	87,00%
295	GWN	30.07.2021	18.08.2021	85,00%	0,00%	85,00%
297	wymiana gruntu/ ulepszenie gruntu	21.04.2021	27.04.2021	100,00%	0,00%	100,00%
298	profilowanie skarp nasypów i wykopów	16.07.2021	04.04.2022	80,00%	6,00%	86,00%
299	Podbudowy	10.08.2021	26.10.2022			
300	Podbuodowa pomicnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.	10.08.2021	03.06.2022	85,00%	5,00%	90,00%
309	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/30 grubiści 20 cm - TG+zjazdy (W-wa I gr. 10 cm)	14.09.2021	29.09.2021	85,00%	5,00%	90,00%
316	Podbudowa bitumiczna z B.A	28.10.2021	04.08.2022	75,00%	15,00%	90,00%
325	W-wa wiążąca	25.11.2021	17.10.2022			
326	Warstwa wiążąca z B.A.	25.11.2021	17.10.2022	73,00%	15,00%	88,00%
334	W-wa ścieralna	03.08.2022	17.11.2022			0,00%
345	Roboty wykończeniowe	13.12.2021	14.12.2022			0,00%
347	Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich	04.04.2022	08.08.2022	30,00%	25,00%	55,00%
352	Przepusty	18.06.2021	20.04.2022			0,00%
353	Montaż rur	02.07.2021	15.07.2021	46,00%	0,00%	46,00%
356	Przepusty stalowe	18.06.2021	20.04.2022	0,00%	0,00%	0,00%
359	Elementy Ulic	21.09.2021	06.07.2022			0,00%
360	Ustawienie krawężników betonowych	21.09.2021	14.06.2022	0,00%	10,00%	
245	Ścieki trójkątne	21.09.2021	08.10.2021	0,00%	90,00%	
369	Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu	02.08.2022	14.12.2022			0,00%
381	Kanalizacja deszczowa	04.06.2021	14.06.2022			0,00%
382	Kanały deszcowe	04.06.2021	17.06.2021	15,00%	0,00%	15,00%
383	Wpusty	18.06.2021	07.07.2021	50,00%	0,00%	50,00%
384	Studnie i separatory	04.06.2021	17.06.2021	33,00%	0,00%	33,00%

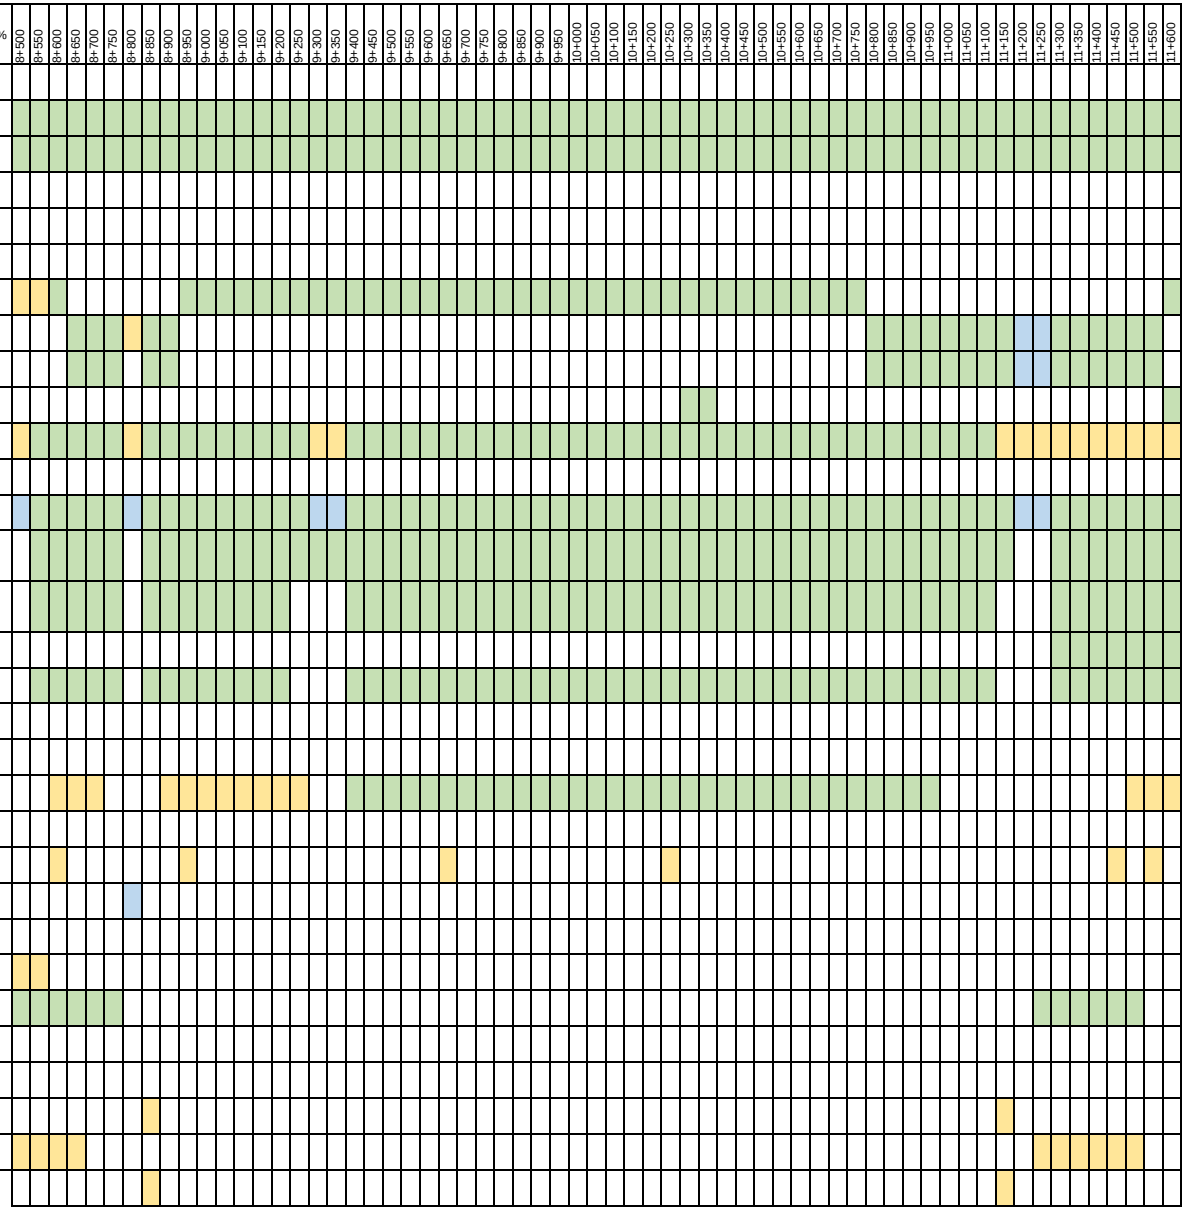

385	Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa	20.10.2021	14.06.2022			0,00%
386	Zbiorniki	16.07.2021	01.09.2021			0,00%
387	Wykop - zbiorniki	16.07.2021	21.07.2021	65,00%	0,00%	65,00%
388	Roboty wykończeniowe - zbiorniki	22.07.2021	01.09.2021			0,00%
389	Melioracja	22.07.2021	13.10.2021			0,00%
390	Przebudowa cieków melioracyjnych	22.07.2021	13.10.2021	11,00%	0,00%	11,00%
391	Roboty elektroenergetyczne	07.07.2021	31.03.2022			0,00%
392	Przebudowa lini SN	16.07.2021	04.08.2021	100,00%	0,00%	100,00%
393	Montaż fundamentów	23.07.2021	02.08.2021	50,00%	0,00%	50,00%
394	Montaż słupów i opraw	13.12.2021	31.03.2022			0,00%
395	Budowa zasilania	07.07.2021	26.07.2021	60,00%	0,00%	60,00%
396	Roboty teletechniczne	08.10.2021	05.04.2022			0,00%
397	Budowa studni kablowych	08.10.2021	21.03.2022	20,00%	0,00%	20,00%
398	Budowa kanalizacji teletechnicznej	08.10.2021	21.03.2022	10,00%	0,00%	10,00%
400	Roboty gazowe	09.03.2021	24.06.2021			0,00%
404	Przebudowa kolizji z istn. Gazociągiem	13.05.2021	24.06.2021	30,00%	0,00%	30,00%

Legenda

Roboty zakończone

Roboty w trakcie — są to roboty również planowane na kolejny miesiąc

Roboty planowane
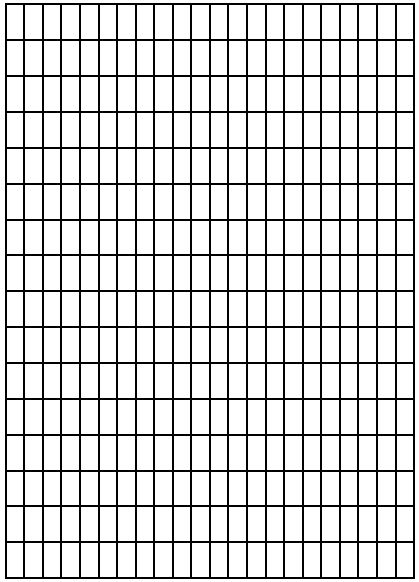
																													11+650
																													11+700
																													11+750
																													11+800
																													11+850
																													11+900
																													11+950
																													12+000
																													12+050
																													12+100
																													12+150
																													12+200
																													12+250
																													12+300
																													12+350
																													12+400
																													12+450
																													12+500
																													12+550
																													12+600
																													12+650
																													12+676
