Załącznik nr 6 - Graficzny postep prac
Raport miesięczny nr 39 za Kwiecień 2022 r.

SEKCJA III

nr pozycji z programu	asortyment robót	data rozpoczęcia zgodnie z programem	data zakończenia zgodnie z programem	wykonano do okresu [szacowane % ilości]	wykonano w okresie [szacowane % ilości]	narastająco [szacowane % ilości]	8+500	8+550	8+600	8+650	8+700	8+750	8+800	8+850	8+900	8+950	9+000	9+050	9+100	9+150	9+200	9+250	9+300	9+350	9+400	9+450	9+500
281	Roboty przygotowawcze	03.02.2021	13.05.2022																								
282	Karczowanie z wywózką	03.02.2021	30.03.2021	100,00%	0,00%	100,00%																					
283	Odhumusowanie	31.03.2021	20.04.2021	100,00%	0,00%	100,00%																					
284	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I	18.03.2022	28.03.2022	0,00%	0,00%	50,00%																					
285	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II	05.05.2022	13.05.2022	0,00%	0,00%	0,00%																					
287	Roboty ziemne	21.04.2021	27.05.2022																								
288	Wykop	21.04.2021	12.08.2021	91,00%	0,00%	91,00%																					
292	Nasyp	21.04.2021	27.05.2022	87,00%	8,00%	95,00%																					
295	GWN	30.07.2021	18.08.2021	85,00%	8,00%	93,00%																					
297	wymiana gruntu/ ulepszenie gruntu	21.04.2021	27.04.2021	100,00%	0,00%	100,00%																					
298	profilowanie skarp nasypów i wykopów	16.07.2021	04.04.2022	86,00%	8,00%	94,00%																					
299	Podbudowy	10.08.2021	26.10.2022																								
300	Podbuodowa pomicnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.	10.08.2021	03.06.2022	90,00%	2,00%	92,00%																					
309	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/30 grubiści 20 cm - TG+zjazdy (W-wa I gr. 10 cm)	14.09.2021	29.09.2021	90,00%	2,00%	92,00%																					
316	Podbudowa bitumiczna z B.A	28.10.2021	04.08.2022	90,00%	0,00%	90,00%																					
325	W-wa wiążąca	25.11.2021	17.10.2022																								
326	Warstwa wiążąca z B.A.	25.11.2021	17.10.2022	88,00%	0,00%	88,00%																					
334	W-wa ścieralna	03.08.2022	17.11.2022			0,00%																					

345	Roboty wykończeniowe	13.12.2021	14.12.2022	40,00%	0,00%	40,00%																								
347	Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich	04.04.2022	08.08.2022	60,00%	5,00%	65,00%																								
352	Przepusty	18.06.2021	20.04.2022			0,00%																								
353	Montaż rur	02.07.2021	15.07.2021	55,00%	6,00%	61,00%																								
356	Przepusty stalowe	18.06.2021	20.04.2022	70,00%	0,00%	70,00%																								
359	Elementy Ulic	21.09.2021	06.07.2022			0,00%																								
360	Ustawienie krawężników betonowych	21.09.2021	14.06.2022	10,00%	10,00%	20,00%																								
245	Ścieki trójkątne	21.09.2021	08.10.2021	90,00%	2,00%	92,00%																								
346	Umocnienie rowów	05.04.2022	01.07.2022	70,00%	20,00%	90,00%																								
369	Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu	02.08.2022	14.12.2022			0,00%																								
381	Kanalizacja deszczowa	04.06.2021	14.06.2022			0,00%																								
382	Kanały deszczowe	04.06.2021	17.06.2021	15,00%	0,00%	15,00%																								
383	Wpusty	18.06.2021	07.07.2021	50,00%	30,00%	80,00%																								
384	Studnie i separatory	04.06.2021	17.06.2021	33,00%	3,00%	36,00%																								
385	Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa	20.10.2021	14.06.2022	36,00%	14,00%	50,00%																								
386	Zbiorniki	16.07.2021	01.09.2021			0,00%																								
387	Wykop - zbiorniki	16.07.2021	21.07.2021	100,00%	0,00%	100,00%																								
388	Roboty wykończeniowe - zbiorniki	22.07.2021	01.09.2021	90,00%	0,00%	90,00%																								
389	Melioracja	22.07.2021	13.10.2021			0,00%																								
390	Przebudowa cieków melioracyjnych	22.07.2021	13.10.2021	11,00%	5,00%	16,00%																								
391	Roboty elektroenergetyczne	07.07.2021	31.03.2022			0,00%																								
392	Przebudowa lini SN	16.07.2021	04.08.2021	100,00%	0,00%	100,00%																								

393	Montaż fundamentów	23.07.2021	02.08.2021	50,00%	0,00%	50,00%	
394	Montaż słupów i opraw	13.12.2021	31.03.2022			0,00%	
395	Budowa zasilania	07.07.2021	26.07.2021	80,00%	10,00%	90,00%	
396	Roboty teletechniczne	08.10.2021	05.04.2022			0,00%	
397	Budowa studni kablowych	08.10.2021	21.03.2022	99,00%	0,00%	99,00%	
398	Budowa kanalizacji teletechnicznej	08.10.2021	21.03.2022	99,00%	0,00%	99,00%	
400	Roboty gazowe	09.03.2021	24.06.2021			0,00%	
404	Przebudowa kolizji z istn. Gazociągiem	13.05.2021	24.06.2021	40,00%	0,00%	40,00%	

Legenda

Roboty zakończone

Roboty w trakcie są to roboty również planowane na kolejny miesiąc

Roboty planowane
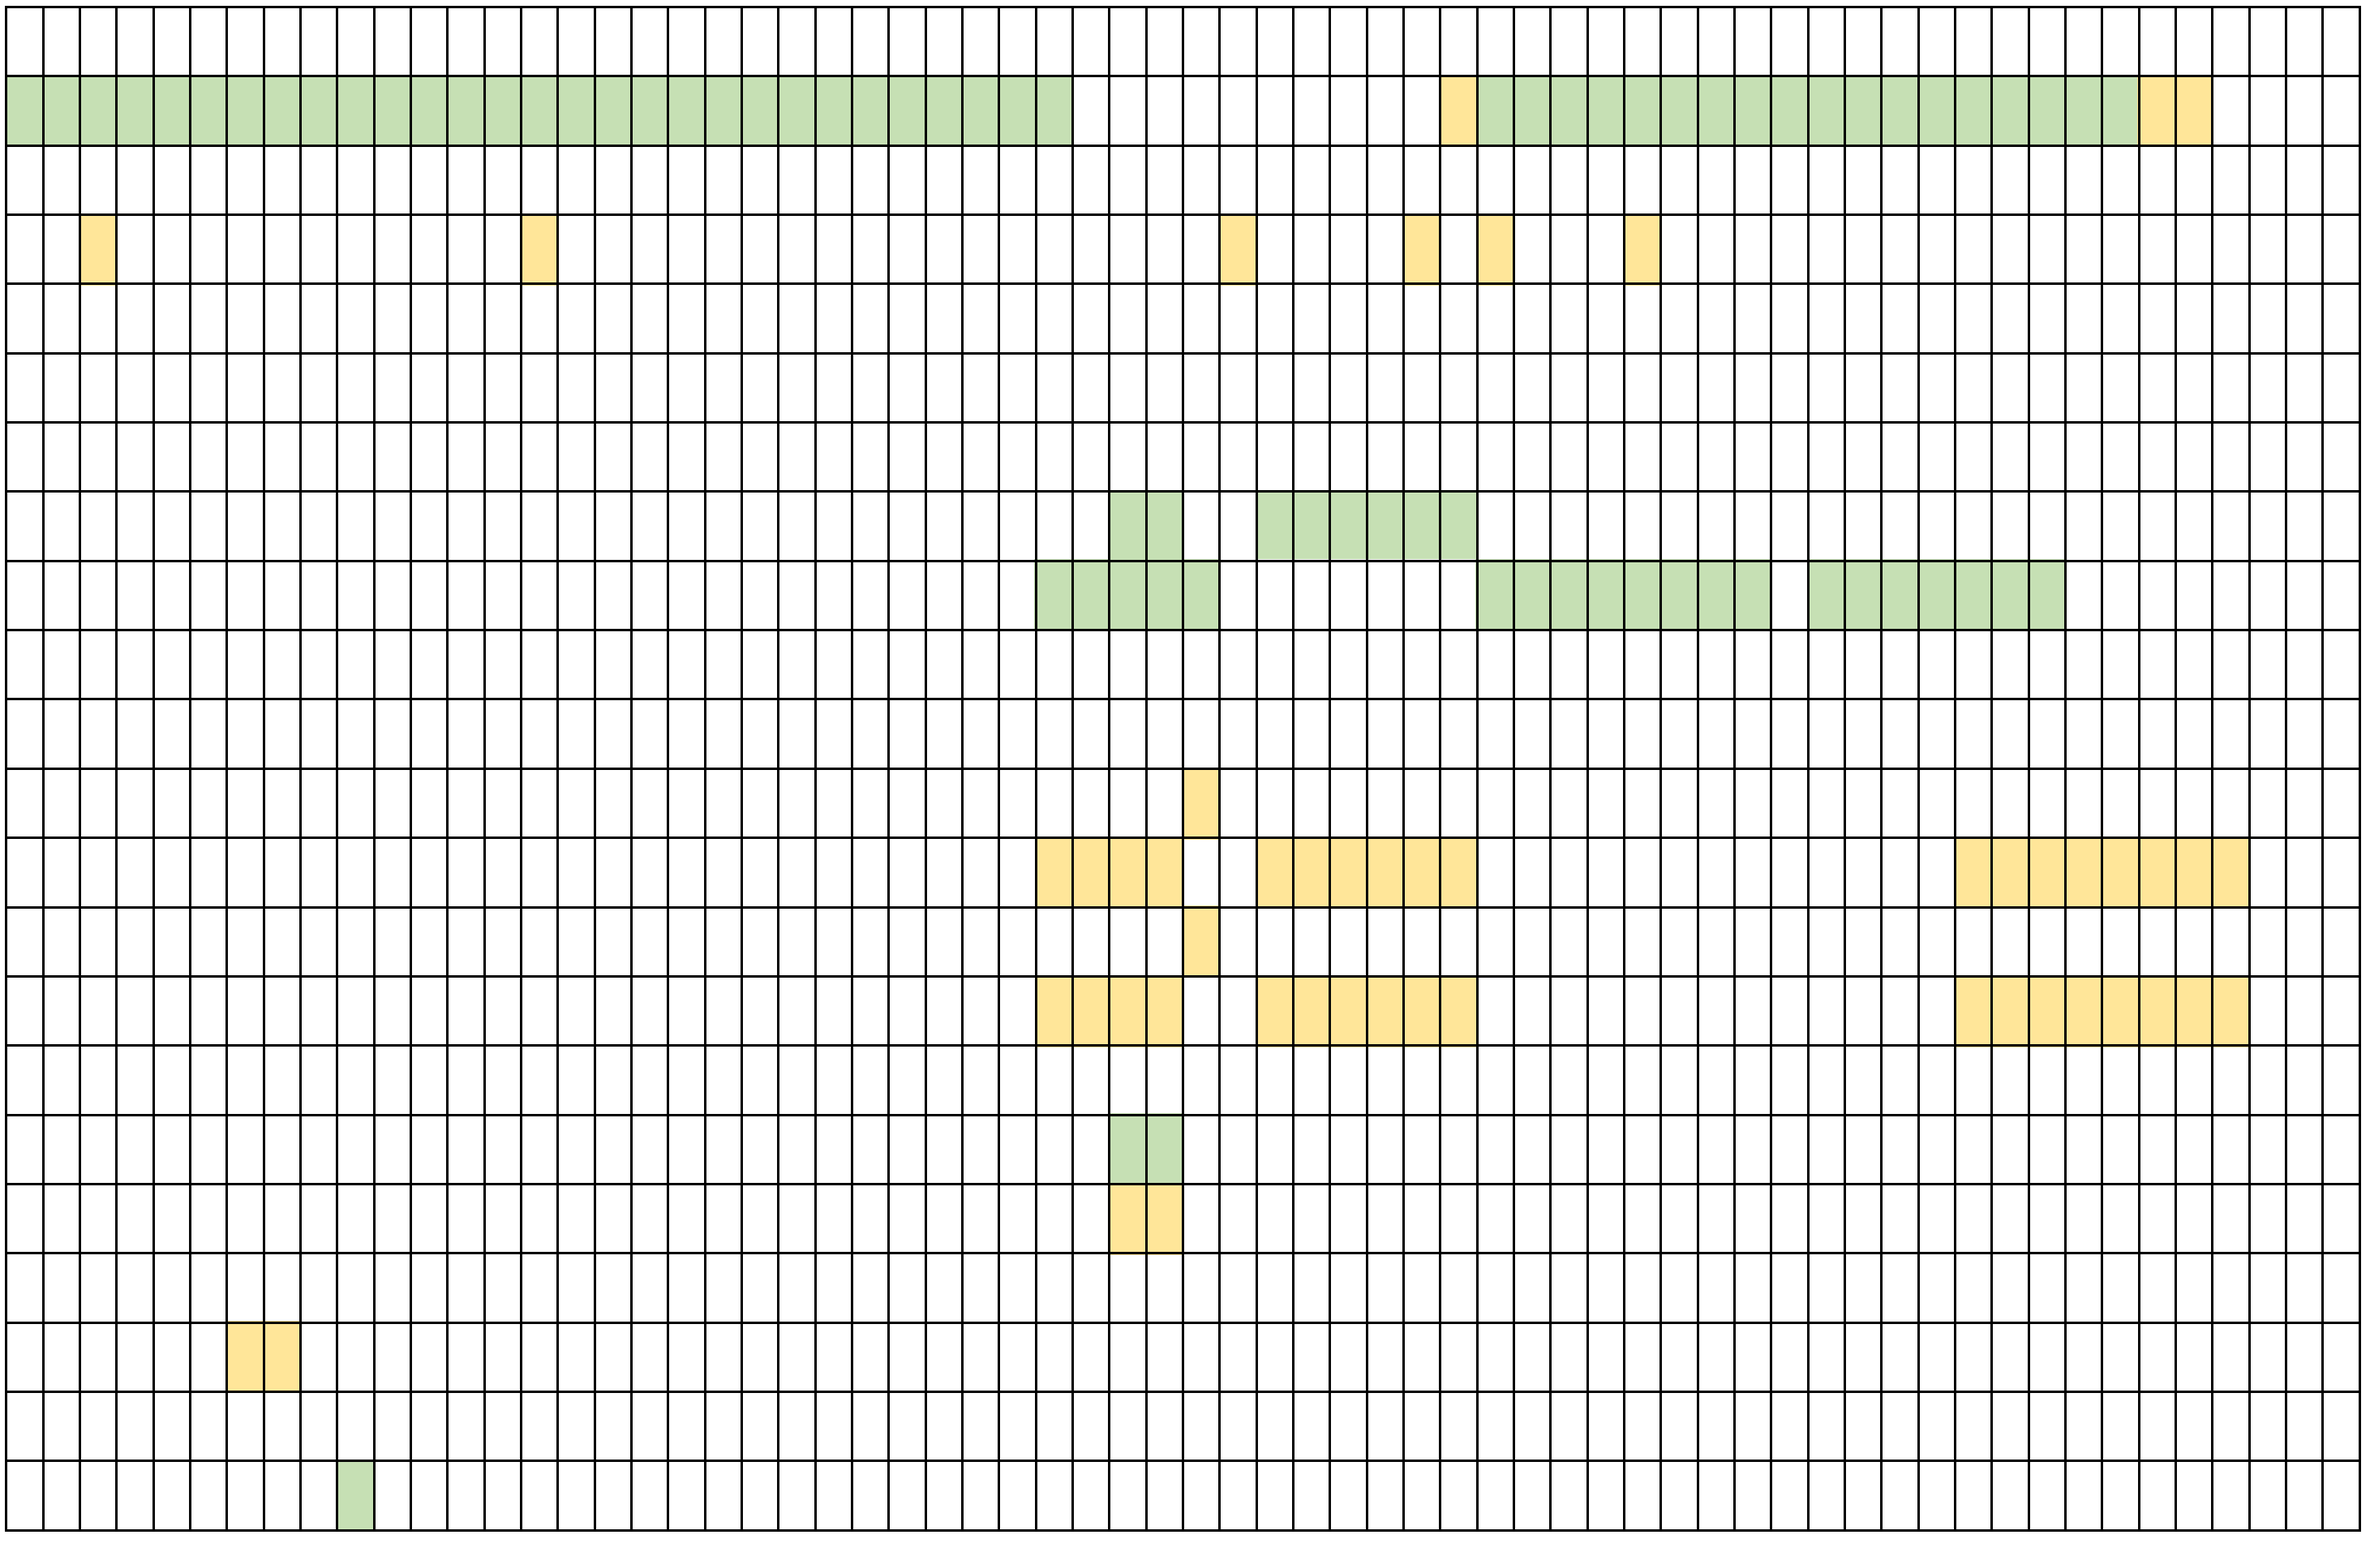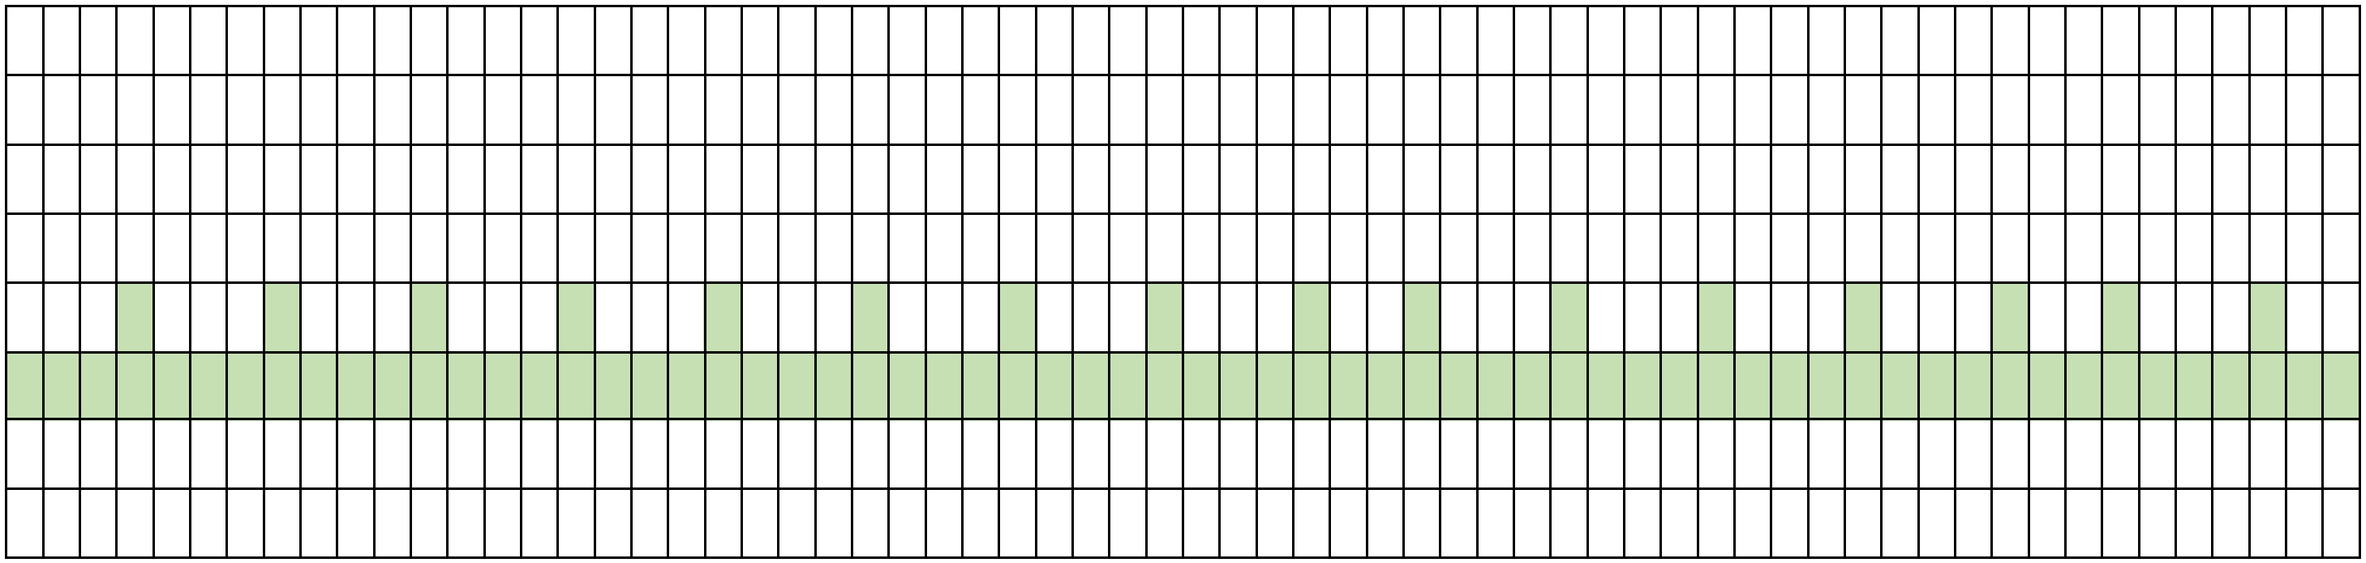
																		9+550
																		9+600
																		9+650
																		9+700
																		9+750
																		9+800
																		9+850
																		9+900
																		9+950
																		10+000
																		10+050
																		10+100
																		10+150
																		10+200
																		10+250
																		10+300
																		10+350
																		10+400
																		10+450
																		10+500
																		10+550
																		10+600
																		10+650
																		10+700
																		10+750
																		10+800
																		10+850
																		10+900
																		10+950
																		11+000
																		11+050
																		11+100
																		11+150
																		11+200
																		11+250
																		11+300
																		11+350
																		11+400
																		11+450
																		11+500
																		11+550
																		11+600
																		11+650
																		11+700
																		11+750
																		11+800
																		11+850
																		11+900
																		11+950
																		12+000
																		12+050
																		12+100
																		12+150
																		12+200
																		12+250
																		12+300
																		12+350
																		12+400
																		12+450
																		12+500
																		12+550
																		12+600
																		12+650
																		12+676
