Załącznik nr 6 - Graficzny postep prac
Raport miesięczny nr 40 za Maj 2022 r.

SEKCJA II

nr pozycji z programu	asortyment robót	data rozpoczęcia zgodnie z programem	data zakończenia zgodnie z programem	wykonano do okresu [szacowane % ilości]	wykonano w okresie [szacowane % ilości]	narastająco [szacowane % ilości]
174	Roboty przygotowawcze	31.03.2021	18.05.2022			0,00%
175	Karczowanie z wywózką	31.03.2021	13.05.2021	100,00%	0,00%	100,00%
176	Odhumusowanie	14.05.2021	02.06.2021	100,00%	0,00%	100,00%
177	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I	01.04.2022	11.04.2022			0,00%
178	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II	10.05.2022	18.05.2022			0,00%
179	Roboty ziemne	04.06.2021	17.06.2022			0,00%
180	Wykop	04.06.2021	02.09.2021	91,00%	4,00%	95,00%
182	Nasyp	04.06.2021	17.06.2022	95,00%	3,00%	98,00%
186	GWN	17.08.2021	03.09.2021	80,00%	15,00%	95,00%
187	profilowanie skarp nasypów i wykopów	30.09.2021	17.06.2022	90,00%	2,00%	92,00%
188	Podbudowy	26.08.2021	10.10.2022			0,00%
189	Podbuodowa pomicnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.	26.08.2021	09.06.2022	93,00%	2,00%	95,00%
197	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	30.09.2021	24.08.2022	90,00%	5,00%	95,00%
204	Podbudowa bitumiczna z B.A.	13.12.2021	01.08.2022	90,00%	4,00%	94,00%
212	W-wa wiążąca	06.04.2022	12.09.2022			0,00%
214	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W; gr. 8 cm - TG	06.04.2022	20.04.2022	65,00%	15,00%	80,00%
219	W-wa ścieralna	22.08.2022	09.12.2022			0,00%
227	Roboty wykończeniowe	21.03.2022	14.12.2022			0,00%
229	Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich	21.03.2022	18.08.2022			0,00%
233	Przepusty	18.06.2021	21.09.2021			0,00%
235	Montaż rur - Przepusty HDPE	18.06.2021	15.07.2021	80,00%	0,00%	80,00%
237	Przepusty stalowe	12.07.2021	21.09.2021	70,00%	0,00%	70,00%
240	Elementy Ulic	18.10.2021	30.06.2022			0,00%
241	Ustawienie krawężników betonowych	18.10.2021	17.06.2022	60,00%	20,00%	80,00%
245	Ścieki trójkątne	18.10.2021	29.10.2021	80,00%	10,00%	90,00%
250	Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu	23.05.2022	24.10.2022			0,00%
259	Kanalizacja deszczowa	16.07.2021	17.06.2022			0,00%
260	Kanały deszczowe	16.07.2021	29.07.2021	26,00%	0,00%	26,00%
261	Wpusty	16.07.2021	29.07.2021	67,00%	0,00%	67,00%
262	Studnie i separatory	29.07.2021	29.07.2021	50,00%	0,00%	50,00%
263	Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa	06.05.2022	17.06.2022	0		0,00%
264	Zbiorniki	30.07.2021	15.11.2021			0,00%
265	Wykop - zbiorniki	30.07.2021	19.08.2021	100,00%	0,00%	100,00%
266	Roboty wykończeniowe - zbiorniki	20.08.2021	15.11.2021	90,00%	0,00%	90,00%
267	Melioracja	16.11.2021	12.05.2022			0,00%
268	Przebudowa cieków melioracyjnych	16.11.2021	12.05.2022	5,00%	0,00%	5,00%
269	Roboty elektroenergetyczne	15.07.2021	23.08.2022			
270	Przebudowa lini NN	18.03.2022	14.04.2022			0,00%
271	Montaż słupów i opraw	03.08.2022	23.08.2022			0,00%
272	Montaż fundamentów - TG	13.08.2021	19.08.2021	50,00%	0,00%	50,00%
273	Montaż fundamentów - ronda	31.05.2022	06.06.2022	20,00%	0,00%	20,00%
274	Budowa zasilania (transformator, kable) - TG	15.07.2021	12.08.2021	80,00%	5,00%	85,00%
275	Budowa zasilania (transformator, kable) - ronda	15.04.2022	30.05.2022	80,00%	5,00%	85,00%
276	Roboty teletechniczne	15.11.2021	08.04.2022			
277	Budowa studni kablowych	15.11.2021	25.03.2022	80,00%	10,00%	90,00%
278	Budowa kanalizacji teletechnicznej	15.11.2021	25.03.2022	80,00%	10,00%	90,00%
279	Montaż światłowodów	28.03.2022	08.04.2022			0,00%

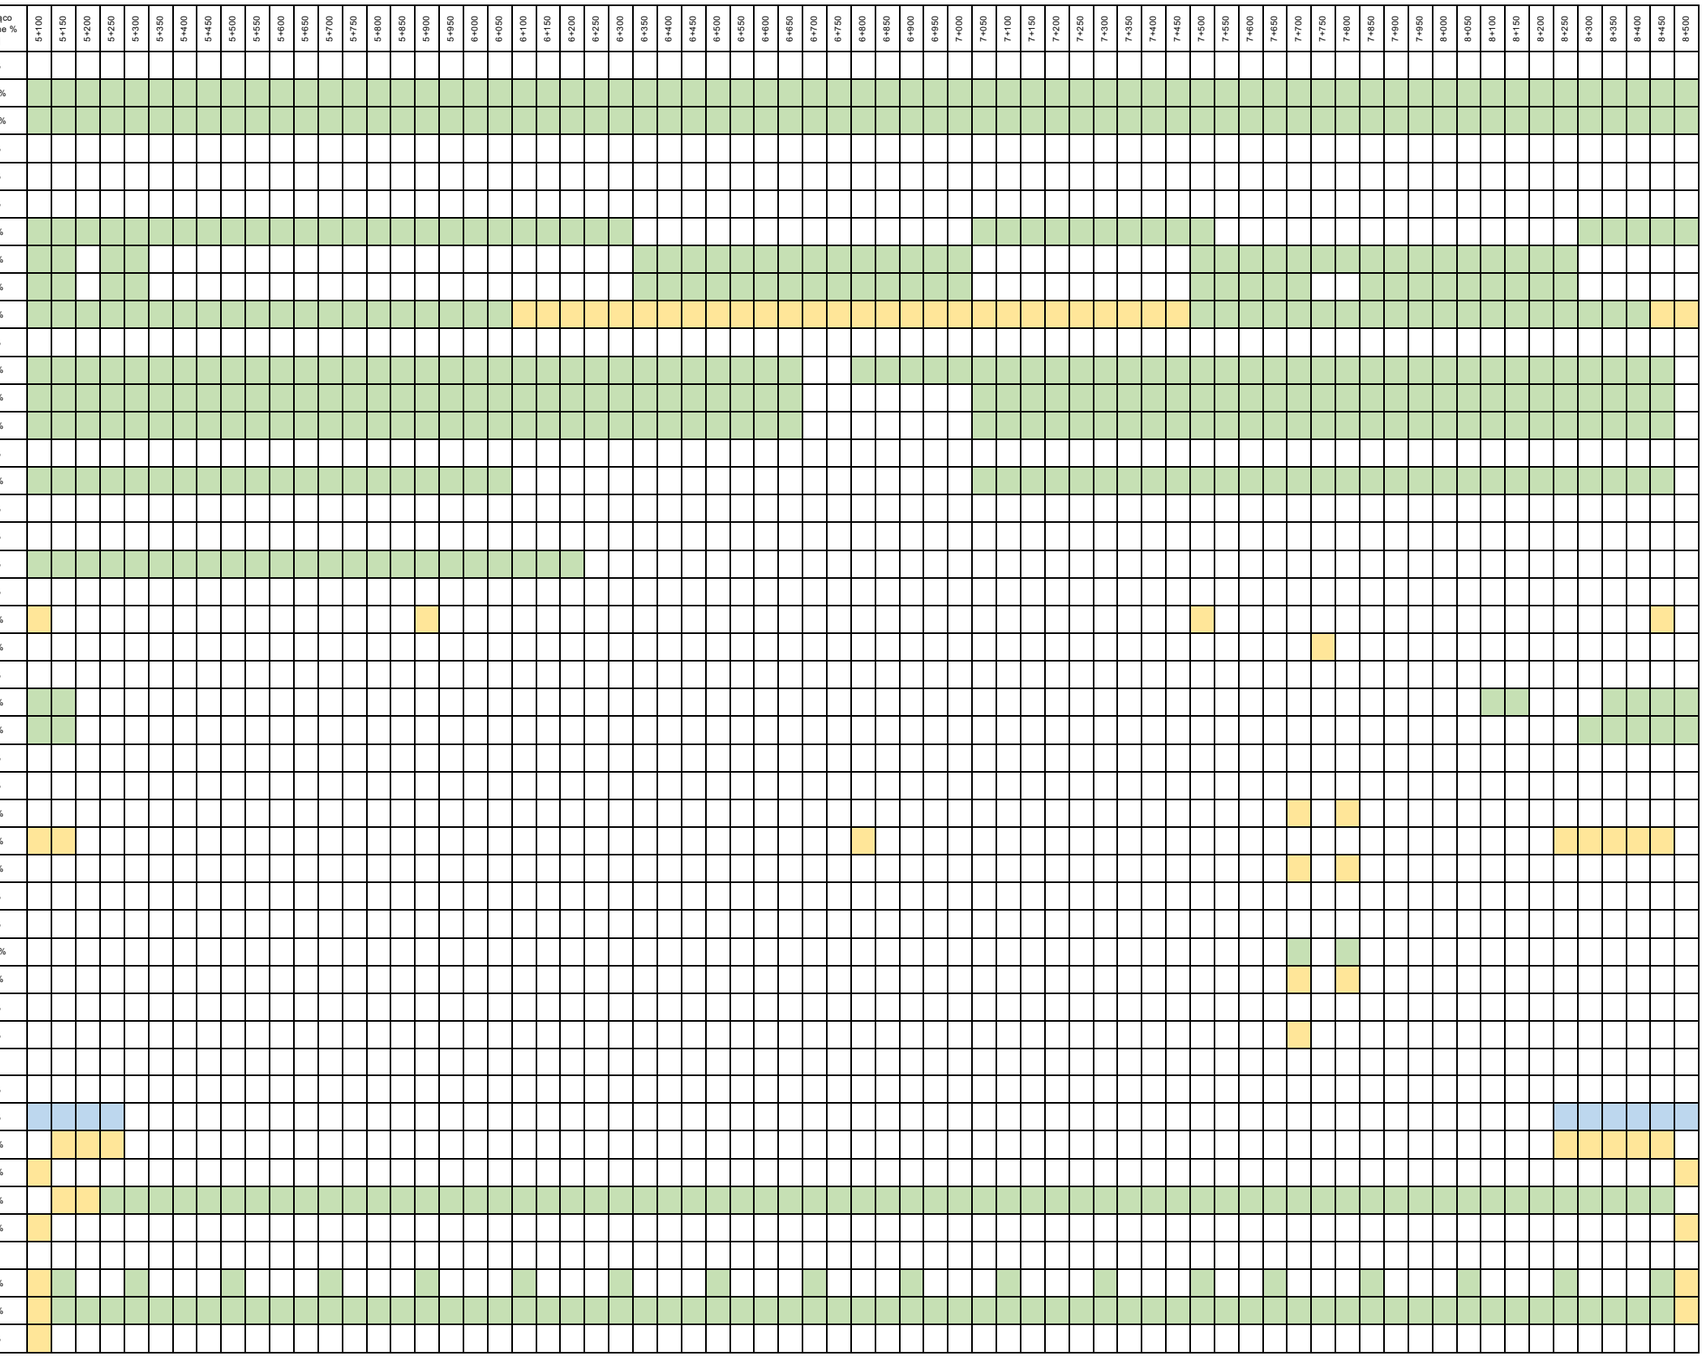

Legenda

- Roboty zakończone
- Roboty w trakcie — są to roboty również planowane na kolejny miesiąc
- Roboty planowane
