Załącznik nr 2 - Graficzny postep prac
Raport miesięczny nr 47 za Październik 2022 r.

SEKCJA I

nr pozycji z programu	asortyment robót	data rozpoczęcia zgodnie z programem	data zakończenia zgodnie z programem	wykonano do okresu [szacowane % ilości]	wykonano w okresie [szacowane % ilości]	narastająco [szacowane % ilości]	0+000	0+050	0+100	0+150	0+200	0+250	0+300	0+350	0+400	0+450	0+500	0+550	0+600	0+650	0+700	0+750	0+800	0+850	0+900	0+950	1+000	1+050	1+100	1+150	1+200
61	Roboty przygotowawcze	03.02.2021	14.08.2022			0,00%																									
62	Karczowanie z wywózką	03.02.2021	30.03.2021	100%	0%	100,00%																									
63	Odhumusowanie	31.03.2021	28.04.2021	100%	0%	100,00%																									
64	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I	15.07.2022	21.07.2022	95%	0%	95,00%																									
65	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II	08.09.2022	14.09.2022	20%	0%	20,00%																									
66	Drogi technologiczne (z dojazdami do PG1 i PG2)	15.04.2021	13.05.2021	80%	5%	85,00%																									
67	Roboty ziemne	29.04.2021	30.09.2022			0,00%																									
68	Roboty ziemne (wykop)	29.04.2021	01.07.2022	100,0%	0,00%	100,00%																									
72	Roboty ziemne (nasyp)	29.04.2021	30.09.2022	100,0%	0,00%	100,00%																									
75	GWN	17.03.2022	21.04.2022	100,0%	0,00%	100,00%																									
76	wymiana gruntu	26.07.2021	06.08.2021	100%	0,00%	100,00%																									
77	profilowanie skarp nasypów i wykopów	09.05.2022	30.09.2022	100%	0,00%	100,00%																									
78	Podbudowy	23.03.2022	20.10.2022			0,00%																									
79	Podbuodowa pomicnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.	23.03.2022	19.009.22	100%	0%	100,00%																									
88	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem C90/30 grubości	13.04.2022	06.05.2022	100%	0%	100,00%																									
93	Podbudowa bitumiczna z B.A	20.06.2022	20.10.2022	100%	0%	100,00%																									
101	W-wa wiążąca	14.07.2022	27.10.2022			0,00%																									
102	Warstwa wiążąca z B.A	14.07.2022	27.10.2022	100%	0%	100,00%																									

109	W-wa ścieralna	22.09.2022	02.11.2022	100%	0%	100,00%
117	Roboty wykończeniowe	13.06.2022	14.12.2022			0,00%
118	Umocnienie rowów	13.06.2022	25.07.2022	98%	2%	100,00%
119	Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich	13.06.2022	21.09.2022	90,0%	5%	95,00%
123	Przepusty	26.10.2021	10.06.2022			
124	Przepusty HDPE	22.03.2022	10.06.2022	90%	0%	90,00%
127	Przepusty stalowe	26.10.2021	19.04.2022	100%	0%	100,00%
130	Elementy Ulic	28.04.2022	10.10.2022			0,00%
140	Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu	03.10.2022	24.11.2022			0,00%
131	Ustawienie krawężników	09.05.2022	26.09.2022	90%	0%	90,00%
135	Ścieki trójkątne	28.04.2022	169.05.2022	95%	0%	95,00%
149	Kanalizacja deszczowa	16.03.2022	03.10.2022			0,00%
150	Kanały deszcowe	16.03.2022	29.03.2022	90%	0%	90,00%
151	Wpusty	30.03.2022	12.04.2022	90%	0%	90,00%
152	Wpusty- ronda	22.07.2022	28.07.2022	90%	0%	90,00%
153	Studnie i separatory	16.03.2022	29.03.2022	90%	5%	95,00%
154	Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa	24.08.2022	03.10.2022	60%	20%	80,00%
155	Zbiorniki	28.04.2022	13.12.2022			0,00%
156	Wykop - zbiorniki	28.04.2022	27.05.2022	75%	25%	100,00%
157	Roboty wykończeniowe - zbiorniki	04.10.2022	13.12.2022	75%	25%	100,00%
158	Melioracja	30.05.2022	08.08.2022			0,00%
159	Przebudowa cieków melioracyjnych	30.04.2022	08.08.2022	70%	30%	100,00%

160	Roboty elektroenergetyczne	16.03.2022	19.10.2022			
161	Przebudowa lini NN	22.07.2022	02.09.2022	0%	0%	0,00%
162	Montaż słupów i opraw	11.10.2022	19.10.2022	0%	100%	100,00%
163	Montaż fundamentów - TG	05.04.2022	17.06.2022	0%	100%	100,00%
164	Montaż fundamentów - ronda	27.09.2022	10.10.2022	5,00%	95,00%	100,00%
165	Budowa zasilania (transformator, kable) - TG	16.03.2022	10.06.2022	100,00%	0,00%	100,00%
166	Budowa zasilania (transformator, kable) - ronda	05.09.2022	23.09.2022	95,00%	5,00%	100,00%
167	Roboty teletechniczne	09.05.2022	18.07.2022			
168	Budowa studni kablowych	09.05.2022	04.07.2022	90,00%	10,00%	100,00%
169	Budowa kanalizacji teletechnicznej	09.05.2022	04.07.2022	90,00%	10,00%	100,00%
170	Montaż światłowodów	05.07.2022	18.07.2022	1,00%	0,00%	1,00%
171	Roboty wodociągowe	29.04.2021	28.05.2021	0%		0,00%
172	Likwidacja kolizji wodociągowej	29.04.2021	28.05.2021	100%	0%	100,00%

Legenda

Roboty zakończone

Roboty w trakcie — są to roboty również planowane na kolejny miesiąc

Roboty planowane

																		1+250
																		1+300
																		1+350
																		1+400
																		1+450
																		1+500
																		1+550
																		1+600
																		1+650
																		1+700
																		1+750
																		1+800
																		1+850
																		1+900
																		1+950
																		2+000
																		2+050
																		2+100
																		2+150
																		2+200
																		2+250
																		2+300
																		2+350
																		2+400
																		2+450
																		2+500
																		2+550
																		2+600
																		2+650
																		2+700
																		2+750
																		2+800
																		2+850
																		2+900
																		2+950
																		3+000
																		3+050
																		3+100
																		3+150
																		3+200
																		3+250
																		3+300
																		3+350
																		3+400
																		3+450
																		3+500
																		3+550
																		3+600
																		3+650
																		3+700
																		3+750
																		3+800
																		3+850
																		3+900
																		3+950
																		4+000
																		4+050
																		4+100
																		4+150
																		4+200
																		4+250
																		4+300
																		4+350
																		4+400
																		4+450
																		4+500
																		4+550
																		4+600

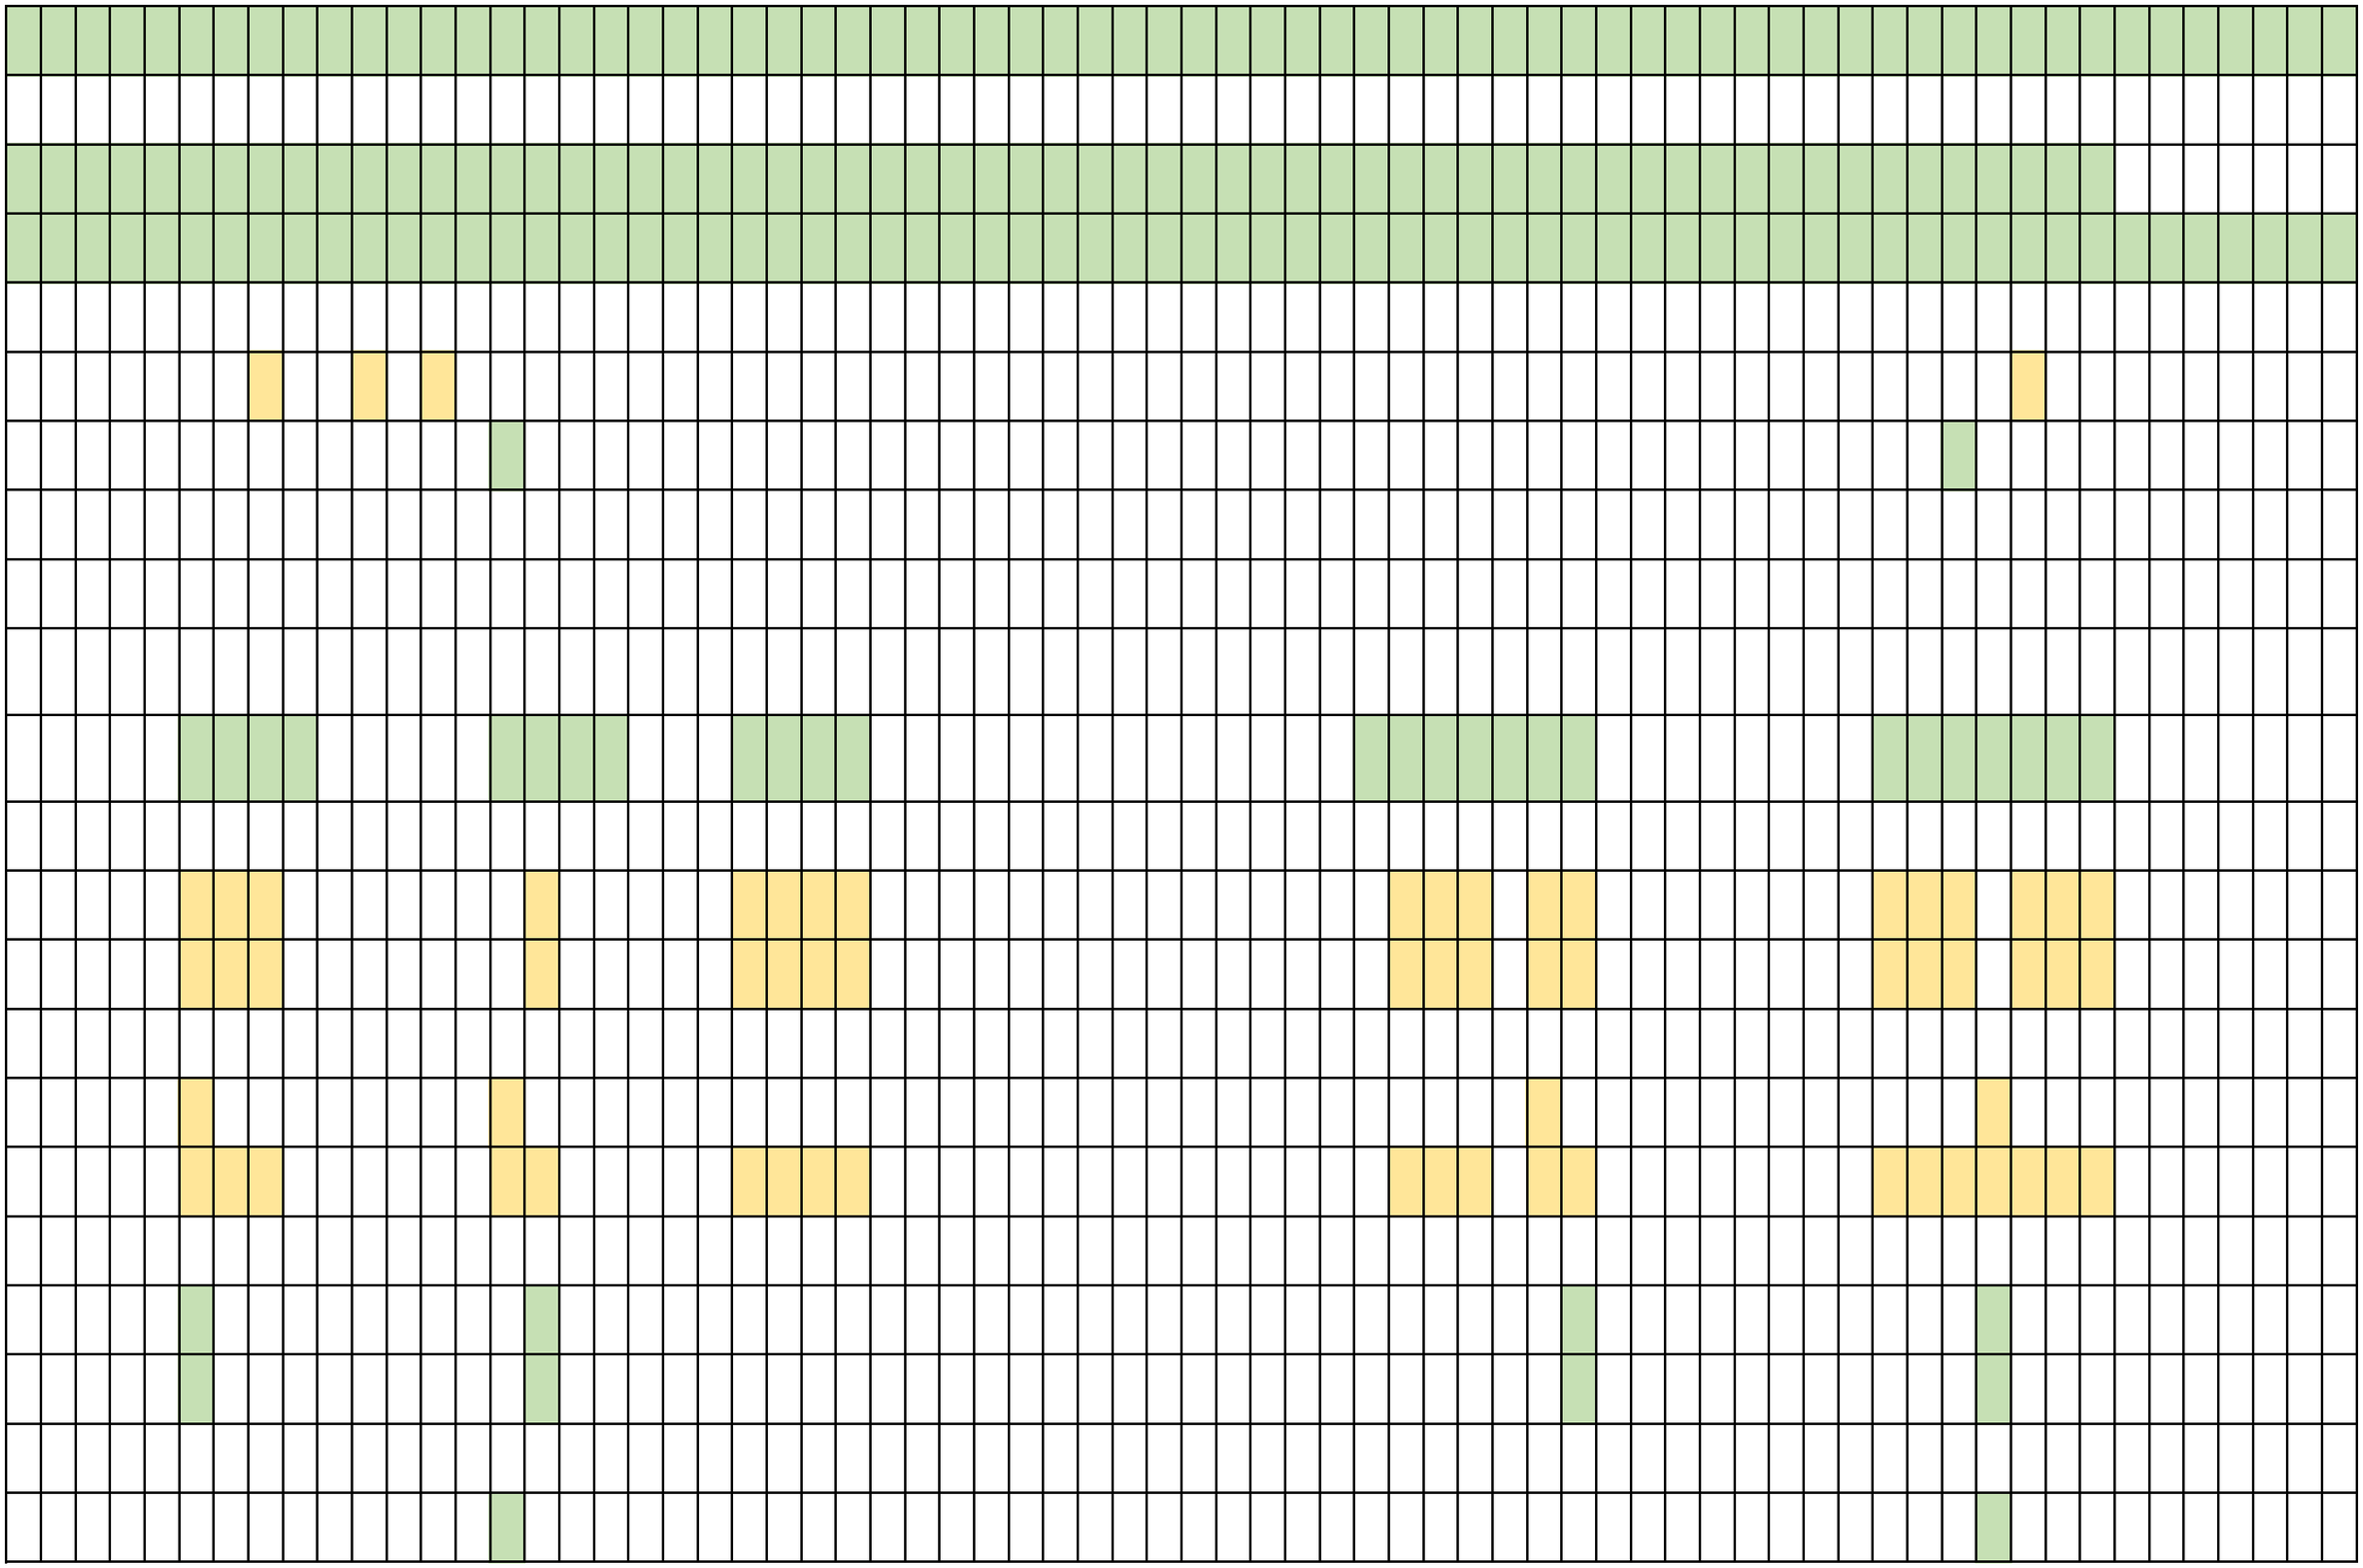

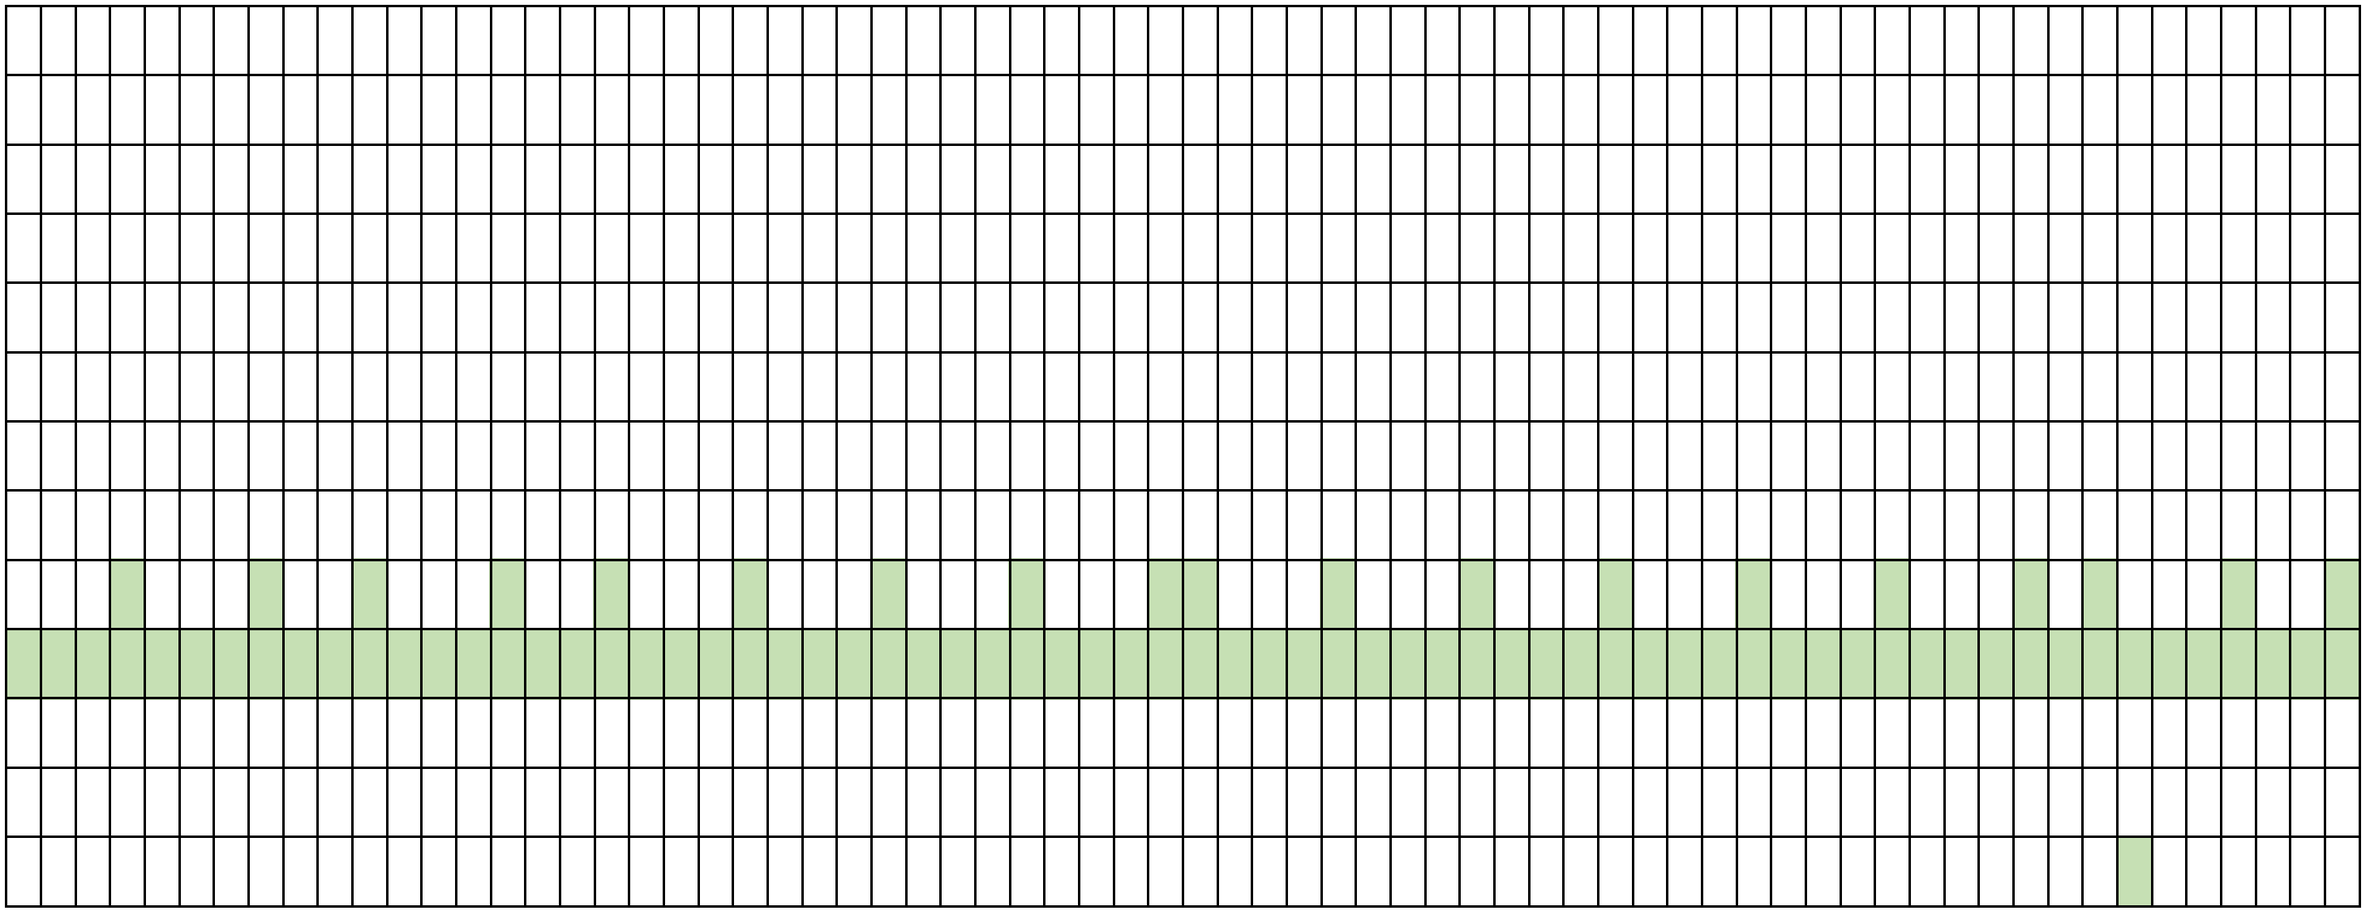
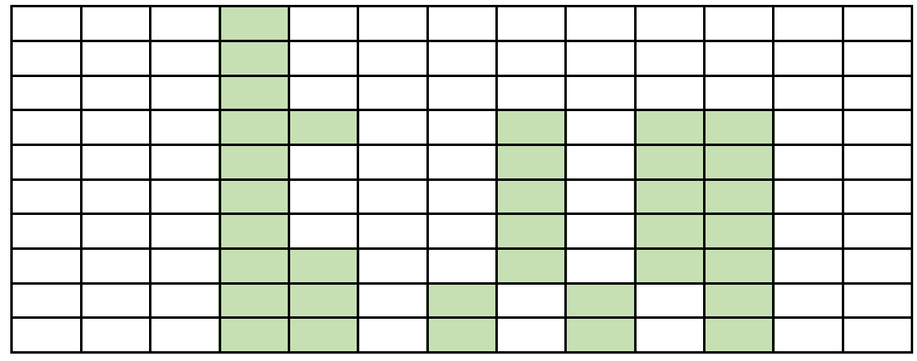
																		4+650
																		4+700
																		4+750
																		4+800
																		4+850
																		4+900
																		4+950
																		5+000
																		5+050
																		5+100
