Załącznik nr 2 - Graficzny postep prac
Raport miesięczny nr 50 za Styczeń 2023 r.

SEKCJA III

| nr pozycji z programu | asortyment robót | data rozpoczęcia zgodnie z programem | data zakończenia zgodnie z programem | wykonano do okresu [szacowane % ilości] | wykonano w okresie [szacowane % ilości] | narastająco [szacowane % ilości] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Roboty przygotowawcze | 03.02.2021 | 13.05.2022 | | | |
| 282 | Karczowanie z wywózką | 03.02.2021 | 30.03.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 283 | Odhumusowanie | 31.03.2021 | 20.04.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 284 | Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I | 18.03.2022 | 28.03.2022 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 285 | Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II | 05.05.2022 | 13.05.2022 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 287 | Roboty ziemne | 21.04.2021 | 27.05.2022 | | | |
| 288 | Wykop | 21.04.2021 | 12.08.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 292 | Nasyp | 21.04.2021 | 27.05.2022 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 295 | GWN | 30.07.2021 | 18.08.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 297 | wymiana gruntu/ ulepszenie gruntu | 21.04.2021 | 27.04.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 298 | profilowanie skarp nasypów i wykopów | 16.07.2021 | 04.04.2022 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 299 | Podbudowy | 10.08.2021 | 26.10.2022 | | | |
| 300 | Podbuodowa pomicnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech. | 10.08.2021 | 03.06.2022 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 309 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/30 grubiści 20 cm - TG+zjazdy (W-wa I gr. 10 cm) | 14.09.2021 | 29.09.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 316 | Podbudowa bitumiczna z B.A | 28.10.2021 | 04.08.2022 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 325 | W-wa wiążąca | 25.11.2021 | 17.10.2022 | | | |
| 326 | Warstwa wiążąca z B.A. | 25.11.2021 | 17.10.2022 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 334 | W-wa ścieralna | 03.08.2022 | 17.11.2022 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 345 | Roboty wykończeniowe | 13.12.2021 | 14.12.2022 | 40,00% | 0,00% | 40,00% |
| 347 | Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich | 04.04.2022 | 08.08.2022 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 352 | Przepusty | 18.06.2021 | 20.04.2022 | | | |
| 353 | Montaż rur | 02.07.2021 | 15.07.2021 | 989,00% | 0,00% | 989,00% |
| 356 | Przepusty stalowe | 18.06.2021 | 20.04.2022 | 95,00% | 0,00% | 95,00% |
| 359 | Elementy Ulic | 21.09.2021 | 06.07.2022 | | | 0,00% |
| 360 | Ustawienie krawężników betonowych | 21.09.2021 | 14.06.2022 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 245 | Ścieki trójkątne | 21.09.2021 | 08.10.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 346 | Umocnienie rowów | 05.04.2022 | 01.07.2022 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 369 | Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu | 02.08.2022 | 14.12.2022 | | | 0,00% |
| 381 | Kanalizacja deszczowa | 04.06.2021 | 14.06.2022 | | | 0,00% |
| 382 | Kanały deszcowe | 04.06.2021 | 17.06.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 383 | Wpusty | 18.06.2021 | 07.07.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 384 | Studnie i separatory | 04.06.2021 | 17.06.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 385 | Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa | 20.10.2021 | 14.06.2022 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 386 | Zbiorniki | 16.07.2021 | 01.09.2021 | | | 0,00% |
| 387 | Wykop - zbiorniki | 16.07.2021 | 21.07.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 388 | Roboty wykończeniowe - zbiorniki | 22.07.2021 | 01.09.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 389 | Melioracja | 22.07.2021 | 13.10.2021 | | | 0,00% |
| 390 | Przebudowa cieków melioracyjnych | 22.07.2021 | 13.10.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 391 | Roboty elektroenergetyczne | 07.07.2021 | 31.03.2022 | | | |
| 392 | Przebudowa lini SN | 16.07.2021 | 04.08.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 393 | Montaż fundamentów | 23.07.2021 | 02.08.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 394 | Montaż słupów i opraw | 13.12.2021 | 31.03.2022 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 395 | Budowa zasilania | 07.07.2021 | 26.07.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 396 | Roboty teletechniczne | 08.10.2021 | 05.04.2022 | | | |
| 397 | Budowa studni kablowych | 08.10.2021 | 21.03.2022 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 398 | Budowa kanalizacji teletechnicznej | 08.10.2021 | 21.03.2022 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 399 | Montaż światłowodów | 23.03.2022 | 05.04.2022 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |

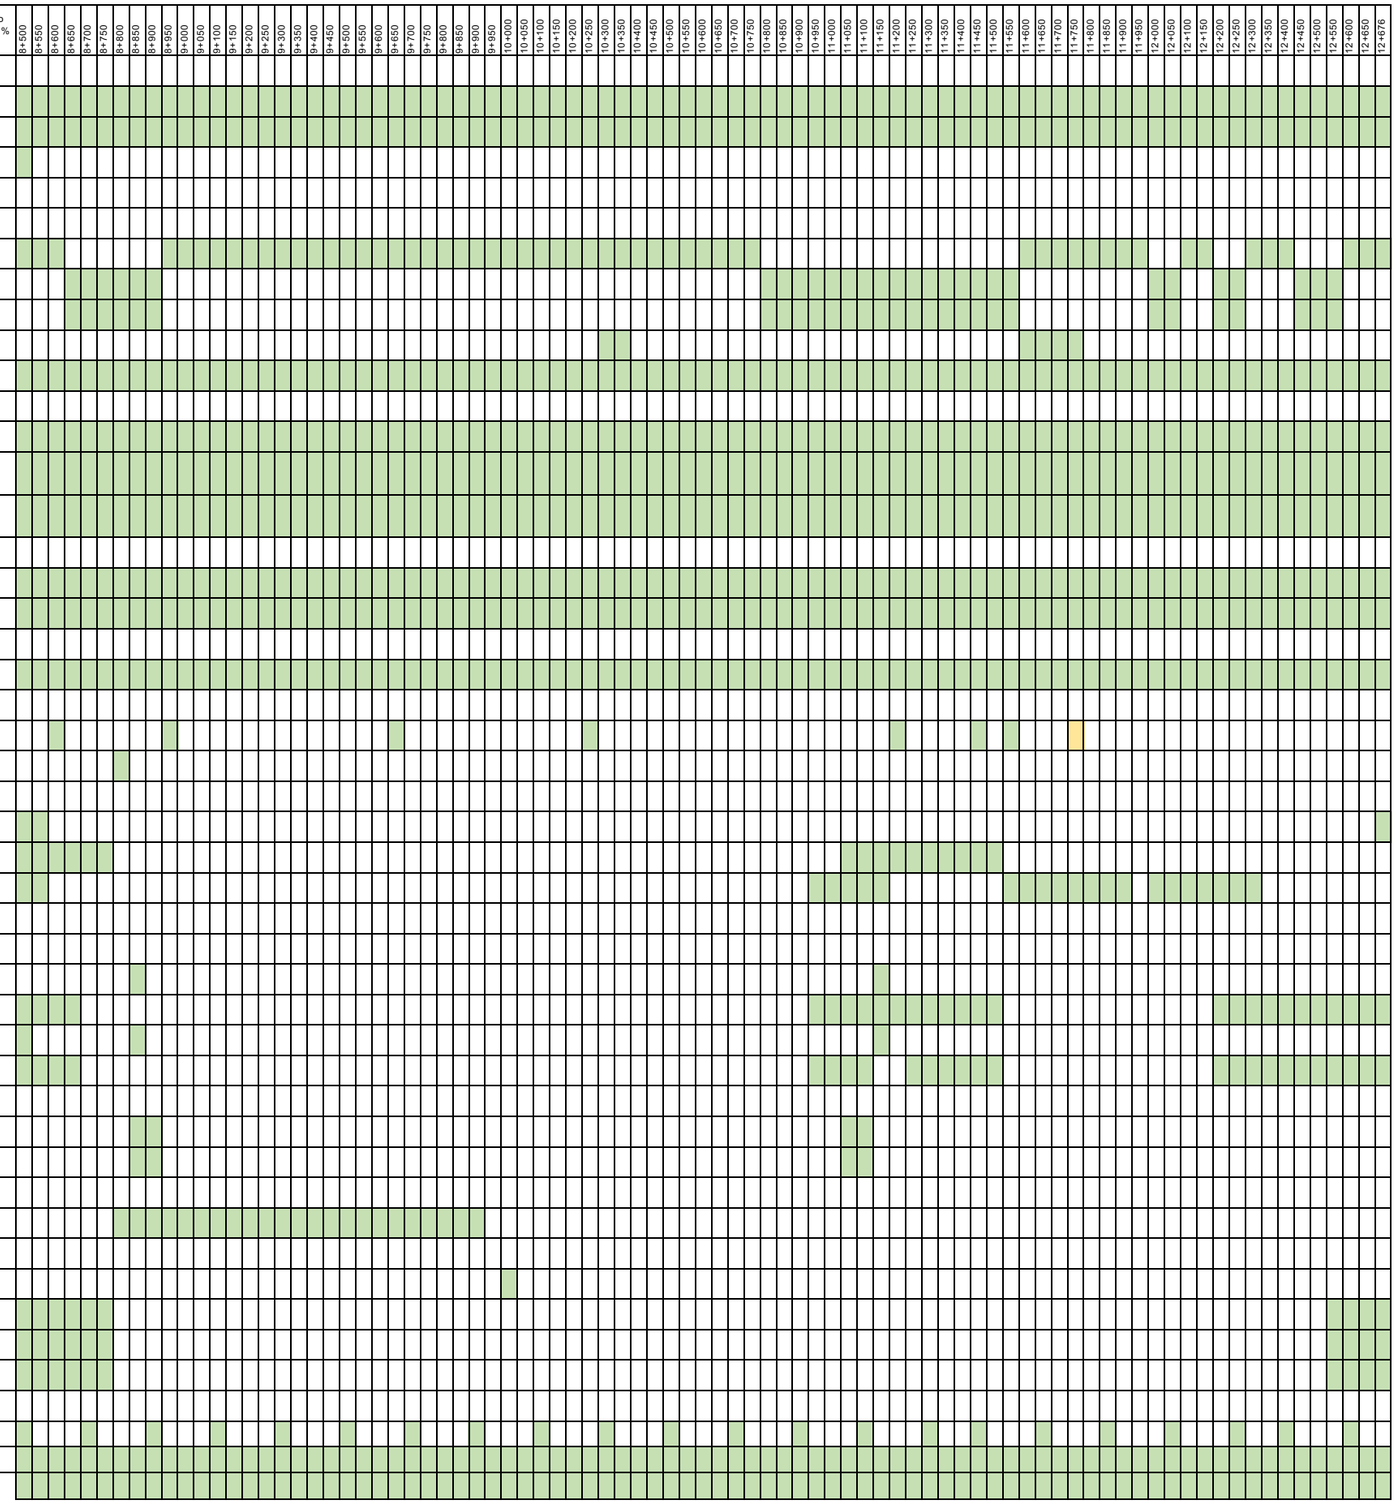

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Roboty gazowe | 09.03.2021 | 24.06.2021 | | | 0,00% |
| 404 | Przebudowa kolizji z istn. Gazociągiem | 13.05.2021 | 24.06.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |

Legenda

Roboty zakończone

Roboty w trakcie — są to roboty również planowane na kolejny miesiąc

Roboty planowane
