Załącznik nr 2 - Graficzny postep prac
Raport miesięczny nr 50 za Styczeń 2023 r.

SEKCJA I

nr pozycji z programu	asortyment robót	data rozpoczęcia zgodnie z programem	data zakończenia zgodnie z programem	wykonano do okresu [szacowane % ilości]	wykonano w okresie [szacowane % ilości]	narastająco [szacowane % ilości]
61	Roboty przygotowawcze	03.02.2021	14.08.2022			0,00%
62	Karczowanie z wywózką	03.02.2021	30.03.2021	100%	0%	100,00%
63	Odhumusowanie	31.03.2021	28.04.2021	100%	0%	100,00%
64	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I	15.07.2022	21.07.2022	95%	5%	100,00%
65	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II	08.09.2022	14.09.2022	20%	80%	100,00%
66	Drogi technologiczne (z dojazdami do PG1 i PG2)	15.04.2021	13.05.2021	85%	10%	95,00%
67	Roboty ziemne	29.04.2021	30.09.2022			0,00%
68	Roboty ziemne (wykop)	29.04.2021	01.07.2022	100,0%	0,00%	100,00%
72	Roboty ziemne (nasyp)	29.04.2021	30.09.2022	100,0%	0,00%	100,00%
75	GWN	17.03.2022	21.04.2022	100,0%	0,00%	100,00%
76	wymiana gruntu	26.07.2021	06.08.2021	100%	0,00%	100,00%
77	profilowanie skarp nasypów i wykopów	09.05.2022	30.09.2022	100%	0,00%	100,00%
78	Podbudowy	23.03.2022	20.10.2022			0,00%
79	Podbuodowa pomnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.	23.03.2022	19.009.22	100%	0%	100,00%
88	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/30 grubości	13.04.2022	06.05.2022	100%	0%	100,00%
93	Podbudowa bitumiczna z B.A	20.06.2022	20.10.2022	100%	0%	100,00%
101	W-wa wiążąca	14.07.2022	27.10.2022			0,00%
102	Warstwa wiążąca z B.A	14.07.2022	27.10.2022	100%	0%	100,00%
109	W-wa ścieralna	22.09.2022	02.11.2022	100%	0%	100,00%
117	Roboty wykończeniowe	13.06.2022	14.12.2022			0,00%
118	Umocnienie rowów	13.06.2022	25.07.2022	100%	0%	100,00%
119	Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich	13.06.2022	21.09.2022	95,0%	3%	98,00%
123	Przepusty	26.10.2021	10.06.2022			
124	Przepusty HDPE	22.03.2022	10.06.2022	90%	0%	90,00%
127	Przepusty stalowe	26.10.2021	19.04.2022	100%	0%	100,00%
130	Elementy Ulic	28.04.2022	10.10.2022			0,00%
140	Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu	03.10.2022	24.11.2022			0,00%
131	Ustawienie krawężników	09.05.2022	26.09.2022	90%	10%	100,00%
135	Ścieki trójkątne	28.04.2022	169.05.2022	95%	5%	100,00%
149	Kanalizacja deszczowa	16.03.2022	03.10.2022			0,00%
150	Kanały deszcowe	16.03.2022	29.03.2022	90%	10%	100,00%
151	Wpusty	30.03.2022	12.04.2022	90%	10%	100,00%
152	Wpusty- ronda	22.07.2022	28.07.2022	90%	10%	100,00%
153	Studnie i separatory	16.03.2022	29.03.2022	95%	5%	100,00%
154	Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa	24.08.2022	03.10.2022	80%	20%	100,00%
155	Zbiorniki	28.04.2022	13.12.2022			0,00%
156	Wykop - zbiorniki	28.04.2022	27.05.2022	100%	0%	100,00%
157	Roboty wykończeniowe - zbiorniki	04.10.2022	13.12.2022	100%	0%	100,00%
158	Melioracja	30.05.2022	08.08.2022			0,00%
159	Przebudowa cieków melioracyjnych	30.04.2022	08.08.2022	100%	0%	100,00%
160	Roboty elektroenergetyczne	16.03.2022	19.10.2022			
161	Przebudowa lini NN	22.07.2022	02.09.2022	0%	0%	0,00%
162	Montaż słupów i opraw	11.10.2022	19.10.2022	100%	0%	100,00%
163	Montaż fundamentów - TG	05.04.2022	17.06.2022	100%	0%	100,00%
164	Montaż fundamentów - ronda	27.09.2022	10.10.2022	100,00%	0,00%	100,00%
165	Budowa zasilania (transformator, kable) - TG	16.03.2022	10.06.2022	100,00%	0,00%	100,00%
166	Budowa zasilania (transformator, kable) - ronda	05.09.2022	23.09.2022	100,00%	0,00%	100,00%
167	Roboty teletechniczne	09.05.2022	18.07.2022			
168	Budowa studni kablowych	09.05.2022	04.07.2022	100,00%	0,00%	100,00%
169	Budowa kanalizacji teletechnicznej	09.05.2022	04.07.2022	100,00%	0,00%	100,00%
170	Montaż światłowodów	05.07.2022	18.07.2022	1,00%	99,00%	100,00%
171	Roboty wodociągowe	29.04.2021	28.05.2021	0%		0,00%

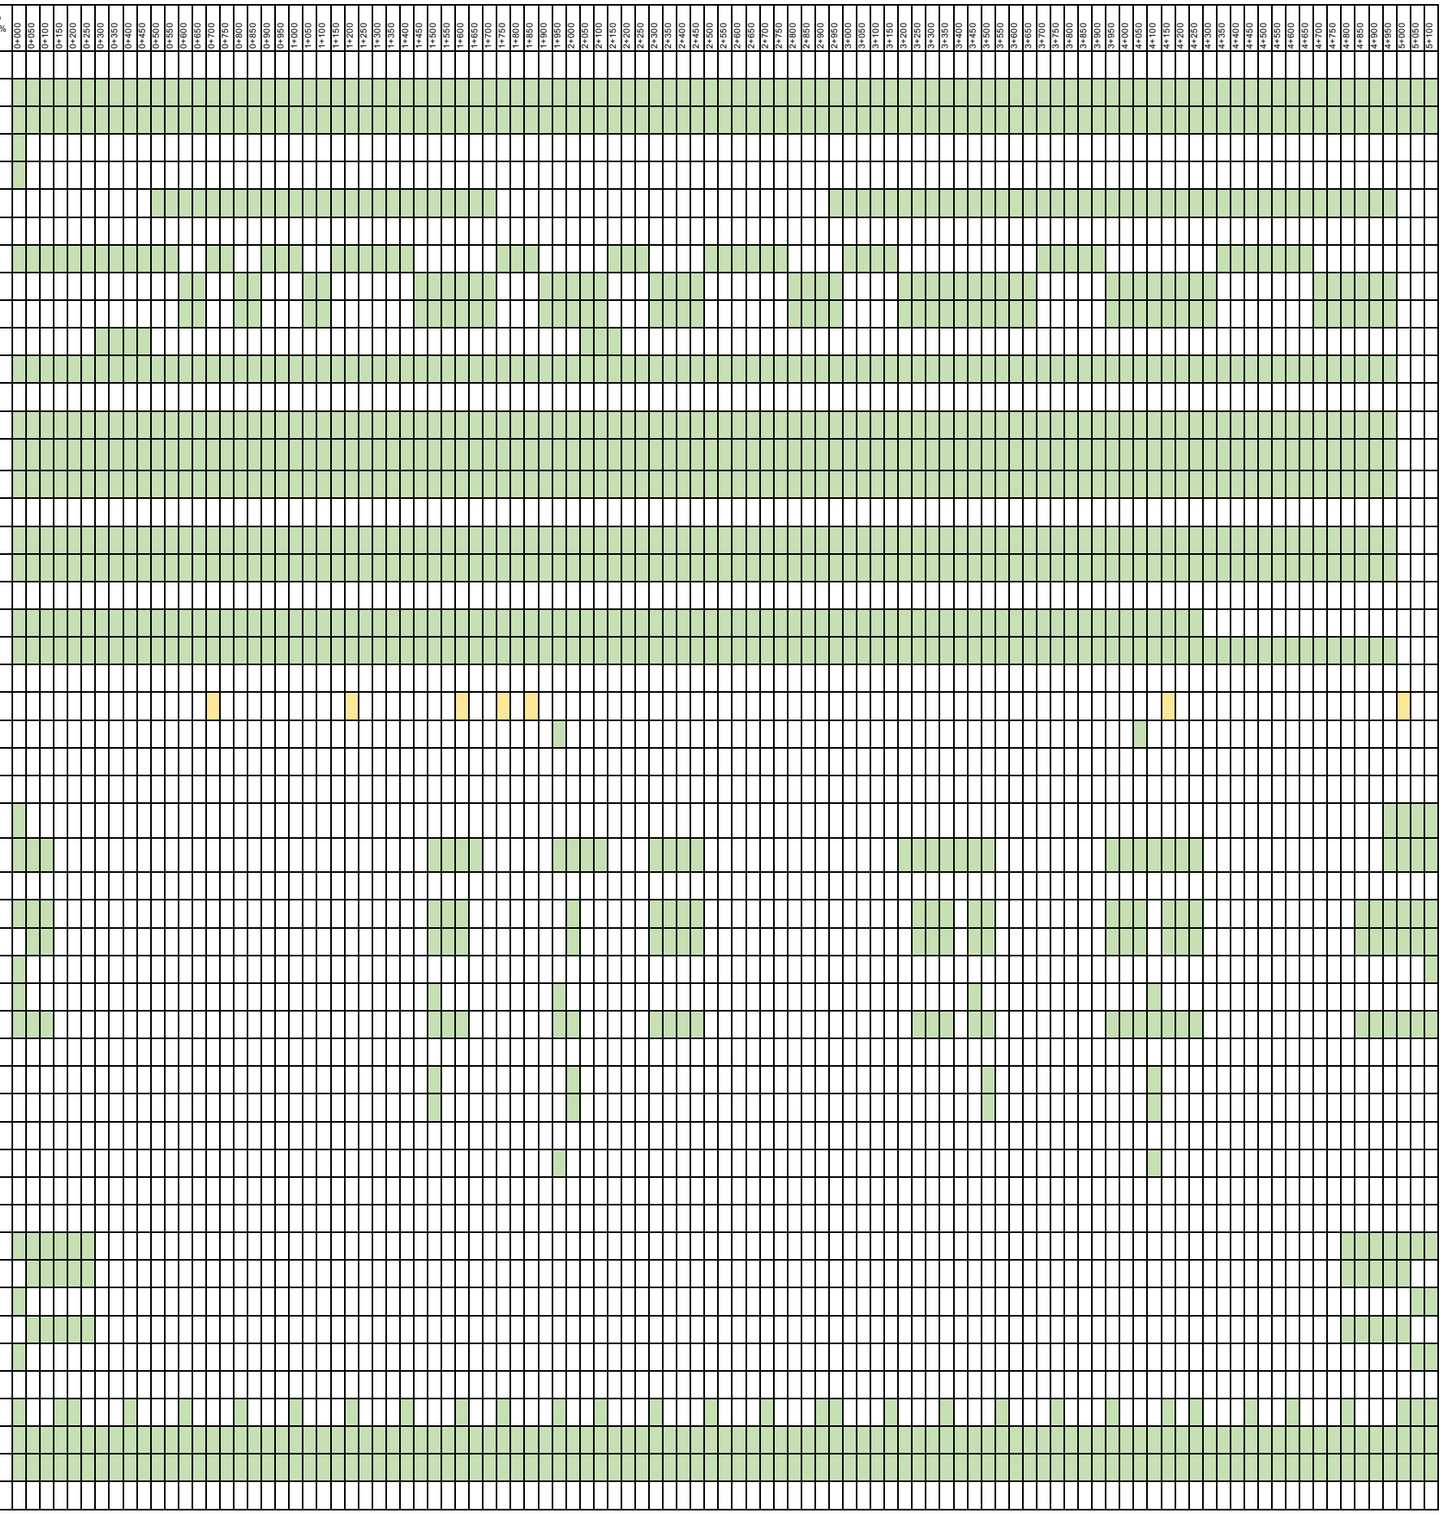

172	Likwidacja kolizji wodociągowej	29.04.2021	28.05.2021	100%	0%	100,00%

Legenda

Roboty zakończone
Roboty w trakcie
Roboty planowane

są to roboty również planowane na kolejny miesiąc
