RAPORT MIESIĘCZNY KONSULTANTA Z POSTĘPU PRAC NR 48

za okres: Styczeń 2023 r.

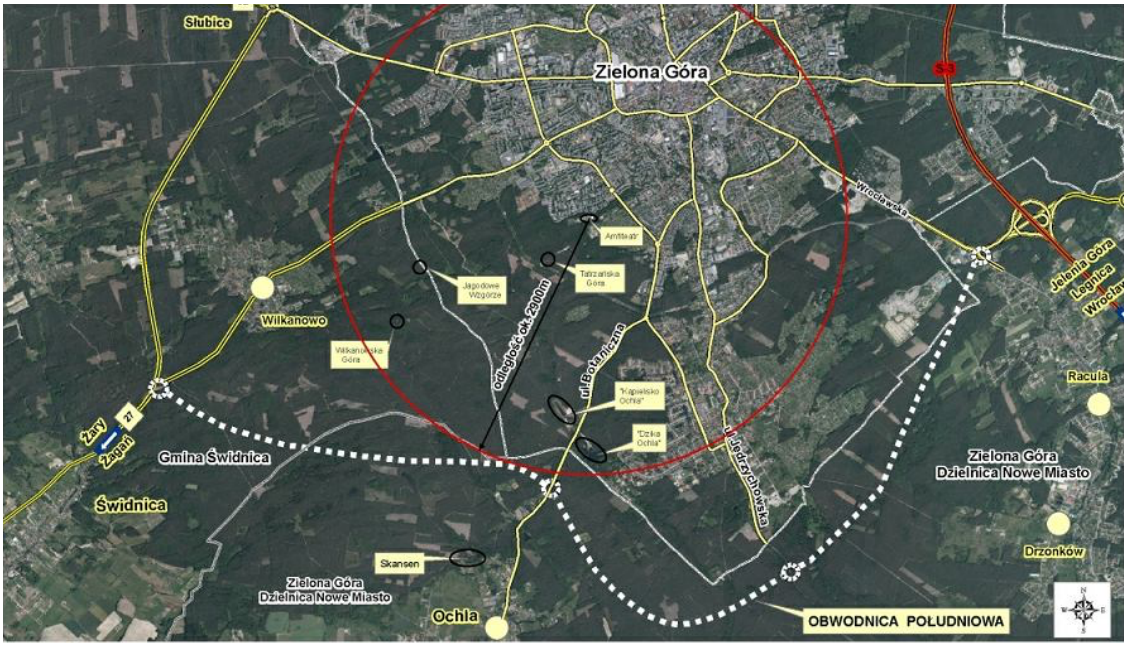

PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA: „BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA ZIELONA GÓRA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ”

3. POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT WYKONAWCY WRAZ Z ANALIZĄ POSTĘPU WYKONANYCH ROBÓT

3.1. Program prac projektowych i Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z Programem dla etapu Robót z dnia 18.12.2020, wer. 00 rew. 01.

3.3. Postęp robót w odniesieniu do aktualnego Programu

Zespół Konsultanta nie stwierdza opóźnień w realizacji Robót w odniesieniu do Programu.

3.4. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym:

W okresie, którego dotyczy raport, wykonano:

Roboty drogowe:

- ustawianie barier i balustrad
- wykonywania oznakowania pionowego
- ogrodzenie zbiorników
- nasadzenia zieleni
- prowadzono prace przy budowie SZR
- Roboty telekomunikacyjne – ułożenie światłowodu
