Załącznik nr 2 - Graficzny postep prac
Raport miesięczny nr 51 za Luty 2023 r.

SEKCJA I

nr pozycji z programu	asortyment robót	data rozpoczęcia zgodnie z programem	data zakończenia zgodnie z programem	wykonano do okresu [szacowane % ilości]	wykonano w okresie [szacowane % ilości]	narastająco [szacowane % ilości]
61	Roboty przygotowawcze	03.02.2021	14.08.2022			
62	Karczowanie z wywózką	03.02.2021	30.03.2021	100%	0%	100,00%
63	Odhumusowanie	31.03.2021	28.04.2021	100%	0%	100,00%
64	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I	15.07.2022	21.07.2022	100%	0%	100,00%
65	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II	08.09.2022	14.09.2022	100%	0%	100,00%
66	Drogi technologiczne (z dojazdami do PG1 i PG2)	15.04.2021	13.05.2021	95%	5%	100,00%
67	Roboty ziemne	29.04.2021	30.09.2022			
68	Roboty ziemne (wykop)	29.04.2021	01.07.2022	100,0%	0,00%	100,00%
72	Roboty ziemne (nasyp)	29.04.2021	30.09.2022	100,0%	0,00%	100,00%
75	GWN	17.03.2022	21.04.2022	100,0%	0,00%	100,00%
76	wymiana gruntu	26.07.2021	06.08.2021	100%	0,00%	100,00%
77	profilowanie skarp nasypów i wykopów	09.05.2022	30.09.2022	100%	0,00%	100,00%
78	Podbudowy	23.03.2022	20.10.2022			
79	Podbuodowa pomicnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.	23.03.2022	19.009.22	100%	0%	100,00%
88	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/30 grubości	13.04.2022	06.05.2022	100%	0%	100,00%
93	Podbudowa bitumiczna z B.A	20.06.2022	20.10.2022	100%	0%	100,00%
101	W-wa wiążąca	14.07.2022	27.10.2022			
102	Warstwa wiążąca z B.A	14.07.2022	27.10.2022	100%	0%	100,00%
109	W-wa ścieralna	22.09.2022	02.11.2022	100%	0%	100,00%
117	Roboty wykończeniowe	13.06.2022	14.12.2022			
118	Umocnienie rowów	13.06.2022	25.07.2022	100%	0%	100,00%
119	Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich	13.06.2022	21.09.2022	98,0%	2%	100,00%
123	Przepusty	26.10.2021	10.06.2022			
124	Przepusty HDPE	22.03.2022	10.06.2022	90%	10%	100,00%
127	Przepusty stalowe	26.10.2021	19.04.2022	100%	0%	100,00%
130	Elementy Ulic	28.04.2022	10.10.2022			0,00%
140	Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu	03.10.2022	24.11.2022			0,00%
131	Ustawienie krawężników	09.05.2022	26.09.2022	100%	0%	100,00%
135	Ścieki trójkątne	28.04.2022	169.05.2022	100%	0%	100,00%
149	Kanalizacja deszczowa	16.03.2022	03.10.2022			0,00%
150	Kanały deszczowe	16.03.2022	29.03.2022	90%	10%	100,00%
151	Wpusty	30.03.2022	12.04.2022	90%	10%	100,00%
152	Wpusty- ronda	22.07.2022	28.07.2022	90%	10%	100,00%
153	Studnie i separatory	16.03.2022	29.03.2022	95%	5%	100,00%
154	Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa	24.08.2022	03.10.2022	80%	20%	100,00%
155	Zbiorniki	28.04.2022	13.12.2022			0,00%
156	Wykop - zbiorniki	28.04.2022	27.05.2022	100%	0%	100,00%
157	Roboty wykończeniowe - zbiorniki	04.10.2022	13.12.2022	100%	0%	100,00%
158	Melioracja	30.05.2022	08.08.2022			0,00%
159	Przebudowa cieków melioracyjnych	30.04.2022	08.08.2022	100%	0%	100,00%
160	Roboty elektroenergetyczne	16.03.2022	19.10.2022			
161	Przebudowa lini NN	22.07.2022	02.09.2022	0%	0%	100,00%
162	Montaż słupów i opraw	11.10.2022	19.10.2022	100%	0%	100,00%
163	Montaż fundamentów - TG	05.04.2022	17.06.2022	100%	0%	100,00%
164	Montaż fundamentów - ronda	27.09.2022	10.10.2022	100,00%	0,00%	100,00%
165	Budowa zasilania (transformator, kable) - TG	16.03.2022	10.06.2022	100,00%	0,00%	100,00%
166	Budowa zasilania (transformator, kable) - ronda	05.09.2022	23.09.2022	100,00%	0,00%	100,00%
167	Roboty teletechniczne	09.05.2022	18.07.2022			
168	Budowa studni kablowych	09.05.2022	04.07.2022	100,00%	0,00%	100,00%
169	Budowa kanalizacji teletechnicznej	09.05.2022	04.07.2022	100,00%	0,00%	100,00%
170	Montaż światłowodów	05.07.2022	18.07.2022	100,00%	0,00%	100,00%
171	Roboty wodociągowe	29.04.2021	28.05.2021	0%		0,00%
172	Likwidacja kolizji wodociągowej	29.04.2021	28.05.2021	100%	0%	100,00%

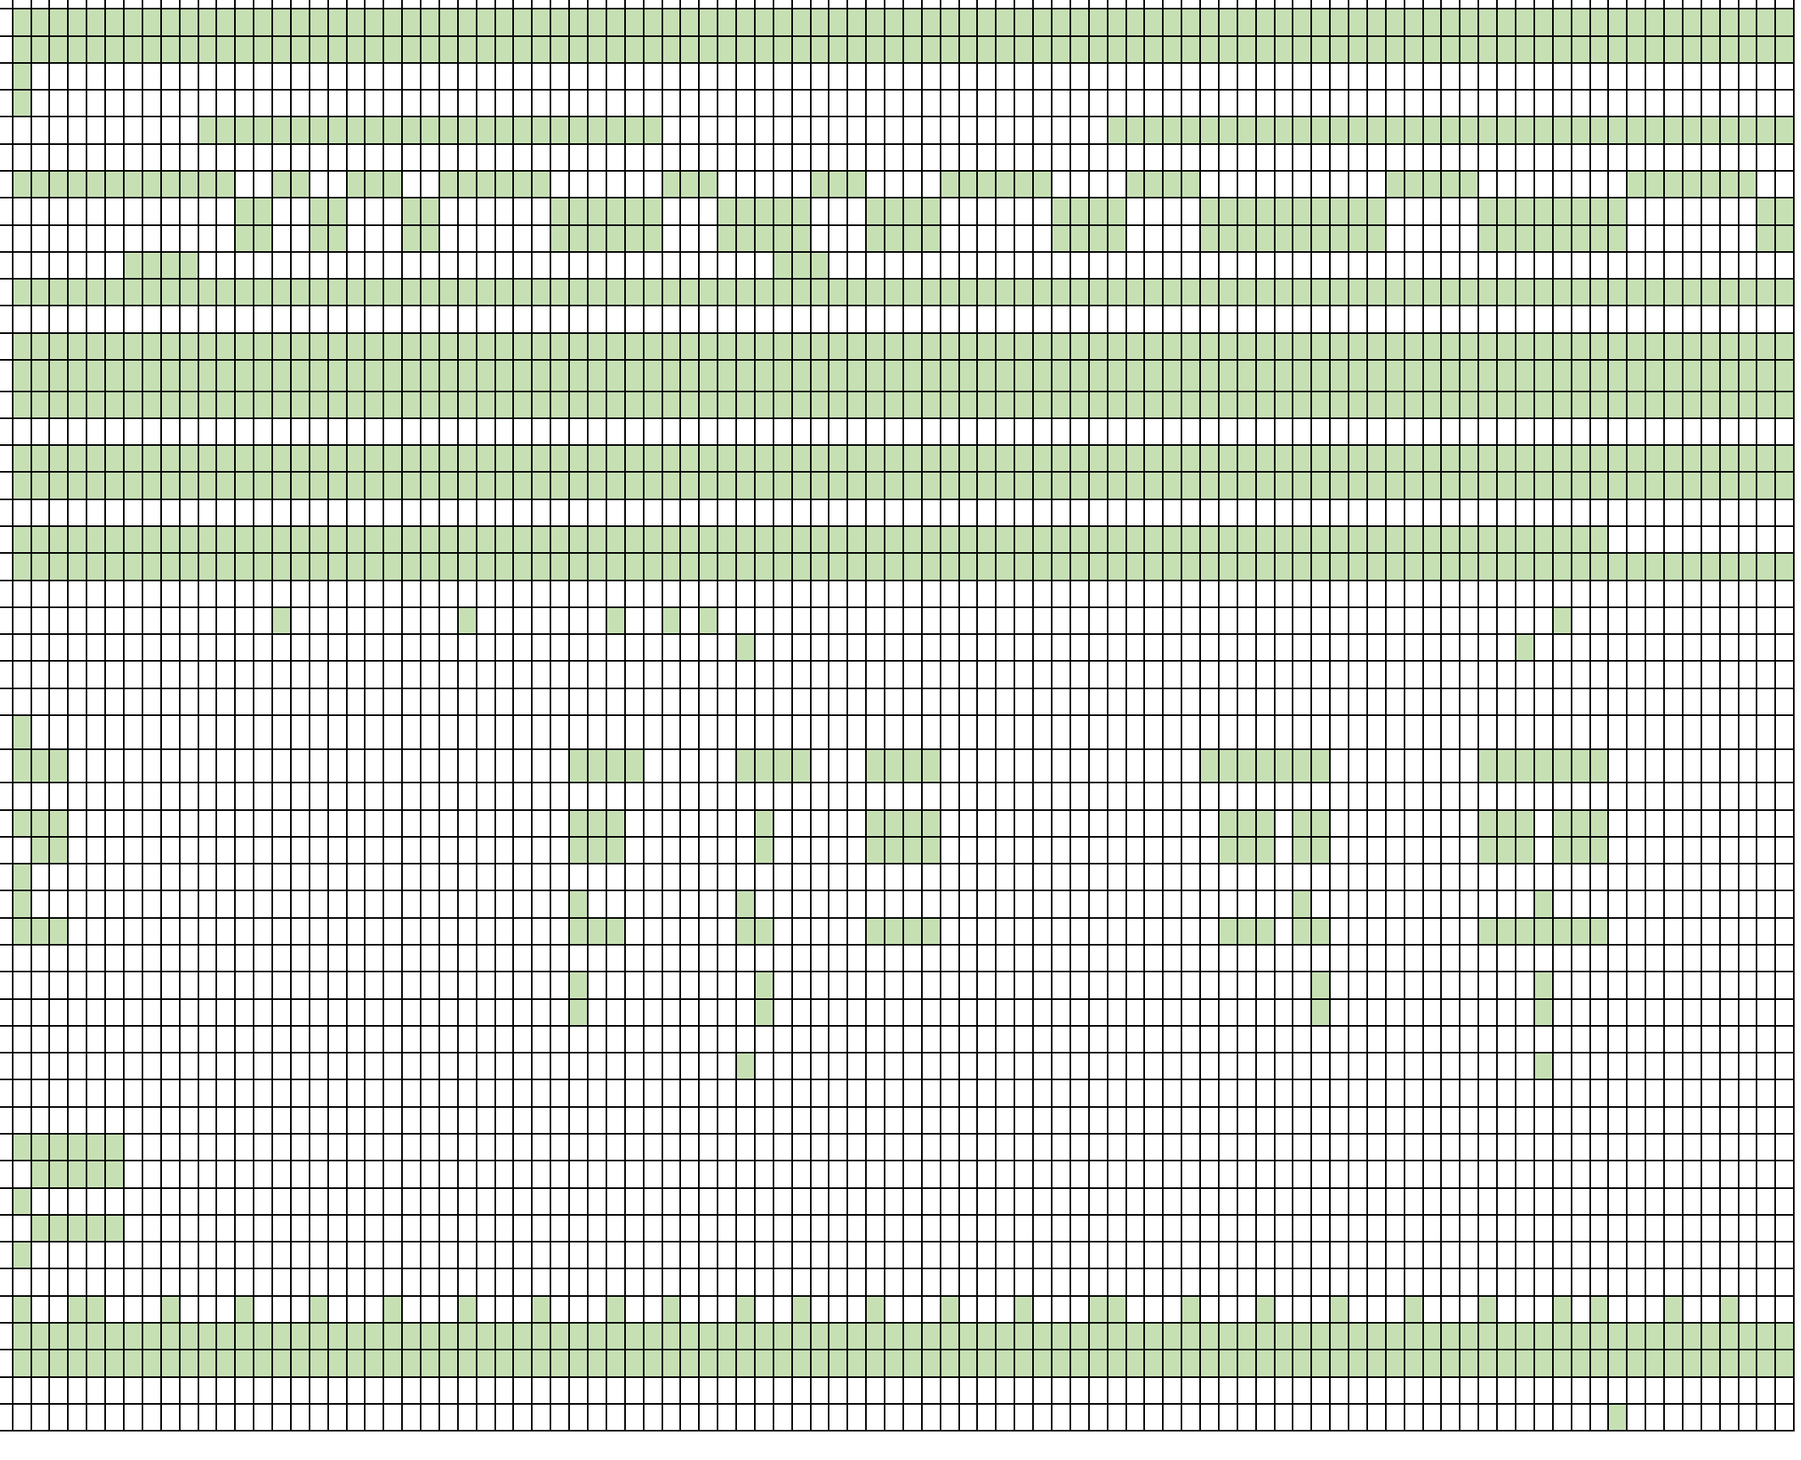

Legenda
Roboty zakończone

Roboty w trakcie	są to roboty również planowane na kolejny miesiąc
Roboty planowane	


4+800
4+850
4+900
4+950
5+000
5+050
5+100

Załącznik nr 2 - Graficzny postep prac
Raport miesięczny nr 51 za Luty 2023 r.

SEKCJA II

nr pozycji z programu	asortyment robót	data rozpoczęcia zgodnie z programem	data zakończenia zgodnie z programem	wykonano do okresu [szacowane % ilości]	wykonano w okresie [szacowane % ilości]	narastająco [szacowane % ilości]
174	Roboty przygotowawcze	31.03.2021	18.05.2022			0,00%
175	Karczowanie z wywózką	31.03.2021	13.05.2021	100,00%	0,00%	100,00%
176	Odhumusowanie	14.05.2021	02.06.2021	100,00%	0,00%	100,00%
177	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I	01.04.2022	11.04.2022			0,00%
178	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II	10.05.2022	18.05.2022			0,00%
179	Roboty ziemne	04.06.2021	17.06.2022			0,00%
180	Wykop	04.06.2021	02.09.2021	100,00%	0,00%	100,00%
182	Nasyp	04.06.2021	17.06.2022	100,00%	0,00%	100,00%
186	GWN	17.08.2021	03.09.2021	100,00%	0,00%	100,00%
187	profilowanie skarp nasypów i wykopów	30.09.2021	17.06.2022	99,00%	1,00%	100,00%
188	Podbudowy	26.08.2021	10.10.2022			0,00%
189	Podbuodowa pomicnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.	26.08.2021	09.06.2022	100,00%	0,00%	100,00%
197	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	30.09.2021	24.08.2022	100,00%	0,00%	100,00%
204	Podbudowa bitumiczna z B.A.	13.12.2021	01.08.2022	100,00%	0,00%	100,00%
212	W-wa wiążąca	06.04.2022	12.09.2022			0,00%
214	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W; gr. 8 cm - TG	06.04.2022	20.04.2022	100,00%	0,00%	100,00%
219	W-wa ścieralna	22.08.2022	09.12.2022	100,00%	0,00%	100,00%
227	Roboty wykończeniowe	21.03.2022	14.12.2022			0,00%
229	Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich	21.03.2022	18.08.2022	90,00%	10,00%	100,00%
233	Przepusty	18.06.2021	21.09.2021			0,00%
235	Montaż rur - Przepusty HDPE	18.06.2021	15.07.2021	90,00%	10,00%	100,00%
237	Przepusty stalowe	12.07.2021	21.09.2021	90,00%	5,00%	95,00%
240	Elementy Ulic	18.10.2021	30.06.2022			0,00%
241	Ustawienie krawężników betonowych	18.10.2021	17.06.2022	100,00%	0,00%	100,00%
245	Ścieki trójkątne	18.10.2021	29.10.2021	100,00%	0,00%	100,00%
250	Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu	23.05.2022	24.10.2022			0,00%
259	Kanalizacja deszczowa	16.07.2021	17.06.2022			0,00%
260	Kanały deszcowe	16.07.2021	29.07.2021	100,00%	0,00%	100,00%
261	Wpusty	16.07.2021	29.07.2021	100,00%	0,00%	100,00%
262	Studnie i separatory	29.07.2021	29.07.2021	100,00%	0,00%	100,00%
264	Zbiorniki	30.07.2021	15.11.2021			0,00%
265	Wykop - zbiorniki	30.07.2021	19.08.2021	100,00%	0,00%	100,00%
266	Roboty wykończeniowe - zbiorniki	20.08.2021	15.11.2021	100,00%	0,00%	100,00%
267	Melioracja	16.11.2021	12.05.2022			0,00%
268	Przebudowa cieków melioracyjnych	16.11.2021	12.05.2022	100,00%	0,00%	100,00%
269	Roboty elektroenergetyczne	15.07.2021	23.08.2022			0,00%
271	Montaż słupów i opraw	03.08.2022	23.08.2022	100,00%	0,00%	100,00%
272	Montaż fundamentów - TG	13.08.2021	19.08.2021	100,00%	0,00%	100,00%
273	Montaż fundamentów - ronda	31.05.2022	06.06.2022	100,00%	0,00%	100,00%
274	Budowa zasilania (transformator, kable) - TG	15.07.2021	12.08.2021	100,00%	0,00%	100,00%
275	Budowa zasilania (transformator, kable) - ronda	15.04.2022	30.05.2022	100,00%	0,00%	100,00%
276	Roboty teletechniczne	15.11.2021	08.04.2022			
277	Budowa studni kablowych	15.11.2021	25.03.2022	100,00%	0,00%	100,00%
278	Budowa kanalizacji teletechnicznej	15.11.2021	25.03.2022	100,00%	0,00%	100,00%
279	Montaż światłowodów	28.03.2022	08.04.2022	100,00%	0,00%	100,00%

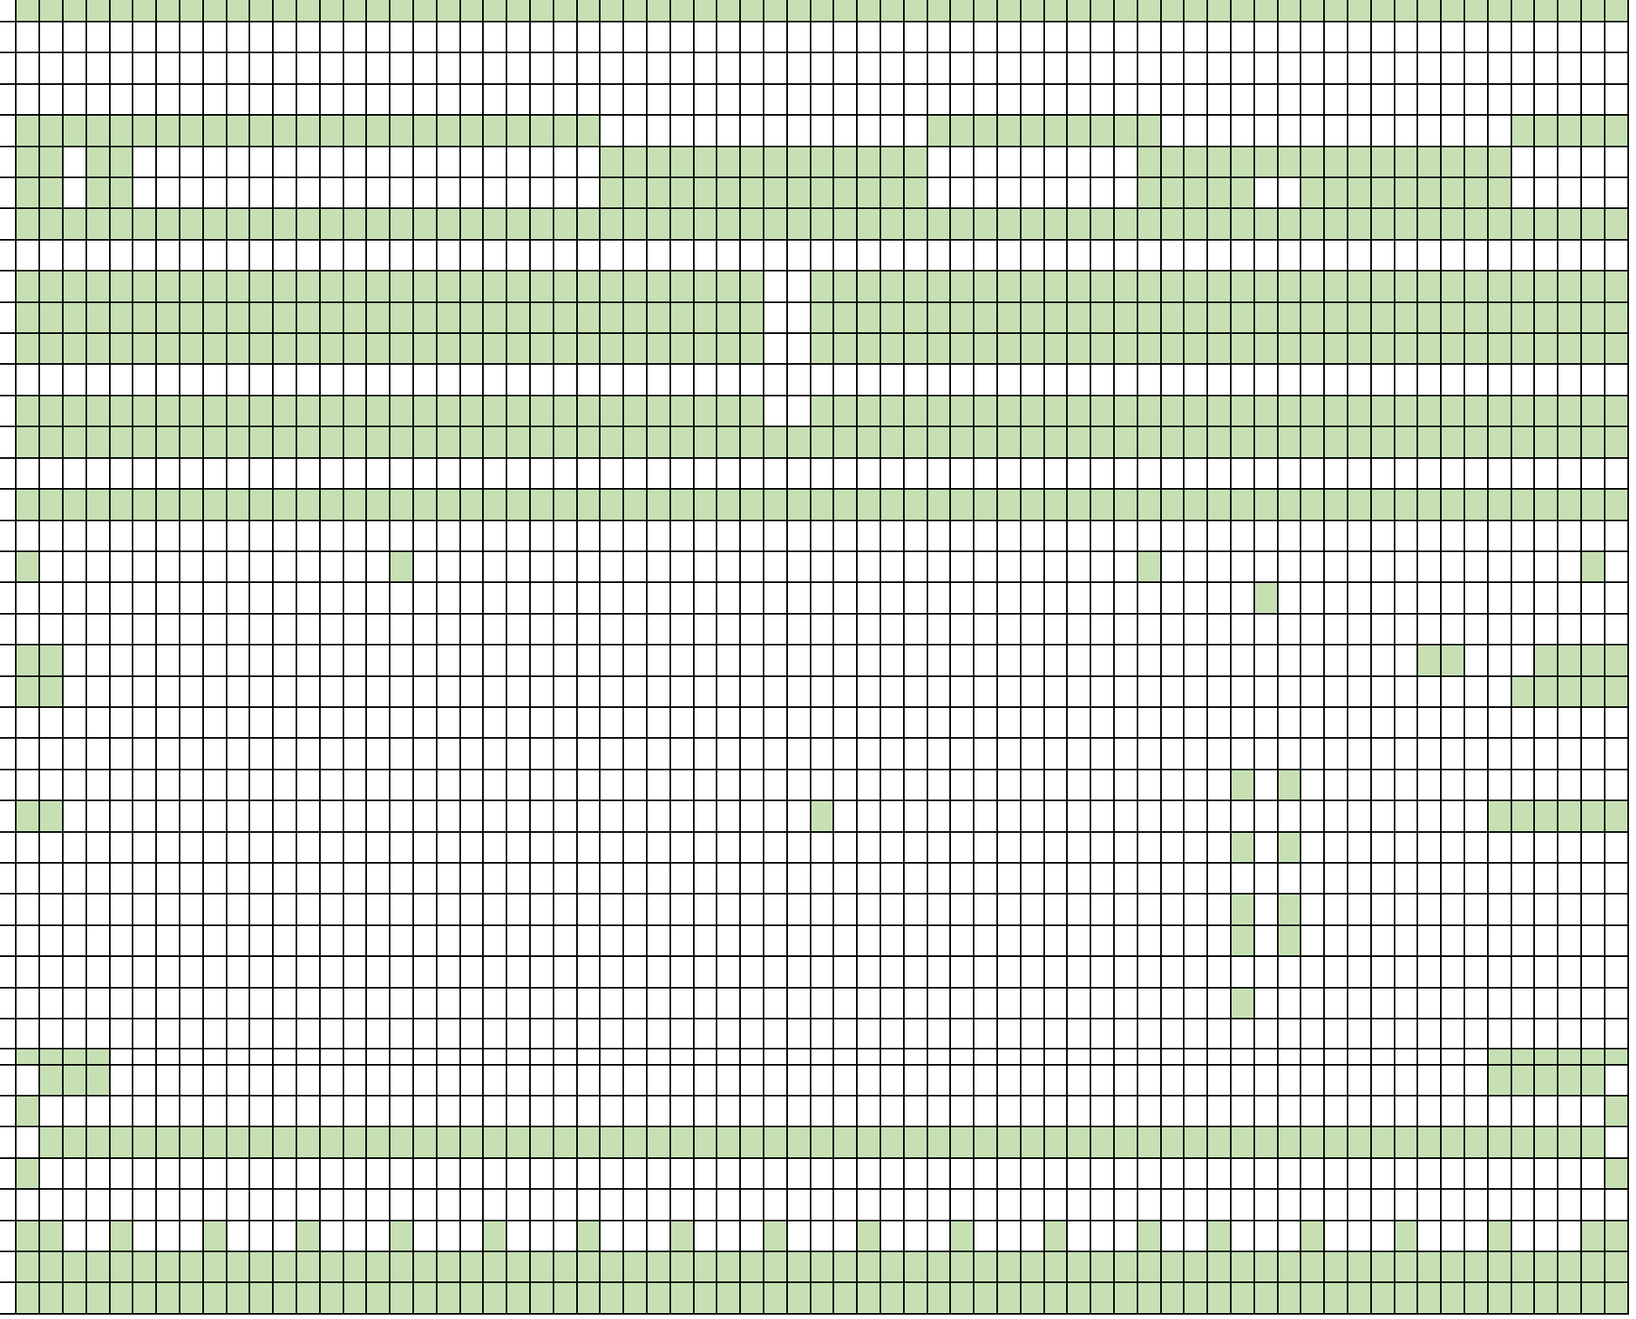

Legenda

Roboty zakończone

Roboty w trakcie — są to roboty również planowane na kolejny miesiąc

Roboty planowane

Załącznik nr 2 - Graficzny postep prac
Raport miesięczny nr 51 za Luty 2023 r.

SEKCJA III

nr pozycji z programu	asortyment robót	data rozpoczęcia zgodnie z programem	data zakończenia zgodnie z programem	wykonano do okresu [szacowane % ilości]	wykonano w okresie [szacowane % ilości]	narastająco [szacowane % ilości]
281	Roboty przygotowawcze	03.02.2021	13.05.2022			
282	Karczowanie z wywózką	03.02.2021	30.03.2021	100,00%	0,00%	100,00%
283	Odhumusowanie	31.03.2021	20.04.2021	100,00%	0,00%	100,00%
284	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I	18.03.2022	28.03.2022	100,00%	0,00%	100,00%
285	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II	05.05.2022	13.05.2022	100,00%	0,00%	100,00%
287	Roboty ziemne	21.04.2021	27.05.2022			
288	Wykop	21.04.2021	12.08.2021	100,00%	0,00%	100,00%
292	Nasyp	21.04.2021	27.05.2022	100,00%	0,00%	100,00%
295	GWN	30.07.2021	18.08.2021	100,00%	0,00%	100,00%
297	wymiana gruntu/ ulepszenie gruntu	21.04.2021	27.04.2021	100,00%	0,00%	100,00%
298	profilowanie skarp nasypów i wykopów	16.07.2021	04.04.2022	100,00%	0,00%	100,00%
299	Podbudowy	10.08.2021	26.10.2022			
300	Podbuodowa pomicnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.	10.08.2021	03.06.2022	100,00%	0,00%	100,00%
309	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/30 grubości 20 cm - TG+zjazdy (W-wa I gr. 10 cm)	14.09.2021	29.09.2021	100,00%	0,00%	100,00%
316	Podbudowa bitumiczna z B.A	28.10.2021	04.08.2022	100,00%	0,00%	100,00%
325	W-wa wiążąca	25.11.2021	17.10.2022			
326	Warstwa wiążąca z B.A.	25.11.2021	17.10.2022	100,00%	0,00%	100,00%
334	W-wa ścieralna	03.08.2022	17.11.2022	100,00%	0,00%	100,00%
345	Roboty wykończeniowe	13.12.2021	14.12.2022	40,00%	60,00%	100,00%
347	Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich	04.04.2022	08.08.2022	100,00%	0,00%	100,00%
352	Przepusty	18.06.2021	20.04.2022			
353	Montaż rur	02.07.2021	15.07.2021	98,00%	2,00%	100,00%
356	Przepusty stalowe	18.06.2021	20.04.2022	95,00%	0,00%	95,00%
359	Elementy Ulic	21.09.2021	06.07.2022			0,00%
360	Ustawienie krawężników betonowych	21.09.2021	14.06.2022	100,00%	0,00%	100,00%
245	Ścieki trójkątne	21.09.2021	08.10.2021	100,00%	0,00%	100,00%
346	Umocnienie rowów	05.04.2022	01.07.2022	100,00%	0,00%	100,00%
369	Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu	02.08.2022	14.12.2022			0,00%
381	Kanalizacja deszczowa	04.06.2021	14.06.2022			0,00%
382	Kanały deszcowe	04.06.2021	17.06.2021	100,00%	0,00%	100,00%
383	Wpusty	18.06.2021	07.07.2021	100,00%	0,00%	100,00%
384	Studnie i separatory	04.06.2021	17.06.2021	100,00%	0,00%	100,00%
385	Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa	20.10.2021	14.06.2022	100,00%	0,00%	100,00%
386	Zbiomiki	16.07.2021	01.09.2021			0,00%
387	Wykop - zbiomiki	16.07.2021	21.07.2021	100,00%	0,00%	100,00%
388	Roboty wykończeniowe - zbiomiki	22.07.2021	01.09.2021	100,00%	0,00%	100,00%
389	Melioracja	22.07.2021	13.10.2021			0,00%
390	Przebudowa cieków melioracyjnych	22.07.2021	13.10.2021	100,00%	0,00%	100,00%
391	Roboty elektroenergetyczne	07.07.2021	31.03.2022			
392	Przebudowa lini SN	16.07.2021	04.08.2021	100,00%	0,00%	100,00%
393	Montaż fundamentów	23.07.2021	02.08.2021	100,00%	0,00%	100,00%
394	Montaż słupów i opraw	13.12.2021	31.03.2022	100,00%	0,00%	100,00%
395	Budowa zasilania	07.07.2021	26.07.2021	100,00%	0,00%	100,00%
396	Roboty teletechniczne	08.10.2021	05.04.2022			
397	Budowa studni kablowych	08.10.2021	21.03.2022	100,00%	0,00%	100,00%
398	Budowa kanalizacji teletechnicznej	08.10.2021	21.03.2022	100,00%	0,00%	100,00%
400	Roboty gazowe	09.03.2021	24.06.2021			0,00%
404	Przebudowa kolizji z istn. Gazociągiem	13.05.2021	24.06.2021	100,00%	0,00%	100,00%

Legenda

Roboty zakończone

Roboty w trakcie — są to roboty również planowane na kolejny miesiąc

Roboty planowane


12+350
12+400
12+450
12+500
12+550
12+600
12+650
12+676
