Załącznik nr 6 - Graficzny postep prac
Raport miesięczny nr 35 za Grudzień 2021 r.

SEKCJA II

| nr pozycji z programu | asortyment robót | data rozpoczęcia zgodnie z programem | data zakończenia zgodnie z programem | wykonano do okresu [szacowane % ilości] | wykonano w okresie [szacowane % ilości] | narastająco [szacowane % ilości] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Roboty przygotowawcze | 31.03.2021 | 18.05.2022 | | | 0,00% |
| 175 | Karczowanie z wywózką | 31.03.2021 | 13.05.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 176 | Odhumusowanie | 14.05.2021 | 02.06.2021 | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 177 | Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I | 01.04.2022 | 11.04.2022 | | | 0,00% |
| 178 | Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II | 10.05.2022 | 18.05.2022 | | | 0,00% |
| 179 | Roboty ziemne | 04.06.2021 | 17.06.2022 | | | 0,00% |
| 180 | Wykop | 04.06.2021 | 02.09.2021 | 91,00% | 0,00% | 91,00% |
| 182 | Nasyp | 04.06.2021 | 17.06.2022 | 90,00% | 0,00% | 90,00% |
| 186 | GWN | 17.08.2021 | 03.09.2021 | 80,00% | 0,00% | 80,00% |
| 187 | profilowanie skarp nasypów i wykopów | 30.09.2021 | 17.06.2022 | 70,00% | 0,00% | 70,00% |
| 188 | Podbudowy | 26.08.2021 | 10.10.2022 | | | 0,00% |
| 189 | Podbuodowa pomicnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech. | 26.08.2021 | 09.06.2022 | 90,00% | 0,00% | 90,00% |
| 197 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | 30.09.2021 | 24.08.2022 | 40,00% | 50,00% | 90,00% |
| 204 | Podbudowa bitumiczna z B.A. | 13.12.2021 | 01.08.2022 | 40,00% | 50,00% | 90,00% |
| 212 | W-wa wiążąca | 06.04.2022 | 12.09.2022 | | | 0,00% |
| 214 | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W; gr. 8 cm - TG | 06.04.2022 | 20.04.2022 | 40,00% | 25,00% | 65,00% |
| 219 | W-wa ścieralna | 22.08.2022 | 09.12.2022 | | | 0,00% |
| 227 | Roboty wykończeniowe | 21.03.2022 | 14.12.2022 | | | 0,00% |
| 229 | Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich | 21.03.2022 | 18.08.2022 | | | 0,00% |
| 233 | Przepusty | 18.06.2021 | 21.09.2021 | | | 0,00% |
| 235 | Montaż rur - Przepusty HDPE | 18.06.2021 | 15.07.2021 | 61,00% | 0,00% | 61,00% |
| 237 | Przepusty stalowe | 12.07.2021 | 21.09.2021 | 0,00% | 70,00% | 70,00% |
| 240 | Elementy Ulic | 18.10.2021 | 30.06.2022 | | | 0,00% |
| 241 | Ustawienie krawężników betonowych | 18.10.2021 | 17.06.2022 | 0,00% | 30,00% | 30,00% |
| 245 | Ścieki trójkątne | 18.10.2021 | 29.10.2021 | 0,00% | 70,00% | 70,00% |
| 250 | Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu | 23.05.2022 | 24.10.2022 | | | 0,00% |
| 259 | Kanalizacja deszczowa | 16.07.2021 | 17.06.2022 | | | 0,00% |
| 260 | Kanały deszczowe | 16.07.2021 | 29.07.2021 | 26,00% | 0,00% | 26,00% |
| 261 | Wpusty | 16.07.2021 | 29.07.2021 | 63,00% | 0,00% | 63,00% |
| 262 | Studnie i separatory | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 50,00% | 0,00% | 50,00% |
| 264 | Zbiorniki | 30.07.2021 | 15.11.2021 | | | 0,00% |
| 265 | Wykop - zbiorniki | 30.07.2021 | 19.08.2021 | 20,00% | 5,00% | 25,00% |
| 266 | Roboty wykończeniowe - zbiorniki | 20.08.2021 | 15.11.2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 267 | Melioracja | 16.11.2021 | 12.05.2022 | | | 0,00% |
| 268 | Przebudowa cieków melioracyjnych | 16.11.2021 | 12.05.2022 | 5,00% | 0,00% | 5,00% |
| 269 | Roboty elektroenergetyczne | 15.07.2021 | 23.08.2022 | | | 0,00% |
| 274 | Budowa zasilania (transformator, kable) - TG | 15.07.2021 | 12.08.2021 | 75,00% | 5,00% | 80,00% |
| 275 | Budowa zasilania (transformator, kable) - ronda | 15.04.2022 | 30.05.2022 | 70,00% | 5,00% | 70,00% |
| 276 | Roboty teletechniczne | 15.11.2021 | 08.04.2022 | | | 0,00% |
| 277 | Budowa studni kablowych | 15.11.2021 | 25.03.2022 | 75,00% | 5,00% | 80,00% |
| 278 | Budowa kanalizachi teletechnicznej | 15.11.2021 | 25.03.2022 | 75,00% | 5,00% | 80,00% |
| 279 | Montaż światłowodów | 28.03.2022 | 08.04.2022 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

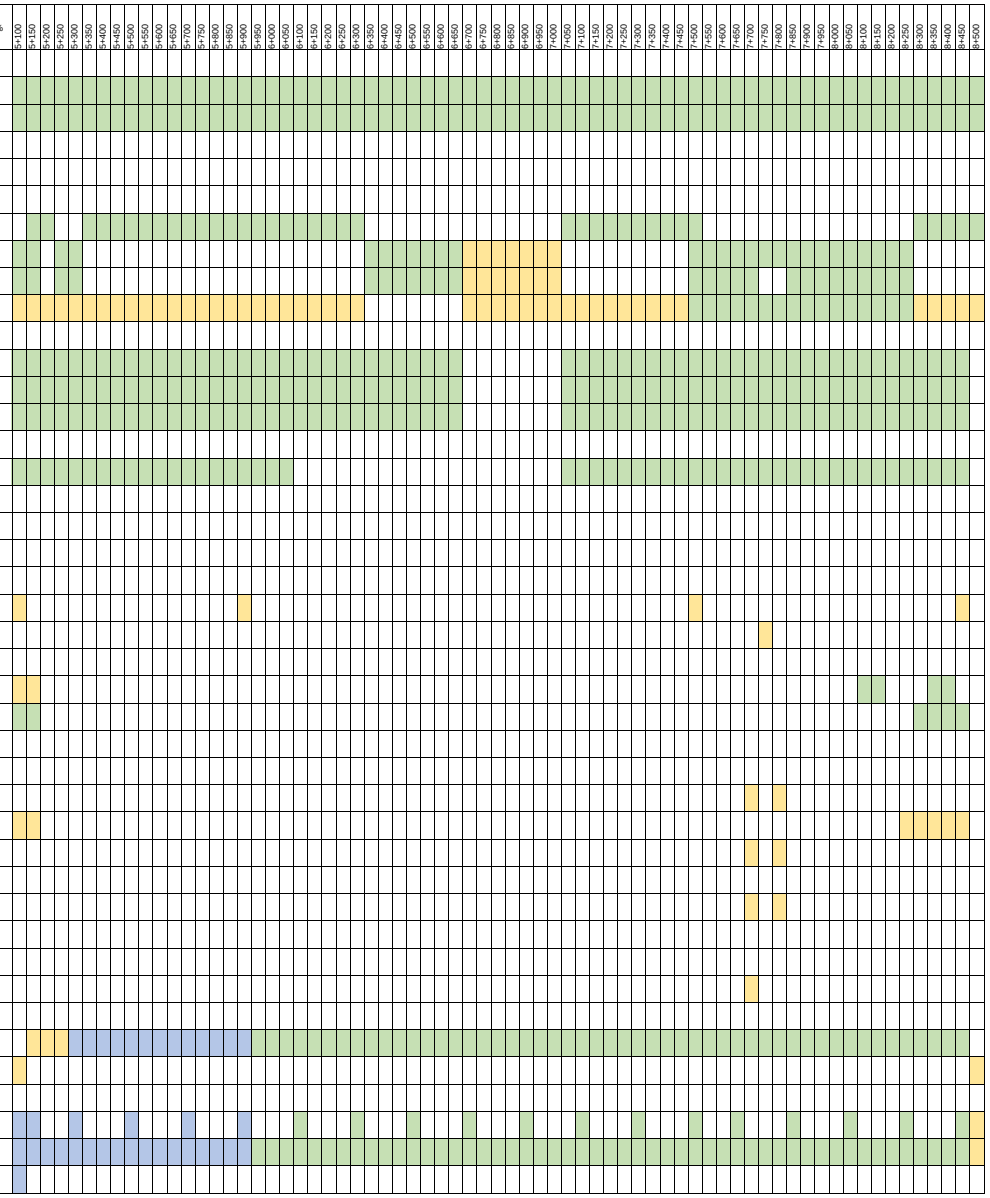


Legenda

Roboty zakończone

Roboty w trakcie — są to roboty również planowane na kolejny miesiąc

Roboty planowane
