Załącznik nr 2 - Graficzny postep prac
Raport miesięczny nr 44 za Lipiec 2022 r.

SEKCJA II

nr pozycji z programu	asortyment robót	data rozpoczęcia zgodnie z programem	data zakończenia zgodnie z programem	wykonano do okresu [szacowane % ilości]	wykonano w okresie [szacowane % ilości]	narastająco [szacowane % ilości]
174	Roboty przygotowawcze	3/31/2021	5/18/2022			0.00%
175	Karczowanie z wywózką	3/31/2021	5/13/2021	100.00%	0.00%	100.00%
176	Odhumusowanie	5/14/2021	6/2/2021	100.00%	0.00%	100.00%
177	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I	4/1/2022	4/11/2022			0.00%
178	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II	5/10/2022	5/18/2022			0.00%
179	Roboty ziemne	6/4/2021	6/17/2022			0.00%
180	Wykop	6/4/2021	9/2/2021	95.00%	5.00%	100.00%
182	Nasyp	6/4/2021	6/17/2022	98.00%	2.00%	100.00%
186	GWN	8/17/2021	9/3/2021	95.00%	5.00%	100.00%
187	profilowanie skarp nasypów i wykopów	9/30/2021	6/17/2022	92.00%	6.00%	98.00%
188	Podbudowy	8/26/2021	10/10/2022			0.00%
189	Podbuodowa pomicnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.	8/26/2021	6/9/2022	95.00%	5.00%	100.00%
197	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	9/30/2021	8/24/2022	95.00%	5.00%	100.00%
204	Podbudowa bitumiczna z B.A.	12/13/2021	8/1/2022	94.00%	6.00%	100.00%
212	W-wa wiążąca	4/6/2022	9/12/2022			0.00%
214	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W; gr. 8 cm - TG	4/6/2022	4/20/2022	80.00%	20.00%	100.00%
219	W-wa ścieralna	8/22/2022	12/9/2022			0.00%
227	Roboty wykończeniowe	3/21/2022	12/14/2022			0.00%
229	Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich	3/21/2022	8/18/2022	80.00%	15.00%	95.00%
233	Przepusty	6/18/2021	9/21/2021			0.00%
235	Montaż rur - Przepusty HDPE	6/18/2021	7/15/2021	80.00%	20.00%	100.00%
237	Przepusty stalowe	7/12/2021	9/21/2021	70.00%	30.00%	100.00%
240	Elementy Ulic	10/18/2021	6/30/2022			0.00%
241	Ustawienie krawężników betonowych	10/18/2021	6/17/2022	80.00%	20.00%	100.00%
245	Ścieki trójkątne	10/18/2021	10/29/2021	90.00%	10.00%	100.00%
250	Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu	5/23/2022	10/24/2022			0.00%
259	Kanalizacja deszczowa	7/16/2021	6/17/2022			0.00%
260	Kanały deszcowe	7/16/2021	7/29/2021	26.00%	74.00%	100.00%
261	Wpusty	7/16/2021	7/29/2021	67.00%	33.00%	100.00%
262	Studnie i separatory	7/29/2021	7/29/2021	50.00%	50.00%	100.00%
264	Zbiorniki	7/30/2021	11/15/2021			0.00%
265	Wykop - zbiorniki	7/30/2021	8/19/2021	100.00%	0.00%	100.00%
266	Roboty wykończeniowe - zbiorniki	8/20/2021	11/15/2021	90.00%	10.00%	100.00%
267	Melioracja	11/16/2021	5/12/2022			0.00%
268	Przebudowa cieków melioracyjnych	11/16/2021	5/12/2022	5.00%	95.00%	100.00%
269	Roboty elektroenergetyczne	7/15/2021	8/23/2022			0.00%
271	Montaż słupów i opraw	8/3/2022	8/23/2022			0.00%
272	Montaż fundamentów - TG	8/13/2021	8/19/2021	50.00%	0.00%	50.00%
273	Montaż fundamentów - ronda	5/31/2022	6/6/2022	20.00%	0.00%	20.00%
274	Budowa zasilania (transformator, kable) - TG	7/15/2021	8/12/2021	80.00%	0.00%	80.00%
275	Budowa zasilania (transformator, kable) - ronda	4/15/2022	5/30/2022	70.00%	0.00%	70.00%
276	Roboty teletechniczne	11/15/2021	4/8/2022			0.00%
277	Budowa studni kablowych	11/15/2021	3/25/2022	80.00%	0.00%	80.00%
278	Budowa kanalizachi teletechnicznej	11/15/2021	3/25/2022	80.00%	0.00%	80.00%
279	Montaż światłowodów	3/28/2022	4/8/2022			0.00%

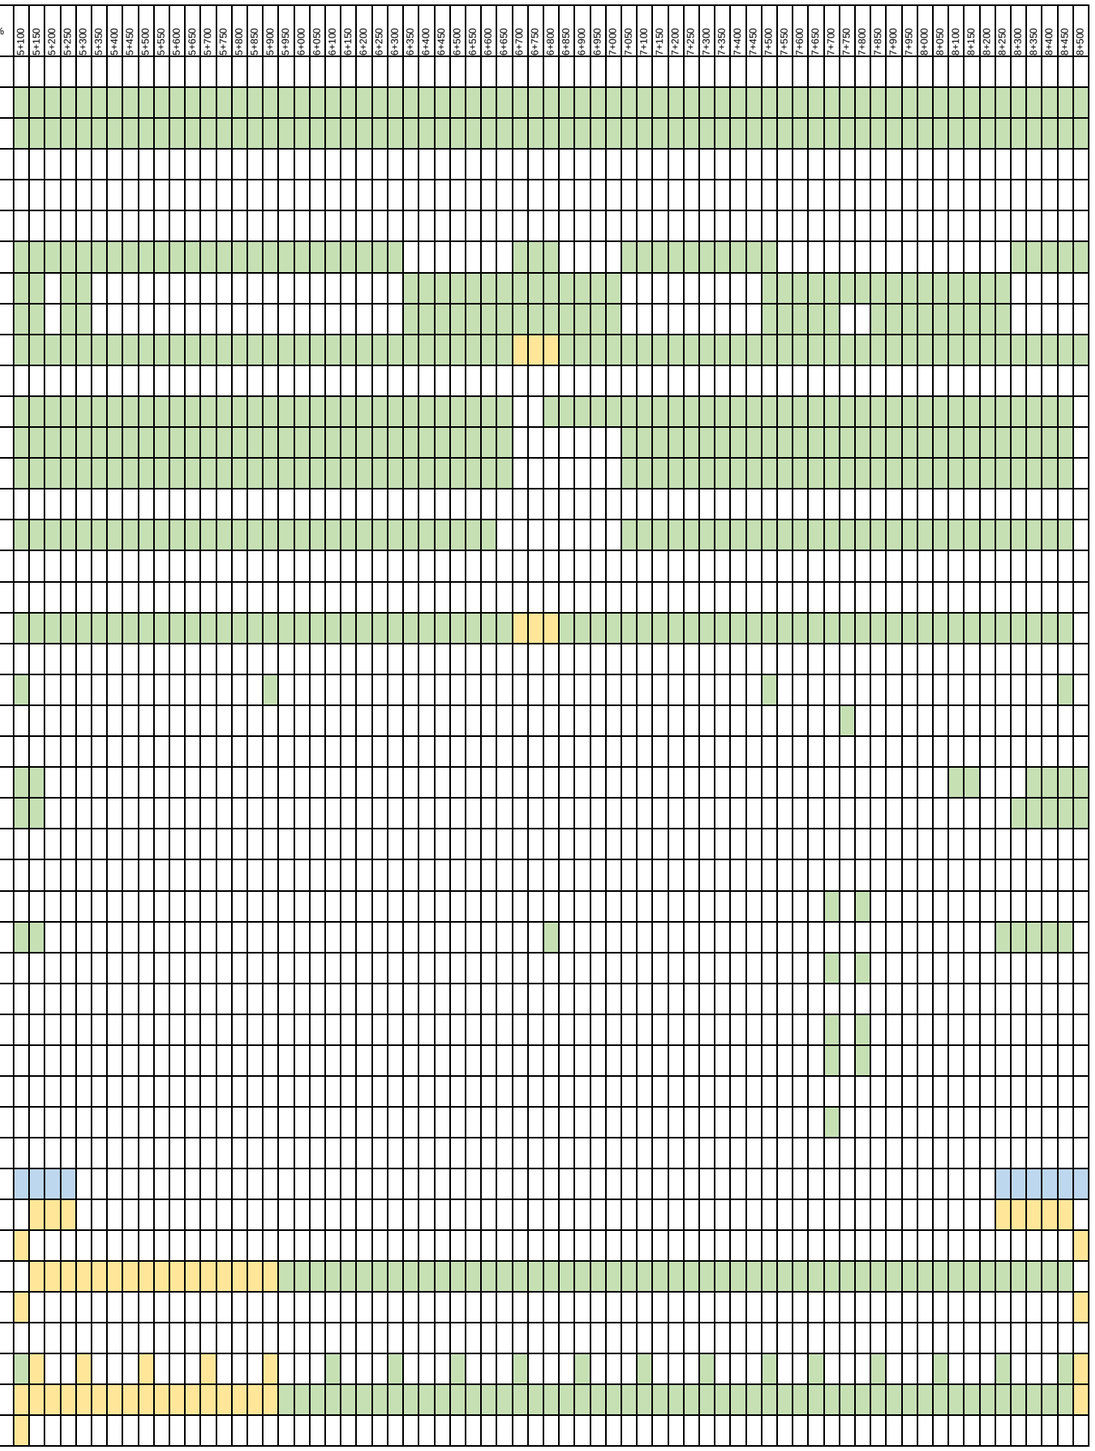

Legenda
Roboty zakończone
Roboty w trakcie
Roboty planowane

są to roboty również planowane na kolejny miesiąc
