Załącznik nr 2 - Graficzny postep prac
Raport miesięczny nr 44 za Lipiec 2022 r.

SEKCJA III

nr pozycji z programu	asortyment robót	data rozpoczęcia zgodnie z programem	data zakończenia zgodnie z programem	wykonano do okresu [szacowane % ilości]	wykonano w okresie [szacowane % ilości]	narastająco [szacowane % ilości]
281	Roboty przygotowawcze	2/3/2021	5/13/2022			
282	Karczowanie z wywózką	2/3/2021	3/30/2021	100.00%	0.00%	100.00%
283	Odhumusowanie	3/31/2021	4/20/2021	100.00%	0.00%	100.00%
284	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap I	3/18/2022	3/28/2022	50.00%	50.00%	100.00%
285	Rozbiórki elementów dróg i ulic - etap II	5/5/2022	5/13/2022	0.00%	50.00%	50.00%
287	Roboty ziemne	4/21/2021	5/27/2022			
288	Wykop	4/21/2021	8/12/2021	91.00%	4.00%	95.00%
292	Nasyp	4/21/2021	5/27/2022	95.00%	5.00%	100.00%
295	GWN	7/30/2021	8/18/2021	93.00%	5.00%	98.00%
297	wymiana gruntu/ ulepszenie gruntu	4/21/2021	4/27/2021	100.00%	0.00%	100.00%
298	profilowanie skarp nasypów i wykopów	7/16/2021	4/4/2022	98.00%	0.00%	98.00%
299	Podbudowy	8/10/2021	10/26/2022			
300	Podbuodowa pomicnicza z mieszanki niezwiązanej stab. Mech.	8/10/2021	6/3/2022	94.00%	1.00%	95.00%
309	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/30 grubiści 20 cm - TG+zjazdy (W-wa I gr. 10 cm)	9/14/2021	9/29/2021	94.00%	1.00%	95.00%
316	Podbudowa bitumiczna z B.A	10/28/2021	8/4/2022	91.00%	4.00%	95.00%
325	W-wa wiążąca	11/25/2021	10/17/2022			
326	Warstwa wiążąca z B.A.	11/25/2021	10/17/2022	90.00%	4.00%	94.00%
334	W-wa ścieralna	8/3/2022	11/17/2022			0.00%
345	Roboty wykończeniowe	12/13/2021	12/14/2022	40.00%	0.00%	40.00%
347	Humusowanie skarp, rowów i powierzchni płaskich	4/4/2022	8/8/2022	80.00%	15.00%	95.00%
352	Przepusty	6/18/2021	4/20/2022			0.00%
353	Montaż rur	7/2/2021	7/15/2021	94.00%	0.00%	94.00%
356	Przepusty stalowe	6/18/2021	4/20/2022	75.00%	10.00%	85.00%
359	Elementy Ulic	9/21/2021	7/6/2022			0.00%
360	Ustawienie krawężników betonowych	9/21/2021	6/14/2022	90.00%	0.00%	90.00%
245	Ścieki trójkątne	9/21/2021	10/8/2021	94.00%	0.00%	94.00%
346	Umocnienie rowów	4/5/2022	7/1/2022	98.00%	1.00%	99.00%
369	Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu	8/2/2022	12/14/2022			0.00%
381	Kanalizacja deszczowa	6/4/2021	6/14/2022			0.00%
382	Kanały deszcowe	6/4/2021	6/17/2021	15.00%	85.00%	100.00%
383	Wpusty	6/18/2021	7/7/2021	95.00%	5.00%	100.00%
384	Studnie i separatory	6/4/2021	6/17/2021	36.00%	60.00%	96.00%
385	Roboty wykończeniowe - kanalizacja deszczowa	10/20/2021	6/14/2022	80.00%	5.00%	85.00%
386	Zbiorniki	7/16/2021	9/1/2021			0.00%
387	Wykop - zbiorniki	7/16/2021	7/21/2021	100.00%	0.00%	100.00%
388	Roboty wykończeniowe - zbiorniki	7/22/2021	9/1/2021	90.00%	0.00%	90.00%
389	Melioracja	7/22/2021	10/13/2021			0.00%
390	Przebudowa cieków melioracyjnych	7/22/2021	10/13/2021	50.00%	20.00%	70.00%
391	Roboty elektroenergetyczne	7/7/2021	3/31/2022			0.00%
392	Przebudowa lini SN	7/16/2021	8/4/2021	100.00%	0.00%	100.00%
393	Montaż fundamentów	7/23/2021	8/2/2021	75.00%	25.00%	100.00%
394	Montaż słupów i opraw	12/13/2021	3/31/2022			0.00%
395	Budowa zasilania	7/7/2021	7/26/2021	80.00%	10.00%	90.00%
396	Roboty teletechniczne	10/8/2021	4/5/2022			0.00%
397	Budowa studni kablowych	10/8/2021	3/21/2022	99.00%	0.00%	99.00%
398	Budowa kanalizacji teletechnicznej	10/8/2021	3/21/2022	99.00%	0.00%	99.00%
400	Roboty gazowe	3/9/2021	6/24/2021			0.00%
404	Przebudowa kolizji z istn. Gazociągiem	5/13/2021	6/24/2021	80.00%	15.00%	95.00%

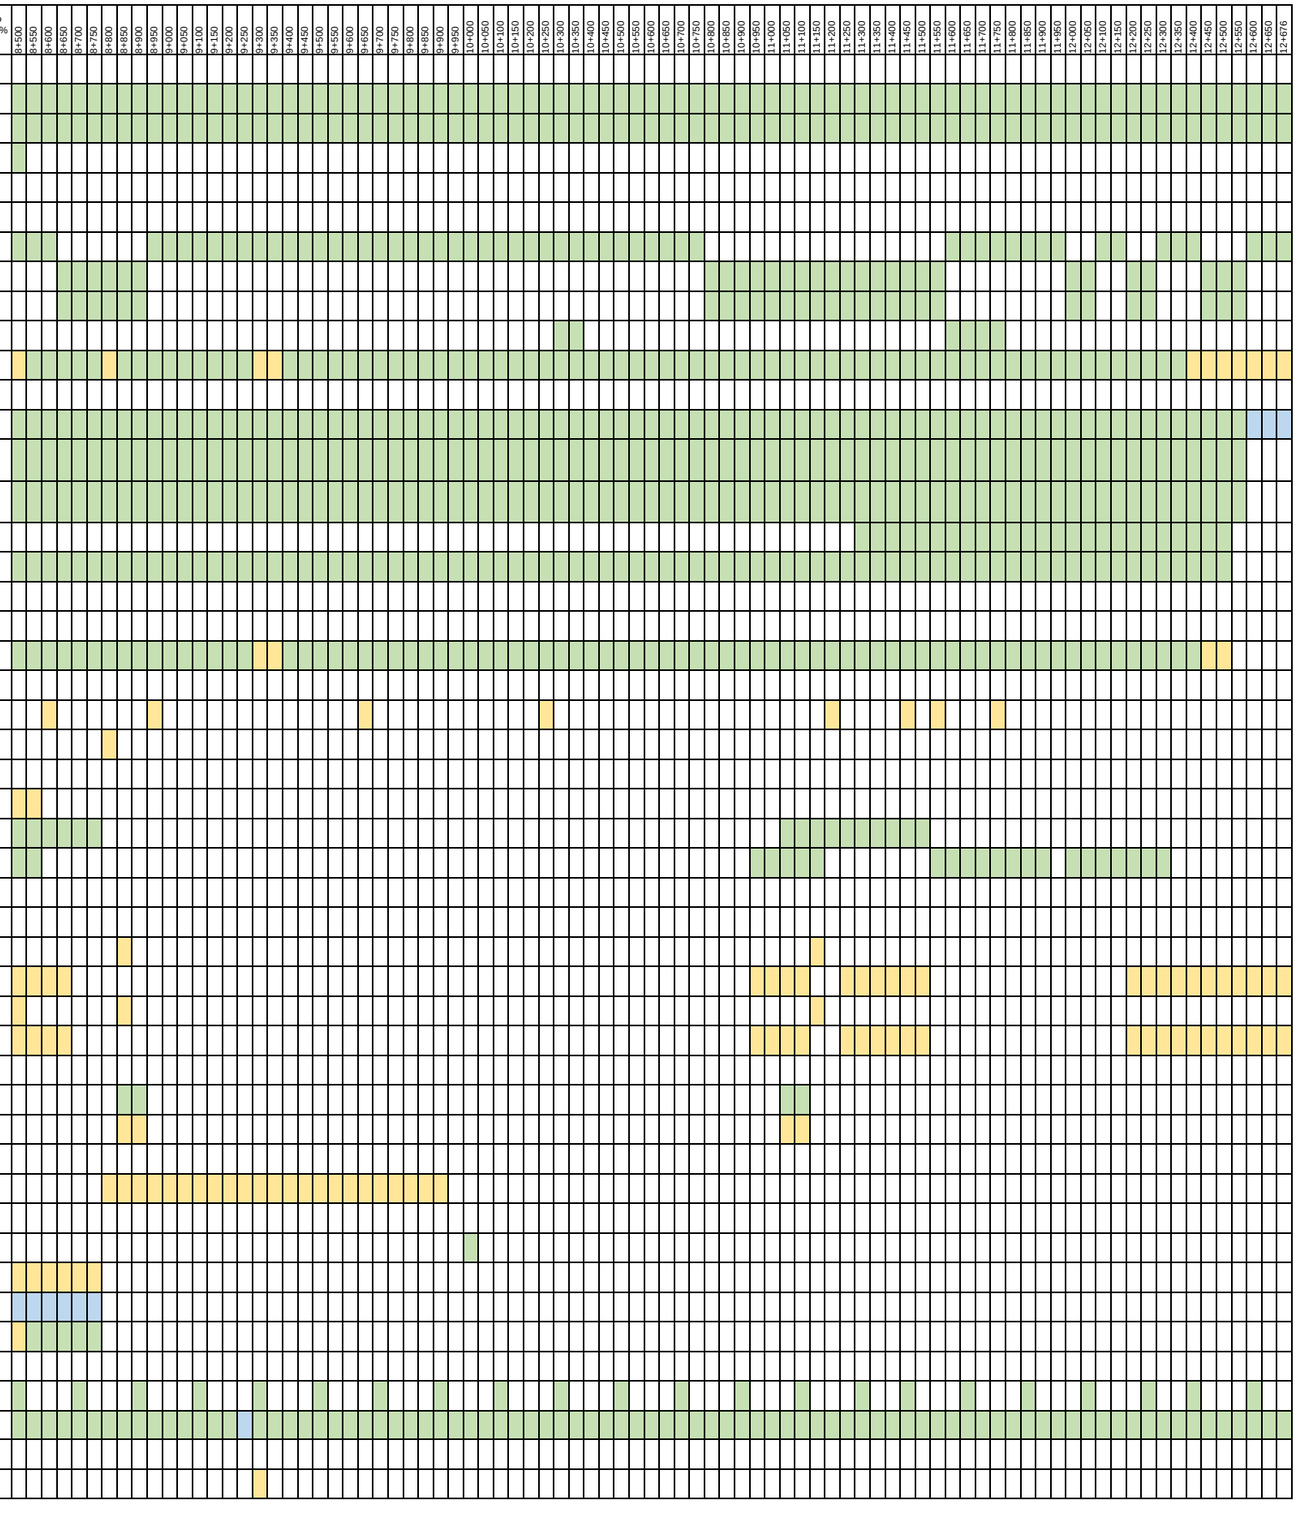

Legenda

Roboty zakończone	
Roboty w trakcie	sa to roboty również planowane na kolejny miesiac
Roboty planowane	
